



Agenzia per la Coesione Territoriale

Regione Molise

Rapporto Annuale di Esecuzione 2018

Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise 2007/2013

Cod. 2007MO002FA008

Risorse Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013

Delibera CIPE n. 62/2011

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

Giugno 2019

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione è stato aggiornato dall'Ufficio "Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC" del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, con la collaborazione di Mariagiovanna Reale, Nicola de Chiara e Cristina Candigliota, unità di Assistenza Tecnica ai Programmi FSC

Sommario

1.	IDENTIFICAZIONE.....	4
2.	STATO DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA)	4
2.1.	“Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, “Danni alluvionali (DPCM n. 2210/10)”, “Danni alluvionali (OPCM n.3268/03)”, “Eventi atmosferici 2008 (OPCM n. 3734/09)”	5
2.2.	“Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)”	11
3.	RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI - AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA	14
3.1.	AVANZAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE OPERE E LAVORI PUBBLICI	16
3.2.	AVANZAMENTO FINANZIARIO	17
3.3.	AVANZAMENTO PROCEDURALE	19
3.4.	AVANZAMENTO ECONOMICO	22
3.5.	AVANZAMENTO FISICO	22
4.	STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA	23
5.	STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ E DEGLI ATTI INTEGRATIVI	24
6.	ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE.....	25
	MOS1 – APQ “EDIFICI DI CULTO E IMMOBILI ANNESSI”	26
	MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A”	26
	MOS3 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A – I ATTO INTEGRATIVO”	28
	MOS4 – APQ “EDILIZIA SCOLASTICA”	29
	MOS5 – APQ “OPERE PUBBLICHE”	30
	MOS6 – APQ “INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE”	31
	MOS7 – APQ “ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI S. GIULIANO DI PUGLIA PER RISARCIMENTO DANNI, PATRIMONIALI E NON, RICONOSCIUTI ALLE PARTI CIVILI A SEGUITO DEL CROLLO DELLA SCUOLA JOVINE. SENT. 173/2010 SCC IV SEZ. PENALE”	32
	MOS8 – APQ “INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE - I ATTO INTEGRATIVO”	35
	MOS9 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ “A” II ATTO INTEGRATIVO”	36
	MOSZ - AZIONI DI SISTEMA.....	38
	MOA1 – APQ “EVENTI ATMOSFERICI 2008 OPCM 3734/09”	40
	MOA2 – APQ “DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003”	41
	MOA3 – APQ “DANNI ALLUVIONALI D.P.C.M. 2210/2010”	43
7.	RISORSE DANNI ALLUVIONALI (DPCM 2210/10) E (OPCM 3268/03) ED EVENTI ATMOSFERICI 2008 (OPCM 3734/09) E SISMA 2002 PERCORSO RICOSTRUZIONE, – STATO DI ATTUAZIONE	45
8.	CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC	51
9.	MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI	52
10.	PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI	54
11.	MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE	62
12.	VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA	62
13.	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	62
14.	ASSISTENZA TECNICA.....	63
15.	IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI.....	63

1. IDENTIFICAZIONE

PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA	Programmazione:	2007-2013
	Titolo del programma:	2007MO002FA008 - Pianificazione Regionale Attuativa (PRA) Molise. Risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) assegnate dalla delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 62
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio:	31.12.2018

Il presente Rapporto è stato aggiornato in ottemperanza a quanto previsto al punto 5 del "Manuale Operativo sulle procedure di Monitoraggio delle risorse FAS" e sintetizza le informazioni e i dati di avanzamento procedurale, finanziario e fisico relativi agli interventi attivati, inseriti nel sistema di monitoraggio SGP e validati nel Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-RGS-IGRUE, nonché le informazioni e i dati riportati nei Rapporti Annuali di Monitoraggio (RAM) predisposti dai Responsabili Unici (RUA) degli Accordi di Programma Quadro (APQ) e trasmessi al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale.

2. LA PIANIFICAZIONE REGIONALE ATTUATIVA (PRA)

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U. n. 304 del 31 dicembre 2011*) concernente "Individuazione ed assegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud", ha assegnato al Molise le seguenti risorse:

- Sisma 2002 Percorso ricostruzione 346,2 mln di euro
- Danni alluvionali (DPCM 2210/10) 6,0 mln di euro
- Danni alluvionali (OPCM 3268/03) 16,6 mln di euro
- Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) 17,7 mln di euro
- "Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)" 200,00 mln di euro

La predetta delibera n. 62/2011, ha disposto, al punto 11, che l'attuazione degli interventi strategici prioritari nazionali e regionali avverrà attraverso appositi contratti istituzionali di sviluppo, come indicato nella delibera n.1/2011, in particolare al punto 5) e ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011. Ha disposto, inoltre, che, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia e le procedure e le modalità già consolidate nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La successiva delibera CIPE 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U. n. 138 del 15 giugno 2012*), concernente "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013", ha disposto, al punto 3.1 che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti, fra l'altro, nella delibera CIPE n. 62/2011, nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, si procede mediante la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati», contenenti, fra l'altro, la definizione di un sistema di indicatori di risultato e di realizzazione, la verifica della sostenibilità finanziaria e gestionale, le modalità di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post. Tali APQ devono altresì prevedere appropriati sistemi di gestione e controllo degli interventi e sono sottoposti alla sorveglianza del Ministro per la Coesione Territoriale, attraverso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, che deve verificare l'efficace funzionamento di tali sistemi, anche con riferimento all'ammissibilità delle spese.

La delibera CIPE n. 107 del 26 ottobre 2012 (*G.U. n. 19 del 23 gennaio 2013*) conferma che si debba procedere mediante la stipula di specifici Accordi di Programma Quadro (APQ) «rafforzati», così come sopra descritti.

2.1. “Sisma 2002 Percorso ricostruzione”, “Danni alluvionali (DPCM n. 2210/10)”, “Danni alluvionali (OPCM n.3268/03)”, “Eventi atmosferici 2008 (OPCM n. 3734/09)”

Con riferimento alle risorse relative a:

- | | |
|--|-------------------|
| • Sisma 2002 Percorso ricostruzione | 346,2 mln di euro |
| • Danni alluvionali (DPCM 2210/10) | 6,0 mln di euro |
| • Danni alluvionali (OPCM 3268/03) | 16,6 mln di euro |
| • Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09) | 17,7 mln di euro, |

La Giunta regionale, con deliberazione n. 399 del 31 maggio 2010, ha affidato al Servizio per la Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post emergenziale e post commissariale messa in campo a seguito di eventi calamitosi dichiarati dalla Regione Molise ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, art.5, comma 1.

La legge regionale 30 aprile 2012, n.12, istitutiva dell’Agenzia regionale di Protezione civile, ha disposto, all’art. 4, comma 1 che *“Nel quadro delle competenze regionali in materia di protezione civile, l’attività dell’Agenzia comprende ... omissis ... in via transitoria, il completamento degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici, privati e pubblici, colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 ...”*.

La successiva legge regionale 4 maggio 2015, n. 8 ha disposto la soppressione dell’Agenzia regionale di Protezione civile (ARPC) e l’istituzione dell’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS) con effetto dal 1° gennaio 2016. L’ARPS è articolata in due settori: (i) interventi post-sisma 2002; (ii) gestione stralcio del Soggetto attuatore di cui all’art. 5 dell’OPCM n. 3880/2010 e all’art. 9 dell’OPCM n. 3891/2010.

Fino al 31 dicembre 2015, l’Agenzia regionale di Protezione Civile ha continuato ad operare per le attività di cui alle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 62/2011 (Danni alluvionali - DPCM n. 2210/10 e OPCM n. 3268/03, Eventi atmosferici 2008 - OPCM n. 3734/09 e Sisma 2002 - Percorso ricostruzione), quale struttura preposta alla gestione e attuazione del Programma e, quindi, degli interventi, in raccordo con il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Direzione dell’Area Seconda – Programmazione, oggi I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale.

Pertanto, in forza della predetta legge regionale n. 8/2015, dal 1° gennaio 2016 l’ARPS è subentrata in tutti i rapporti giuridici preesistenti e relativi alla sola assegnazione della Quota Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione di cui alla delibera CIPE n. 62/2011, mentre, per le assegnazioni relative a Danni alluvionali - DPCM n. 2210/10, OPCM n. 3268/03 ed Eventi atmosferici 2008 - OPCM n. 3734/09 il Servizio regionale di Protezione Civile, istituito presso l’attuale Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, è subentrato in tutti i rapporti giuridici preesistenti.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 608 del 2 ottobre 2012 è stato approvato il Programma degli interventi “cantierabili” e “non cantierabili” riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE con delibera n. 62/2011.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 719 del 13 novembre 2012 è stato integrato il Programma degli interventi riferiti alla quota “Sisma 2002 – percorso ricostruzione”.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 65 del 25 gennaio 2013 e n. 681 del 20 dicembre 2013 è stato rettificato il Programma degli interventi relativi alla quota Danni alluvionali (OPCM n. 3268/2003), approvato con la richiamata deliberazione n. 608/2012 e, con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 131 del 28 marzo 2014 è stato aggiornato il Programma degli interventi “cantierabili” relativi al “Piano Casa”, riferito alla predetta quota, approvato con le suddette deliberazioni nn. 65/2013 e 681/2013.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 1° ottobre 2014 è stato ridefinito il Programma degli interventi non ancora inseriti in Accordi di Programma Quadro, Programma relativo all’assegnazione “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 18 novembre 2014 è stata revocata la predetta deliberazione n. 498/2014 e ridefinito e riapprovato il Programma degli interventi non ancora inseriti in Accordi di Programma Quadro.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 24 novembre 2014 sono state approvate alcune rettifiche al Programma degli interventi relativi agli Immobili Privati in classe di priorità “A”, di cui alla precedente deliberazione n.614/2014.

Infine, con deliberazione della Giunta regionale n. 709 del 23 dicembre 2014, sono state proposte le modifiche relative alla mera modalità di gestione, da pubblica a privata, per n. 4 interventi (cod. SGP MOS9.EP257PU, MOS9.EP324PU, MOS9.EP353PU e MOS9.EP462PU) inseriti nel II Atto Integrativo all’APQ “Immobili Privati in classe di priorità A” Cod.

MOS9, nonché la sostituzione di n. 5 interventi (cod. SGP MOS9.EP148PU, MOS9.EP151PU, MOS9.EP323PU, MOS9.EP337PU e MOS9.EP345PU), che si prevedeva non potessero raggiungere l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (31 dicembre 2014), con n. 8 interventi PEU, già oggetto di OGV e posti a carico di altre risorse.

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, con nota n. 291 del 14 gennaio 2015 non ha dato il proprio assenso alla proposta regionale di sostituzione degli interventi cod. MOS9.EP148PU, MOS9.EP151PU, MOS9.EP323PU, MOS9.EP337PU e MOS9.EP345PU, mentre, con nota n. 588 del 23 gennaio 2015 ha assentito alla variazione da gestione pubblica a privata degli interventi cod. MOS9.EP257PU, MOS9.EP324PU, MOS9.EP353PU e MOS9.EP462PU.

A seguito della programmazione degli interventi a carico delle risorse relative alle singole assegnazioni disposte dalla richiamata delibera del CIPE n. 62/2011, sono stati sottoscritti, tra la Regione Molise e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sensi della delibera del CIPE n. 41/2012, i seguenti Accordi di Programma Quadro «rafforzati».

Quota "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione"

- APQ *"Edifici di Culto e immobili annessi"* stipulato in data 10 luglio 2013, relativo a n. 30 interventi "cantierabili", del valore complessivo di euro 14.743.602,55 di risorse FSC 2007-2013;
- APQ *"Immobili privati in classe di priorità A"* stipulato in data 9 ottobre 2013, relativo a n. 219 interventi "cantierabili", di cui n. 41 a gestione pubblica e n. 178 a gestione privata, del valore complessivo di euro 90.508.507,79, di cui euro 86.928.173,29 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 3.580.334,50 di risorse riferite ad altre fonti;
- l'Atto Integrativo all'APQ *"Immobili privati in classe di priorità A"* stipulato in data 29 novembre 2013, relativo a n. 109 interventi "cantierabili", di cui n. 13 a gestione pubblica e n. 96 a gestione privata, del valore complessivo di euro 38.210.978,32, di cui euro 35.128.170,26 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 3.082.808,06 di risorse riferite ad altre fonti;
- APQ *"Edilizia scolastica"* stipulato in data 19 giugno 2014, relativo a n. 22 interventi (20 "cantierabili" e 2 "non cantierabili"), del valore complessivo di euro 27.859.855,43, di cui euro 19.334.970,00 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 8.524.885,43 di risorse riferite ad altre fonti;
- APQ *"Opere Pubbliche"* stipulato in data 28 luglio 2014, relativo a n. 16 interventi "cantierabili" del valore complessivo di euro 2.954.225,59, di cui euro 2.951.710,59 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 2.515,00 di risorse riferite ad altre fonti;
- APQ *"Interventi di riparazione funzionale"* stipulato in data 14 ottobre 2014, relativo a n. 137 interventi "cantierabili" del valore complessivo di euro 2.867.202,93, di cui euro 2.839.428,56 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 27.774,37 di risorse riferite ad altre fonti;
- APQ *"Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti civili"* stipulato in data 30 ottobre 2014 del valore complessivo di euro 12.005.000,00 di risorse FSC 2007-2013;
- l'Atto Integrativo all'APQ *"Interventi di riparazione funzionale"* stipulato in data 19 novembre 2014, relativo a n. 162 interventi "cantierabili" del valore complessivo di euro 4.625.858,55 di cui euro 4.563.030,46 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 62.828,09 di risorse riferite ad altre fonti;
- Il Atto Integrativo all'APQ *"Immobili privati in classe di priorità A"* stipulato in data 27 novembre 2014, relativo a n. 526 interventi (523 "cantierabili" e 3 "non cantierabili"), di cui 205 a gestione pubblica e 321 a gestione privata, del valore complessivo di euro 157.137.895,39 di risorse FSC 2007-2013.

Agli APQ e Atti Integrativi sopra descritti, si aggiunge lo strumento (APQ) MOSZ *"Azioni di sistema"*, in cui sono confluite, nell'unico intervento MOSZ.01, le risorse relative alle azioni di sistema, in misura del 3 per cento della quota FSC "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione", definite nei singoli APQ/Atti Integrativi sottoscritti, per un valore complessivo di euro 10.068.959,44.

Quota Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)

- APQ *"Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)"* stipulato in data 23 maggio 2014, relativo a n. 104 interventi (99 "cantierabili" e 5 "non cantierabili"), del valore complessivo di euro 17.812.452,45 di cui euro 17.732.177,99 di risorse FCS 2007-2013 ed euro 80.274,46 di risorse riferite ad altre fonti;

Quota Danni alluvionali (OPCM 3268/03)

- APQ *"Danni alluvionali OPCM 3268/2003"* stipulato in data 1° ottobre 2014, relativo a n. 56 interventi (54 "cantierabili" e 2 "non cantierabili"), del valore complessivo di euro 18.223.067,10 di cui euro 15.386.133,62 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 2.836.933,48 di risorse riferite ad altre fonti;

Quota Danni alluvionali (DPCM 2210/10)

- APQ “Danni alluvionali DPCM 2210/2010” stipulato in data 20 novembre 2014, relativo a n. 46 interventi “cantierabili” del valore complessivo di euro 6.000.060,53 di cui euro 6.000.000,00 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 60,53 di risorse riferite ad altre fonti.

Di seguito la sintesi degli APQ e Atti Integrativi alla data di stipula.

Codice	Descrizione	Data stipula	N. interventi	Valore totale finanziamenti	Valore FSC	Altre fonti
MOS1	Edifici di culto e immobili annessi	10/07/2013	30	14.743.602,55	14.743.602,55	-
MOS2	Immobili privati in classe di priorità "A"	09/10/2013	219	90.508.507,79	86.928.173,29	3.580.334,50
MOS3	Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	29/11/2013	109	38.210.978,32	35.128.170,26	3.082.808,06
MOS4	Edilizia scolastica	19/06/2014	22	27.859.855,43	19.334.970,00	8.524.885,43
MOS5	Opere Pubbliche	28/07/2014	16	2.954.225,59	2.951.710,59	2.515,00
MOS6	Interventi di riparazione funzionale	14/10/2014	137	2.867.202,93	2.839.428,56	27.774,37
MOS7	Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale	30/10/2014	1	12.005.000,00	12.005.000,00	-
MOS8	Interventi di riparazione funzionale 1° Atto integrativo	19/11/2014	162	4.625.858,55	4.563.030,46	62.828,09
MOS9	Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	27/11/2014	526	157.137.895,39	157.137.895,39	-
MOSZ	Azioni di sistema (3% su quota FSC Sisma 2002 - percorso ricostruzione)	-	1	10.068.959,44	10.068.959,44	-
MOA1	Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09	23/05/2014	104	17.812.452,45	17.732.177,99	80.274,46
MOA2	Danni alluvionali OPCM 3268/2003	01/10/2014	56	18.223.067,10	15.386.133,62	2.836.933,48
MOA3	Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10 - PRA MOLISE 2007-2013	20/11/2014	46	6.000.060,53	6.000.000,00	60,53
Totale			1.429	403.017.666,07	384.819.252,15	18.198.413,92

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

La delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U. n.140 del 17 giugno 2013*), recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - attuazione dell’articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo”, nel disporre, al punto 2, la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), previsto dalle delibere del CIPE n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale, ha esteso tale termine anche alle risorse della delibera n. 62/2011.

Con delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (*G.U. n. 75 del 31 marzo 2014*), concernente il FSC 2007-2013, il CIPE ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla predetta delibera n. 14/2013, con riferimento agli interventi finanziati, fra l’altro, dalla delibera CIPE n. 62/2011 (punto 1.).

La successiva delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21 (*G.U. n. 220 del 22 settembre 2014*), recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”, nel disporre la salvaguardia degli interventi per i quali l’assunzione dell’OGV fosse prevista entro il 31 dicembre 2014, ha stabilito, al punto 2.4, che sono sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli interventi per i quali non fosse rispettato detto termine.

La stessa delibera ha disposto, inoltre, che tali risorse potranno essere riassegnate alle Regioni interessate, al netto di una decurtazione del 15 per cento.

Le risorse sottratte al Molise ai sensi del richiamato punto 2.4 ammontano complessivamente a euro 2.966.422,45, di cui euro 2.880.021,80 riferiti a n. 13 interventi che non hanno conseguito OGV entro il 31 dicembre 2014 ed euro 86.400,65, quale relativa quota del 3 per cento delle Azioni di Sistema.

Di seguito si riportano gli interventi che non hanno conseguito OGV entro la data del 31 dicembre 2014 e il valore finanziario degli stessi con riferimento a ciascun APQ.

Codice intervento in SGP	Intervento	Risorse FSC
MOS4.ES.022	Autorizzazione alla modifica dell'intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola elementare e media in ricostruzione con l'assegnazione di un finanziamento integrativo - Scuola elementare e media	853.540,00
MOS9.EP264PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 7 Sp 1	58.052,27
MOS9.EP265PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 46 Sp 1	91.662,20
MOS9.EP273PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 2	131.316,83
MOS9.EP495PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 49 Sp 1	64.525,36
MOS9.EP524PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 65	38.969,05
MOS9.EP525PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 46	28.699,52
MOS9.EP526PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 13 Sp 1	100.400,47
MOS9.EP148PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 20 Sp 1	164.273,12
MOS9.EP151PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 17 Sp 3	328.438,92
MOS9.EP323PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 87 Sp 1	271.039,99
MOS9.EP337PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 4	128.929,86
MOS9.EP345PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 42 Sp 1	620.174,21
Totale interventi		2.880.021,80
MOSZ.01 Quota azioni di sistema 3%		86.400,65
Totale risorse da decurtare		2.966.422,45

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

I suddetti interventi, dalla sessione di monitoraggio del 28 febbraio 2015, sono posti nel Sistema Gestione Progetti (SGP) nello stato informatico "sospeso", in attesa di essere annullati, con la sola eccezione dell'intervento MOS4.ES.022.

Detto intervento, infatti, in quanto progetto di edilizia scolastica, potrà trovare copertura finanziaria per la quota di finanziamento oggetto di sanzione ai sensi dell'articolo 39 (*Norme a sostegno della sicurezza degli edifici scolastici*) della legge regionale n. 8 del 4 maggio 2015. In particolare, lo stesso dispone la seguente integrazione al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 20 agosto 2010, relativo al trasferimento ai soggetti attuatori degli effetti dei definanziamenti maturati verso la Regione Molise, in applicazione della normativa dello Stato o dell'Unione europea, a causa del mancato rispetto delle regole sottese ai finanziamenti: *"Sono fatti salvi da tale procedura automatica, in considerazione della particolare rilevanza sociale, gli interventi relativi alle scuole per i quali la Giunta regionale può disporre, in favore dei soggetti attuatori inadempienti, una nuova concessione a valere su risorse nazionali eventualmente disponibili"*.

Il valore finanziario dell'intervento MOSZ.01, originariamente pari a euro 10.068.959,44, definito dalle risorse relative alle azioni di sistema, in misura del 3 per cento della quota FSC "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione", individuate nei singoli APQ/Atti Integrativi sottoscritti, in considerazione del non raggiungimento delle OGV per gli interventi sopra riportati, è stato ridotto proporzionalmente di euro 86.400,65. Pertanto, il valore finanziario aggiornato è pari a euro 9.982.558,79.

Il Direttore dell'Agenzia per la Ricostruzione Post Sisma, Responsabile Unico degli Accordi, ha adottato i provvedimenti amministrativi di revoca del finanziamento degli interventi su indicati, con la sola eccezione dell'intervento MOS4.ES.022 per le ragioni su esposte, e gli stessi sono stati posti nello stato informatico "annullato" nella sessione di monitoraggio al 31 agosto 2018, con contestuale riduzione del valore finanziario dell'intervento MOSZ.01.

L'importo delle risorse FSC oggetto di sanzione per APQ è il seguente:

APQ	Importo FSC OGV non assunte (A)	Quota Azione di sistema da decurtare sull'intervento MOSZ.01 [3% di (A)]
MOS4 - Edilizia scolastica	853.540,00	25.606,20
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	2.026.481,80	60.794,45
Totale	2.880.021,80	86.400,65

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Alla luce di quanto sopra riportato e di quanto inserito nei successivi paragrafi 9 *MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI* e 15 *IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI*, le risorse FSC attive a valere sulla delibera del CIPE n. 62/2011, al netto sia di quelle non programmate in APQ, pari a euro 100.975,43, sia di quelle senza previsioni di OGV ai sensi dell'Allegato 2 alla delibera del CIPE n. 21/2014, pari a euro 1.609.772,42, sia di quelle risorse che, ancorché programmate non hanno raggiunto OGV nei termini, pari a euro 2.966.422,45, ammontano a euro 381.852.829,70.

Di seguito la sintesi.

	Risorse FSC assegnate delibera CIPE 62/2011 (C)	Risorse FSC sottratte (All. 2 CIPE 21/2014) (C1)	Risorse FSC post delibera CIPE 21/2014 (C2)	Risorse FSC programmate in APQ (D)	Risorse FSC OGV non assunte (E)	Risorse FSC Azione di sistema su OGV non assunte 3% di (E) (F)	Risorse non programmate Differenza (C2 - D) (G)	Risorse FSC attive (C2-E-F-G)
Sisma 2002 - percorso di ricostruzione	346.200.000,00	428.167,00	345.771.833,00	345.700.940,54	2.880.021,80	86.400,65	70.892,46	342.734.518,09
Danni alluvionali (DPCM 2210/10)	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	6.000.000,00
Danni alluvionali (OPCM 3268/03)	16.590.000,00	1.173.783,41	15.416.216,59	15.386.133,62	-	-	30.082,97	15.386.133,62
Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	17.740.000,00	7.822,01	17.732.177,99	17.732.177,99	-	-	-	17.732.177,99
Totale	386.530.000,00	1.609.772,42	384.920.227,58	384.819.252,15	2.880.021,80	86.400,65	100.975,43	381.852.829,70

Nella sessione di monitoraggio al 31 ottobre 2017 si è proceduto ad annullare, nel Sistema Gestione Progetti (SGP), l'intervento cod. MOS4.ES.020 "Edificio Scolastico - Scuola materna, elementare e media di Via Pascoli" con Soggetto Attuatore il Comune di Mafalda il cui finanziamento, di euro 3.133.500,00, era posto a carico sia delle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 62/2011, per euro 1.933.500,00 e, pertanto, monitorato nell'ambito del PRA Molise 2007/2013, che delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 63/2011, per euro 1.200.000,00 e, pertanto, monitorato nell'ambito del PAR Molise 2007/2013. Il Responsabile Unico dell'Accordo di Programma Quadro "Edilizia Scolastica" del PRA e il Responsabile della Linea di intervento V.B "Progetto Scuola sicura" del PAR, di concerto con il Responsabile dei predetti Programmi, hanno concordato di monitorare in SGP l'intervento unicamente nel PAR Molise 2007/2013 con il cod. MO5B.09. Il dettaglio dell'intervento MOS4.ES.020 è riportato nel paragrafo dedicato all'APQ "Edilizia Scolastica". Di seguito la sintesi:

Programma	Codice intervento in SGP	Intervento	Finanziamento totale	delibera CIPE n.62/2011	delibera CIPE n.63/2011	Stato in SGP
PRA Molise	MOS4.ES.020	Edificio Scolastico - Scuola materna, elementare e media di Via Pascoli	3.133.500,00	1.933.500,00	1.200.000,00	Annullato al 31.10.2017
PAR Molise	MO5B.09	Edificio Scolastico - Scuola materna, elementare e media di Via Pascoli	3.133.500,00	1.933.500,00	1.200.000,00	Attivo

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione è relativo all'attuazione degli Accordi di Programma Quadro «rafforzati» riferiti alla quota "Sisma 2002 – Percorso ricostruzione", il cui valore finanziario a carico del FSC tiene conto della riduzione delle suddette risorse, e alla quota Danni alluvionali/Eventi atmosferici il cui valore finanziario resta immutato rispetto a quello alla stipula dei relativi APQ.

Di seguito la sintesi aggiornata.

Codice	Descrizione	Data stipula	N. interventi	Totale finanziamenti	di cui FSC	Altre fonti
MOS1	Edifici di culto e immobili annessi	10/07/2013	30	14.743.602,55	14.743.602,55	-
MOS2	Immobili privati in classe di priorità "A"	09/10/2013	219	90.508.507,79	86.928.173,29	3.580.334,50
MOS3	Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	29/11/2013	109	38.210.978,32	35.128.170,26	3.082.808,06
MOS4	Edilizia scolastica	19/06/2014	21*	24.856.315,43	18.481.430,00	6.374.885,43
MOS5	Opere Pubbliche	28/07/2014	16	2.954.225,59	2.951.710,59	2.515,00
MOS6	Interventi di riparazione funzionale	14/10/2014	137	2.867.202,93	2.839.428,56	27.774,37
MOS7	Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale	30/10/2014	1	12.005.000,00	12.005.000,00	-
MOS8	Interventi di riparazione funzionale 1° Atto integrativo	19/11/2014	162	4.625.858,55	4.563.030,46	62.828,09
MOS9	Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	27/11/2014	514	155.111.413,59	155.111.413,59	-
MOSZ	Azioni di sistema (3% su quota FSC Sisma 2002 - percorso ricostruzione)	-	1	9.982.558,79	9.982.558,79	-
MOA1	Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09	23/05/2014	104	17.812.452,45	17.732.177,99	80.274,46
MOA2	Danni alluvionali OPCM 3268/2003	01/10/2014	56	18.223.067,10	15.386.133,62	2.836.933,48
MOA3	Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10 - PRA MOLISE 2007-2013	20/11/2014	46	6.000.060,53	6.000.000,00	60,53
Totale			1.416	397.902.828,06	381.852.829,70	9.673.528,49

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

*Il numero degli interventi e la dotazione finanziaria è comprensiva dell'intervento annullato MOS4.ES.020 in quanto lo stesso concorre per la quota a carico delle risorse della delibera del CIPE n. 62/2011

Il numero degli interventi per Accordo è riportato nel grafico che segue.

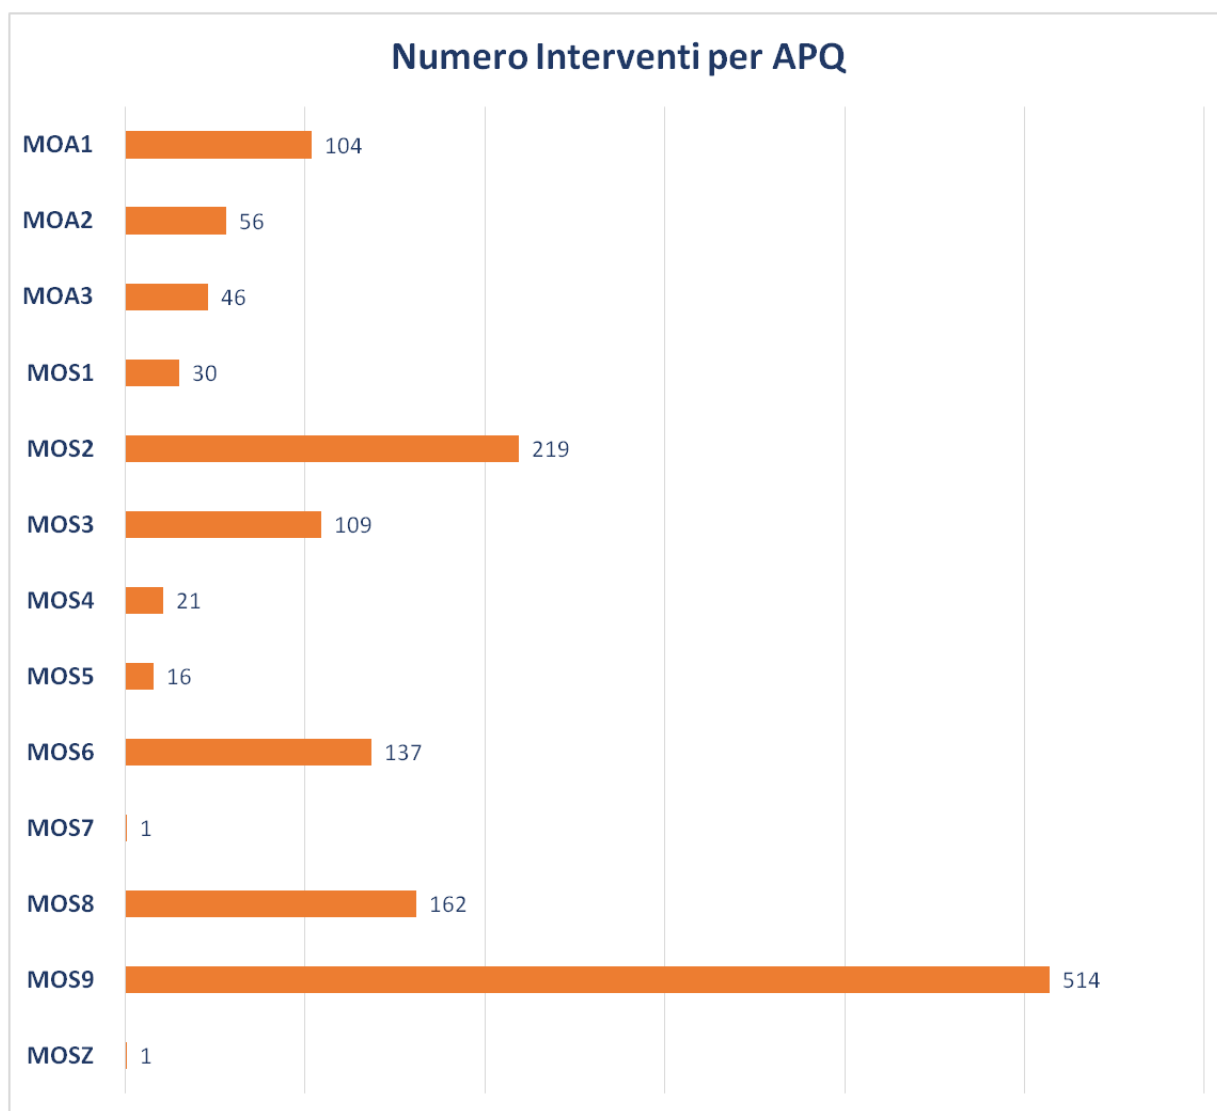


Grafico 1 – Numero di progetti per APQ

2.2. “Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)”

Come indicato al paragrafo 2, la delibera del CIPE n. 62/2011 ha assegnato al Molise, ulteriori risorse, pari a 200,000 milioni di euro, per il finanziamento della “Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)”.

Sulla base della disponibilità finanziaria assicurata dalla predetta delibera del CIPE n. 62/2011 e del cofinanziamento a carico del PAR Molise, in data 28 settembre 2012, è stato sottoscritto l’APQ «rafforzato» “Viabilità”, tra la Regione Molise, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che prevedeva la realizzazione dell’intervento “Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1^ tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3”, per un importo complessivo di 482,820 milioni di euro, di cui 200,00 milioni di euro a valere sulle risorse del FSC 2007-2013 assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, 36,58 milioni di euro a valere sulle risorse FSC 2007-2013 dell’Asse II “Accessibilità” della Linea di Intervento II.A “Accessibilità materiale” – Azione II.A.1 “Interventi strategici per la mobilità” del PAR Molise 2007-2013 e 246,24 milioni di euro quale quota del privato¹.

¹ L’Accordo di Programma «rafforzato» “Viabilità”, cod. MO2M, in cui è inserito l’unico intervento “Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vittore-Termoli) - Tratta A San Vittore-Campobasso. Avvio opere primo stralcio funzionale - 1^ tratta esecutiva Campobasso – Castelpetroso km 34,3” è stato monitorato nel PAR Molise FSC 2007-2013 (Cod. 2007MO002FA009) fino al 6 agosto 2015, data in cui il CIPE ha preso atto, con delibera n. 68, della riprogrammazione di euro 36,58 mln a carico delle risorse dell’Asse II del PAR FSC Molise 2007-2013.

La delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, al punto 2, come su esposto, ha fissato, al 31 dicembre 2013, il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) anche per le risorse assegnate dalla delibera CIPE n.62/2011.

La successiva delibera del CIPE 17 dicembre 2013, n. 94, al punto 1, con riferimento alle assegnazioni a favore delle Regioni meridionali, ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla predetta delibera n. 14/2013.

La delibera del CIPE 30 giugno 2014, n. 21, in relazione agli esiti della ricognizione di cui alla delibera n. 94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti, ha disposto, al punto 2.2, che sono sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse destinate a finanziare tutti gli interventi per i quali l'assunzione dell'OGV è prevista oltre i termini del 31 dicembre 2014 e, per il Molise, fra l'altro, le risorse destinate al finanziamento della "Bretella di collegamento meridionale A1 – A 14 (San Vittore – Termoli)", assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011, pari ad euro 200,00 milioni.

Inoltre, la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, detto "Sblocca Italia", all'articolo 3 "Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia" ha disposto:

- al comma 6 "Le risorse revocate ai sensi del comma 5 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sono attribuite prioritariamente:
 - a) al primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore;
 - b) omissis";
- al comma 9 "Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1° agosto 2014, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico del Fondo Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 confluiscono automaticamente nel nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. Entro il 31 ottobre 2014, gli Enti che a diverso titolo partecipano al finanziamento e o alla realizzazione delle opere di cui al primo periodo, confermano o rimodulano le assegnazioni finanziarie inizialmente previste";

Considerato, quindi, che, ai sensi del predetto comma 9 dell'art.3 della legge n. 164/2014, l'intervento strategico "Primo lotto funzionale asse autostradale Termoli - San Vittore", non avviato entro la data di entrata in vigore del decreto n. 133/2014 "Sblocca Italia", confluisce nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dello stesso comma la Giunta regionale, con deliberazione n. 712 del 30 dicembre 2014, successivamente integrata con deliberazione n. 76 del 17 febbraio 2015, ha rimodulato, fra l'altro, l'assegnazione finanziaria inizialmente prevista a titolo di cofinanziamento a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 dell'Asse II "Accessibilità" della Linea di Intervento II.A "Accessibilità materiale" – Azione II.A.1 "Interventi strategici per la mobilità" del PAR FSC Molise 2007-2013, pari ad euro 36,58 milioni di euro, per il finanziamento di nuovi interventi.

La proposta regionale di riprogrammazione è stata sottoposta, ai sensi del punto 7.3 della delibera del CIPE n. 166/2007 e del punto 2 della delibera del CIPE n. 41/2012, al Comitato di Sorveglianza del PAR nella seduta del 20 marzo 2015. Successivamente all'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PAR, il CIPE, nella seduta del 6 agosto 2015, con delibera n. 68, ne ha preso atto.

Rispetto, invece, alla quota del finanziamento di 200,00 mln di euro, a cui si aggiungono ulteriori 1,61 mln di euro relativi a risorse della quota Sisma (euro 428.167,00), quota Danni alluvionali OPCM 3268/03 (euro 1.173.783,41) e quota Eventi atmosferici 2008 – OPCM 3734/09 (euro 7.822,01), sempre a carico delle risorse della delibera CIPE n.62/2011, per complessivi 201,61 mln di euro, la richiamata delibera n. 21/2014 ha disposto, al punto 2.3, che le risorse sottratte alla disponibilità delle Regioni (punto 2.2.) sono riassegnate alle stesse, nell'ambito della programmazione 2014-2020, decurtate del 15 per cento, e che, per poterle utilizzare, le stesse Regioni devono concordare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri un dettagliato elenco di progetti cantierabili per i quali le relative OGV dovranno essere assunte entro il 31 dicembre 2015.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 706 del 22 dicembre 2014, ne ha proposto la riprogrammazione individuando nuovi interventi per complessivi 171,37 mln di euro.

Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 31 luglio 2015, al fine di dare completa attuazione alle riduzioni da porre a carico del FSC 2007-2013, disposte nei confronti delle Regioni da:

- Articolo 16, commi 2 e 12 bis del DL n. 95/2012 e del Decreto del MEF 7 agosto 2013;
- Articolo 1, comma 522 della Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014);

- Articolo 46, commi 6 e 7, del DL n.66/2014 - Intesa Stato Regioni del 29 maggio 2014;
- Articolo 46, comma 6 del DL n.66/2014, come modificato dalla Legge n.190/2014 (Legge di stabilità 2015)-Intesa Stato Regioni del 26 febbraio 2015;

La riduzione per la Regione Molise, del valore complessivo 24,08 mln di euro, è stata posta a carico delle risorse di cui alla suddetta proposta regionale di riprogrammazione in quanto non ancora operativa.

Per le restanti risorse, pari a euro 147.290.217,56, la Regione ha concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri la riassegnazione nell'ambito della Programmazione 2014-2020 ai sensi del punto 2.3 della delibera su richiamata delibera del CIPE n. 21/2014.

Alla data del 31 dicembre 2018 risultano riassegnate alla Regione, nell'ambito della Programmazione 2014-2020, le seguenti risorse:

- 90,00 milioni di euro con DL 22 ottobre 2016, n. 193 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;
- 44,00 milioni di euro con delibera del CIPE n. 95 del 22 dicembre 2017 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Regione Molise – incremento dotazione finanziaria del Patto per lo Sviluppo. (Delibera CIPE n. 26 del 2016)", successivamente modificata con la delibera del CIPE 25 ottobre 2018, n. 50 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Molise. Modifica della delibera CIPE n. 95 del 2017".
- 22,14 milioni di euro con delibera del CIPE 28 febbraio 2018, n. 11 "Approvazione dell'Addendum al Piano Operativo Ambiente con assegnazione di ulteriori risorse FSC 2014-2020".

3. RISULTATI E ANALISI DEI PROGRESSI - AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA

Priorità QSN	Obiettivo generale	Obiettivo specifico	Linea di azione	Dotazione FSC PRA Meuro	Progetti Attivati		Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								Azioni di sistema 3% a valere su FSC
					n.	Finanziamenti Meuro	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provv.	Stato FSC	
3 - Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	3.2 - Garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese	3.2.1 - Accrescere la capacità di offerta, la qualità e l'efficienza del servizio idrico, e rafforzare la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi naturali	Danni alluvionali DPCM 2210/10	6,000	46	6,001	-	-	-	0,001	-	-	-	6,000	-
			Danni alluvionali DPCM 3268/03	15,386	56	18,223	-	0,940	1,750	0,147	-	-	-	15,386	-
			Eventi atmosferici 2008 DPCM 3734/09	17,732	104	17,812	-	0,010	-	0,070	-	-	-	17,732	-
			Sisma 2002 - percorso ricostruzione*	342,735	1.210**	355,865	-	-	0,596	0,003	1,838	5,232	4,263	343,935***	9,983
Totale				381,853	1.416	397,901	-	0,950	2,346	0,221	1,838	5,232	4,263	383,053	9,98

Tabella 1 - Totale Finanziamenti del Programma alla data di monitoraggio del 31.12.2018 - (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

* I valori finanziari sono riportati al netto delle risorse degli interventi che non hanno raggiunto OGV al 31.12.2014

** Il numero degli interventi e la dotazione finanziaria è comprensiva dell'intervento annullato MOS4.ES.020

*** Il valore FSC include 1,200 mln di euro FSC del PAR Molise dell'intervento MOSB.09

Alla data del 31.12.2018, nell'ambito del PRA Molise - Linea di Azione "Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione" risultano sottoscritti n. 9 Accordi di Programma Quadro "rafforzati", di cui tre Atti integrativi, per un totale di n. 1.209 interventi per un finanziamento complessivo aggiornato, al netto delle Azioni di sistema, di euro 345.833.104,75 di cui euro 332.751.959,30 di risorse FSC.

Le Azioni di sistema, pari al 3 per cento della quota FSC Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione, confluite nello strumento (APQ) cod. SGP MOSZ, ammontano ad euro 9.982.558,786, al netto di euro 86.400,65, quale decurtazione pro-quota sul valore FSC degli interventi che al 31.12.2014 non hanno raggiunto l'OGV.

Il finanziamento complessivo degli Accordi relativi alla quota Sisma 2002 ammonta a euro 355.865.663,54, di cui euro 342.734.518,09 a carico delle risorse FSC 2007-2013.

Risulta, pertanto, attivato il 99,86% delle risorse assegnate dalla CIPE 62/2011 alla Linea di Azione.

Nell'ambito della Linea di Azione "Eventi atmosferici 2008 OPCM n. 3734/09" risulta sottoscritto il relativo Accordo di Programma Quadro "rafforzato" MOA1 che prevede n. 104 interventi per un valore di finanziamento di euro 17.812.452,45, di cui FSC euro 17.732.177,99, pari a 99,96% delle risorse assegnate dalla delibera CIPE 62/2011.

Inoltre, nell'ambito della Linea di Azione "Danni alluvionali OPCM n. 3268/2003" risulta sottoscritto il relativo Accordo di Programma Quadro "rafforzato" MOA2 che include n. 56 interventi per un valore complessivo di finanziamento di euro 18.223.067,10, di cui FSC 15.386.133,62. Risulta, pertanto, attivato il 92,74% delle risorse assegnate.

Infine, nell'ambito della Linea di Azione "Danni alluvionali DPCM n. 2210/10" risulta sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "rafforzato" MOA3 relativo a n. 46 interventi per un valore complessivo di finanziamento di euro 6.000.060,53, di cui euro 6.000.000,00 di risorse FSC, pari al 100% delle risorse assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011 per la suddetta Linea di Azione.

In sintesi, gli APQ "rafforzati", a carico delle risorse assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, sono complessivamente 13, di cui 3 Atti integrativi e 1 APQ relativo alle Azioni di Sistema, per complessivi n. 1.416 interventi attivi.

Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati relativi ai progetti "verificati", "sospesi" e "chiusi" alla versione al 31.12.2018 e i progetti "chiusi" e "sospesi" alle versioni precedenti. I dati dei progetti "non monitorati" sono relativi all'ultima versione verificata.

Si evidenzia che tutte le tabelle del presente Rapporto Annuale di Esecuzione, desunte dal report "RAE Programmazione 2007/2013" reso disponibile dal sistema gestionale "Ambienti Conoscitivi" dell'ACT, sono state opportunamente

rimodulate, sottraendo i valori numerici, economici e finanziari dei progetti, sopra richiamati, che non hanno assunto OGV nei termini stabiliti e che sono stati posti nello stato informatico "annullato". È stato, invece, aggiunto, con i relativi valori finanziari ed economici, l'intervento MOS4.ES.020 annullato in SGP dal punto di vista dell'"aggancio" al PRA Molise 2007-2013, ma attivo e monitorato, sempre in SGP, nell'ambito del PAR Molise 2007-2013.

Inoltre, i valori finanziari ed economici sono stati ricalcolati in base alla corretta imputazione percentuale delle fonti di finanziamento.

Infine, i valori FSC fanno riferimento alle risorse FSC a carico del PRA Molise (dai conteggi FSC è stato sottratto il valore FSC paria ad euro 1.200.000,00 a valere sul FSC del PAR Molise).

Nella Tabella 2 è riportato il valore finanziario complessivo degli Accordi, al 31 dicembre 2018, dato dalla differenza tra il valore del finanziamento e le economie.

Avanzamento del Programma - Strumenti	Numero	Valore Totale	Valore FSC
SAD avviati	0	0,00	0,00
APQ stipulati	13	385.726.680,99	370.522.424,66
Totale	13	385.726.680,99	370.522.424,66

Tabella 2 - Avanzamento del Programma per Strumenti alla data di monitoraggio del 31.12.2018 (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

La Tabella 3 evidenzia che dei n. 1.416 progetti monitorati in SGP, validati, consolidati e tutti attivi, n. 739 sono relativi alla realizzazione di opere e lavori pubblici, n. 3 all'acquisizione di beni e servizi e n. 674 all'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui.

Si segnala, inoltre, che, per alcuni interventi, vi è stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione della natura dello stesso. Nello specifico, si rimanda allo stato di attuazione analitico dei singoli Accordi.

Avanzamento del Programma - Progetti	Numero	Valore (Finanziamenti - Economie)	
		Totale	di cui FSC
Progetti attivi			
- per la realizzazione di opere e lavori pubblici	739	233.393.638,24	220.951.500,89
- per l'acquisizione di beni e servizi	3	10.196.449,23	10.196.449,23
- per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	674	142.136.593,52	139.374.474,54
Totale	1.416	385.726.680,99	370.522.424,66

Tabella 3 - Avanzamento del Programma per Progetti alla data di monitoraggio del 31.12.2018 (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Di seguito la rappresentazione grafica.

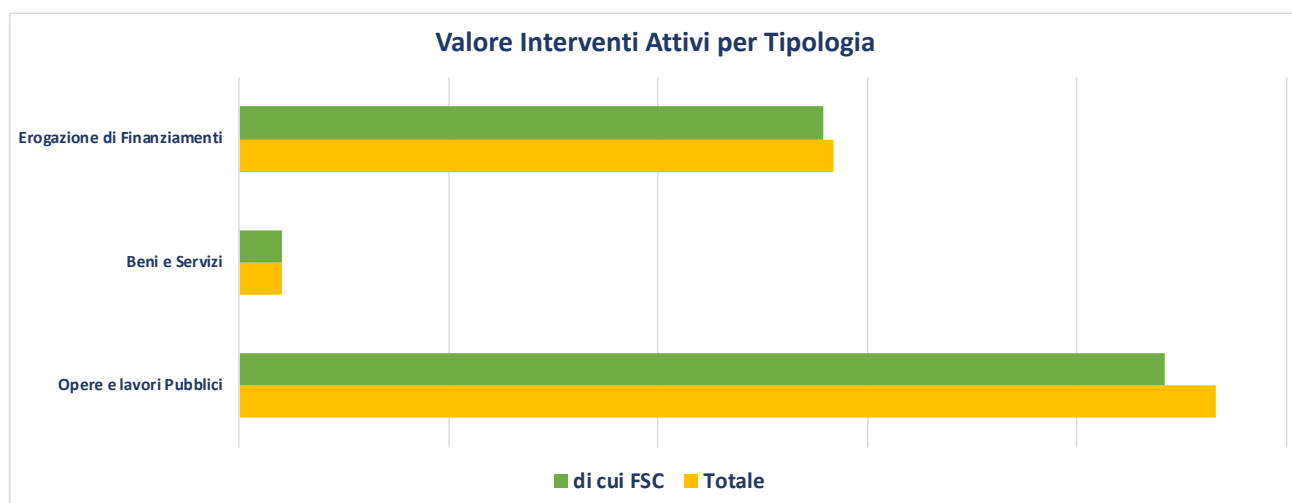


Grafico 2 – Valore Progetti Attivi per tipologia

3.1. AVANZAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE OPERE E LAVORI PUBBLICI

La Tabella 4 fa riferimento a n. 502 progetti di opere e lavori pubblici per i quali le rispettive procedure di aggiudicazione sono state portate a termine. Questi progetti rappresentano il 35,45 per cento del totale degli interventi validati. La tabella, inoltre, riassume le diverse tipologie di procedure di aggiudicazione.

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione	Iter Procedurale	Numero progetti 2018	Importo attività 2018
1 - Procedura Aperta	Acquisizione Offerte	61	-
	Aggiudicazione Definitiva	61	18.714.324,80
	Aggiudicazione Provvisoria	61	-
	Pubblicazione Bando	60	38.467.523,88
	Stipula Contratto	61	36.090.734,44
Totale Procedura Aperta		61	93.272.583,12
2 - Procedura Ristretta	Acquisizione Offerte	2	-
	Aggiudicazione Definitiva	2	819.161,28
	Aggiudicazione Provvisoria	2	-
	Pubblicazione Bando	2	860.482,81
	Selezione Offerenti	2	-
	Stipula Contratto	2	860.482,81
Totale Procedura Ristretta		2	2.540.126,90
3 - Procedura Negoziata con Bando	Acquisizione Offerte	6	-
	Aggiudicazione Definitiva	6	1.133.492,30
	Aggiudicazione Provvisoria	6	-
	Negoziante delle Offerte	6	-
	Pubblicazione Bando	6	1.200.402,33
	Selezione Offerenti	6	-
	Stipula Contratto	6	1.207.582,79
Totale Procedura Negoziata con Bando		6	3.541.477,42
4 - Procedura Negoziata senza Bando	Acquisizione Offerte	366	433.487,48
	Aggiudicazione Definitiva	366	43.199.743,05
	Aggiudicazione Provvisoria	366	533.932,93
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	366	818.794,87
	Invito a presentare le Offerte	366	433.487,48
	Stipula Contratto	366	87.943.022,43
Totale Procedura Negoziata senza Bando		366	133.362.468,24
5 - Procedura in Economia - Amministrazione diretta	Individuazione Lavori in Economia	11	502.704,23
Totale Procedura in Economia - Amministrazione diretta		11	502.704,23
6 - Procedura in Economia - Cottimo fiduciario	Acquisizione Offerte	54	343.233,59
	Aggiudicazione (Pubblicazione nominativi affidatari)	54	570.120,46
	Individuazione degli Offerenti (Operatori economici)	54	343.233,59
	Individuazione Lavori in Economia	54	336.581,97
	Invito a presentare le Offerte	54	343.233,59
	Stipula Contratto	54	2.516.982,51
Totale Procedura in Economia - Cottimo fiduciario		54	4.453.385,71
8 - Affidamento diretto	Stipula contratto	2	22.328,08
Totale Affidamento diretto		2	22.328,08
Totale		502	237.695.073,70

Tabella 4 - Distribuzione progetti opere e lavori pubblici per procedura di Aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31.12.2018 - Fonte Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE

3.2. AVANZAMENTO FINANZIARIO

Il valore complessivo degli interventi, validati in SGP al 31.12.2018, è di euro 397.901.243,61, come riportato nella Tabella 5.

Programma: PRA - Molise	Numero Progetti	Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
Totale	1.416	397.901.243,61	380.031.496,40	231.382.328,96

Tabella 5 - *Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31.12.2018 (Dati rielaborati da report estratti di Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE*

Alla stessa data di monitoraggio, il valore degli impegni giuridicamente vincolanti è di euro 380.031.496,40 (pari al 95,51% del valore dei finanziamenti) e quello dei pagamenti totali è di euro 231.382.328,96 (pari al 58,15% dei finanziamenti e al 60,88% degli impegni).

L'avanzamento economico, in termini di costo realizzato del Programma, è restituito nelle Tabelle e nei grafici che seguono, rispettivamente, per le assegnazioni "Sisma 2002 Percorso di ricostruzione" e "Danni alluvionali/Eventi atmosferici".

APQ Sisma 2002	Costo Totale (Finanziamenti-Economie)	Costo Totale FSC (Finanziamento FSC – Economie FSC)	Costo Realizzato	Costo Realizzato FSC
MOS1	14.455.813,35	14.455.813,35	14.080.676,30	14.080.676,30
MOS2	85.786.968,10	82.289.925,51	70.284.215,13	67.598.852,26
MOS3	37.251.140,51	34.274.506,00	26.155.902,07	23.973.422,68
MOS4	23.218.370,85	17.497.731,84	16.456.319,84	12.327.361,04
MOS5	2.882.824,66	2.880.342,58	2.267.719,37	2.265.237,29
MOS6	2.702.008,20	2.674.233,83	2.702.008,20	2.674.233,83
MOS7	11.990.236,05	11.990.236,05	11.990.236,05	11.990.236,05
MOS8	4.335.416,41	4.272.588,32	3.734.325,99	3.671.497,90
MOS9	152.886.843,90	152.886.843,90	81.705.129,36	81.705.129,36
MOSZ	9.982.558,79	9.982.558,79	9.972.006,72	9.972.006,72
Totale	345.492.180,82	333.204.780,17	239.348.539,03	230.258.653,43

(Dati rielaborati da report estratti di Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

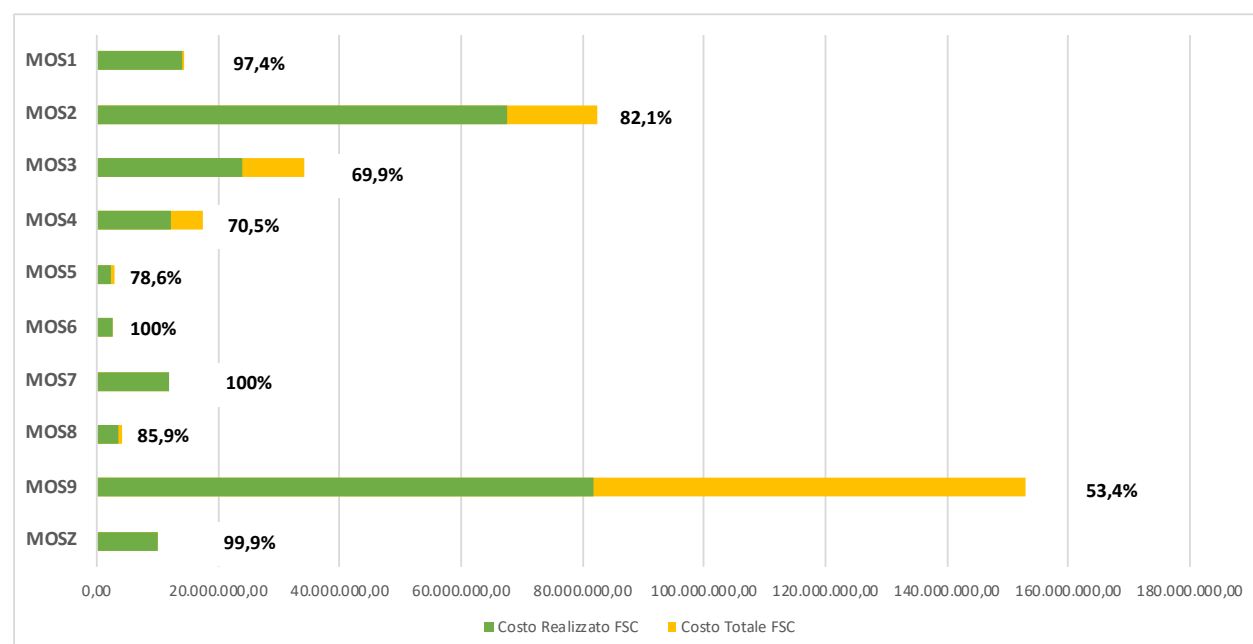


Grafico 3 – Percentuale di avanzamento Costo realizzato FSC

APQ Danni alluvionali/ Eventi atmosferici	Costo Totale (Finanziamenti- Economie)	Costo Totale FSC (Finanziamento FSC – Economie FSC)	Costo Realizzato	Costo Realizzato FSC
MOA1	16.720.287,05	16.640.425,38	16.720.287,05	16.640.425,38
MOA2	17.653.666,16	14.816.732,68	17.185.773,46	14.348.839,98
MOA3	5.860.546,96	5.860.486,43	5.860.546,96	5.860.486,43
TOTALE	40.234.500,17	37.317.644,49	39.766.607,47	36.849.751,79

(Dati rielaborati da report di Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

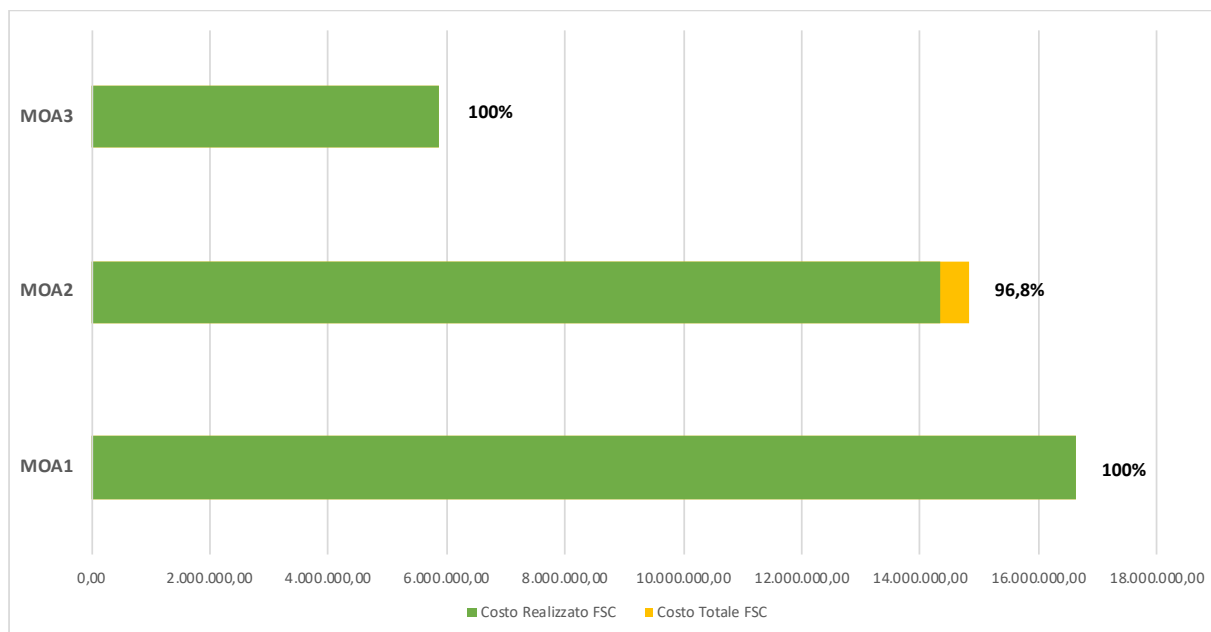


Grafico 4 – Percentuale di avanzamento costo realizzato FSC

I trasferimenti dallo Stato alla Regione, alla data del 31.12.2018, rispettivamente per le assegnazioni "Sisma 2002 Percorso di ricostruzione" e "Danni alluvionali/Eventi atmosferici", ammontano a euro 256.903.670,89 così distinti:

Sisma 2002 "Percorso ricostruzione"	
Domanda di pagamento	Importo (euro)
I Quota (Anticipazione)	27.696.000,00
II Quota	27.696.000,00
III Quota	27.661.746,64
IV Quota	26.621.299,15
V Quota	27.418.761,45
VI - sub Quota I	13.709.380,73
VI - sub Quota II	13.709.380,73
VII Quota	27.418.761,45
VIII Quota	27.418.761,45
Totale	219.350.091,59

Danni alluvionali/Eventi atmosferici	
Domanda di pagamento	Importo (euro)
I Quota (Anticipazione)	3.224.000,00
II, III e IV Quota	9.293.859,72
V e VI Quota	6.258.929,86
VII Quota	3.129.465,00
VIII Quota	3.129.465,00
IX e X Quota	6.258.929,86
XI e XII Quota	6.258.929,86
Totale	37.553.579,30

In relazione ai trasferimenti riferiti alla Quota "Sisma 2002 Percorso di ricostruzione", con nota prot. n. 82109/2016 del 13 luglio 2016, il Presidente della Regione Molise ha richiesto al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di assicurare un livello di liquidità tale da consentire i pagamenti alle imprese impegnate nei lavori di ricostruzione con capacità finanziaria insufficiente per garantire la continuità delle attività, di disporre l'erogazione delle risorse FSC 2007-2013 riferite alla suddetta Quota per importi pari al 4% della dotazione finanziaria aggiornata, pari a euro 342.734.518,08. Il Capo del Dipartimento per le Politiche di Coesione, con

propria nota DPCoe n. 0002061 - P - 04/08/2016, ha dato l'assenso alla su richiamata richiesta della Regione, in deroga alle modalità di trasferimento stabilite dalla delibera del CIPE n. 166/2007.


3.3. AVANZAMENTO PROCEDURALE


La Tabella 6 riporta n. 739 interventi validati, relativi a “Realizzazione di opere pubbliche”, di cui n. 370 risultano terminati (pari al 50% degli interventi validati e al 19,35 di incremento percentuale rispetto al 2017), n. 326 (44,11%) sono in corso di realizzazione, mentre, per n.3 interventi (pari al 5,81% degli interventi validati), la fase di esecuzione lavori non è ancora avviata.

Tipo Operazione	Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	n. Progetti	Valore (Finanziamenti-Economie)
Realizzazione di opere pubbliche	Realizzazione OOPP	Chiusura Intervento	12	1.190.092,35
		Collaudo	33	7.965.275,55
		Esecuzione Lavori	326	129.729.640,23
		Funzionalità	325	85.241.967,84
		Progettazione Esecutiva	43	9.266.662,27
Totale			739	233.393.638,24

Tabella 6 - *Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori* (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Di seguito la rappresentazione grafica

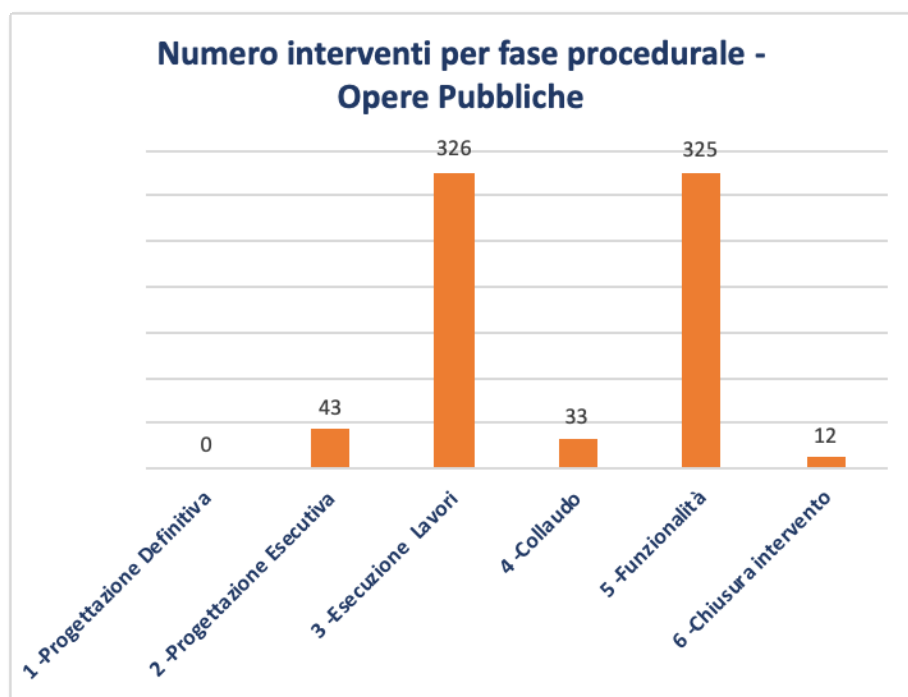

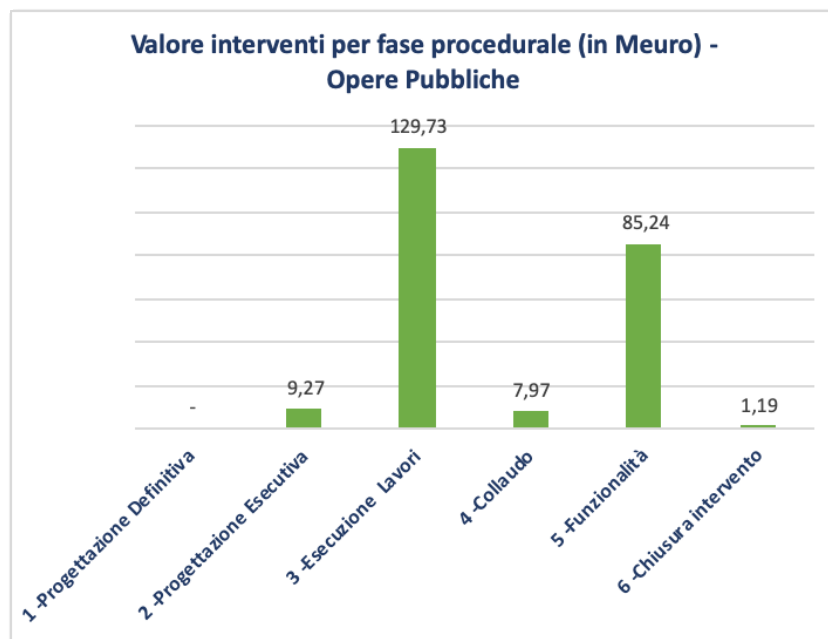


Grafici 5 e 6 - Opere pubbliche


La Tabella n. 7 riporta la distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale degli interventi/operazioni di “acquisizione di beni e servizi”. L’intervento che si trova in “esecuzione fornitura” è quello inserito in MOSZ “Azioni di sistema”..

Tipo Operazione	Iter	Progetti per Fase procedurale attuale Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	n. Progetti	Valore (Finanziamenti- Economie)
Acquisizione di beni e servizi	Acquisizione Servizi	Esecuzione Fornitura	1	9.982.558,79
	Acquisizione Beni	Verifiche e controlli	2	213.890,44
Totale			3	10.196.449,23

Tabella 7 - **Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - acquisizione di beni e servizi** (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Di seguito la rappresentazione grafica.

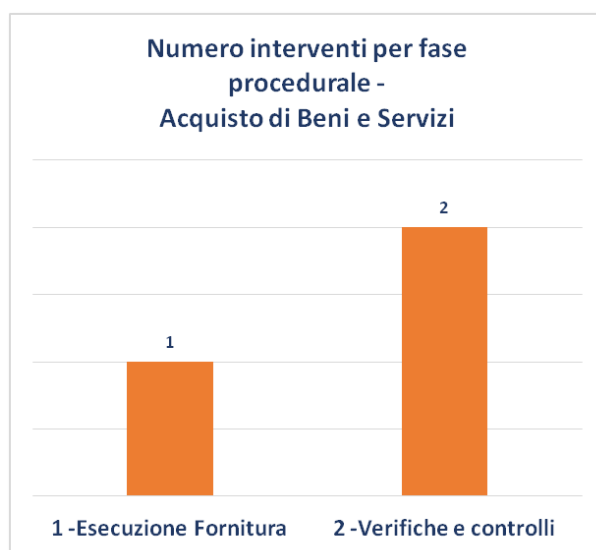

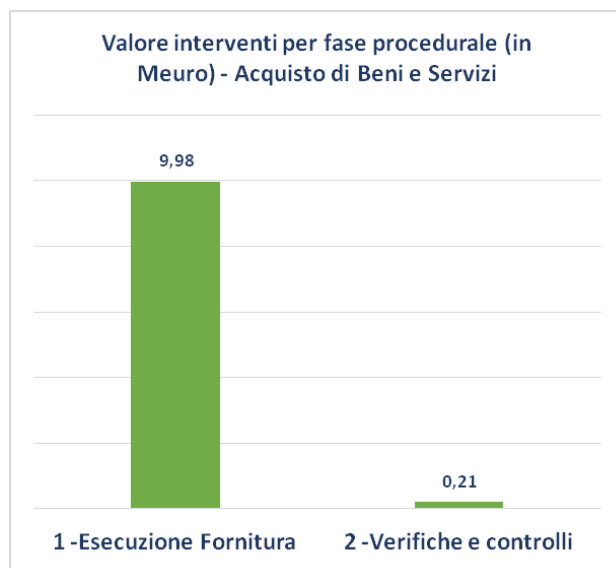


Grafici 7 e 8 – Acquisto di Beni e Servizi (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

La Tabella 8, invece, riporta n. 674 interventi validati e relativi alla “Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui”, di cui n. 289 risultano conclusi (pari al 42,88% degli interventi validati), n. 331 in corso di realizzazione e per n.54 interventi risulta formalizzata la concessione di finanziamento.

Tipo Operazione	Iter	Progetti per Fase procedurale attuale - Operazioni di realizzazione Opere Pubbliche	n. Progetti	Valore (Finanziamenti-Economie)
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Aiuti a Individui	Chiusura Intervento	289	16.335.598,96
		Concessione finanziamento	54	9.603.194,96
		Esecuzione interventi	331	116.197.799,60
Totale			674	142.136.593,52

Tabella 8 - **Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui**
Dati rielaborati da report di Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE

Di seguito la rappresentazione grafica.

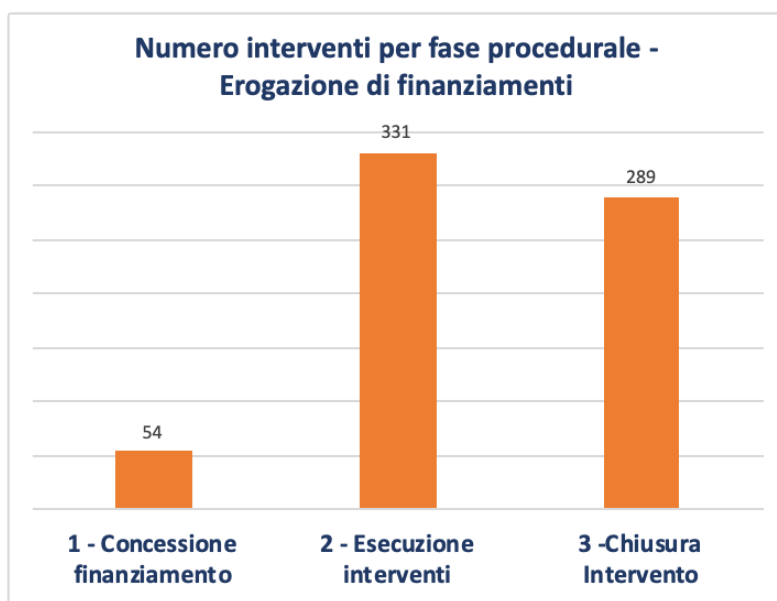

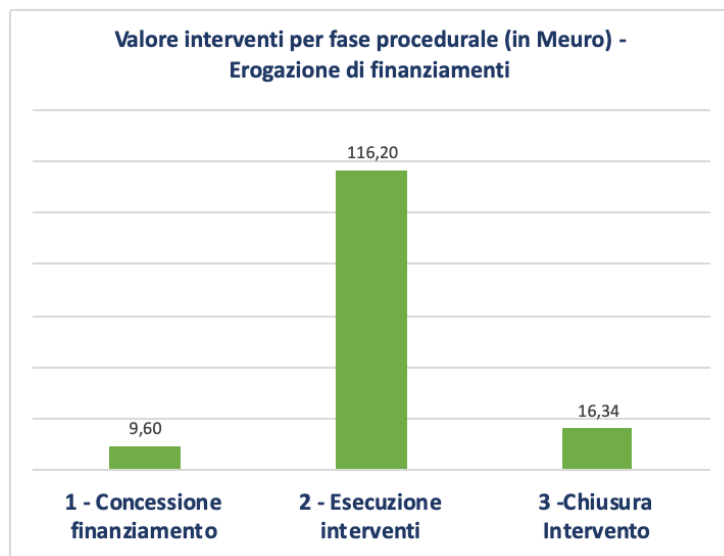


Grafico 9 e 10-- Erogazione di finanziamenti (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

3.4. AVANZAMENTO ECONOMICO

Al 31.12.2018, il valore di costo realizzato del PRA Molise è aumentato, in termini percentuali di 31,47 punti rispetto al 2017 attestandosi a euro 279.115.146,50, pari al 70,15% dei finanziamenti attivati. Le economie riprogrammabili sono pari ad euro 12.174.562,62.

Programma: PRA - Molise	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore	Costo Realizzato	Economie
			(Finanziamenti - Economie)		
Totale	1.416	397.901.243,61	385.726.680,9999	279.115.146,5050	12.174.562,6262

Tabella 9 - Avanzamento economico del Programma alla data di monitoraggio del 31.12.2018 (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

3.5. AVANZAMENTO FISICO

	Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31.12.2018
Indicatore di Programma	Estensione dell'intervento in lunghezza - (KILOMETRI)	4	240.323,31	3,8	3,8
	Superficie oggetto di intervento - (METRI QUADRATI)	162	36.145.953,27	3.061	3.047

Sezione : Indicatore di Programma

	Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31.12.2018
Indicatore di realizzazione fisica	Ampliamento lunghezza rete - (METRI LINEARI)	1	250.000,00	416	416
	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) - (KILOMETRI)	43	13.872.520,11	2.213,85	3.707,69
	Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) - (METRI LINEARI)	43	8.190.751,38	27.899,68	27.739,68
	Giornate/uomo prestate - (NUMERO)	3	10.178.502,89	2.215	1092
	Lunghezza dell'impianto - (METRI LINEARI)	1	19.607,99	116,36	116,36
	Lunghezza rete - (METRI LINEARI)	5	709.277,75	2.746	2.746

	Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31.12.2018
	Lunghezza rete oggetto di intervento - (KILOMETRI)	4	419.979,40	3,26	3,26
	Non Richiesto - (Non applicabile)	1	2.005.000,00	1	1
	Potenza installata oggetto di intervento - (KILOWATT)	1	95.859,50	0,6	0,6
	Riduzione nei consumi energetici - (TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO)	6	761.898,07	3.403,51	1.484
	Superficie oggetto di intervento (mq) - (METRI QUADRATI)	147	59.428.529,46	913.961,79	899.805,49
	Unità di beni acquistati - (NUMERO)	2	213.890,44	123	123
	Volume oggetto di intervento - (METRI CUBI)	1.161	291.863.554,55	1.787.681,67	880.189,21

Sezione : Indicatore di realizzazione fisica

	Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31.12.2018
Indicatore Occupazionale	Giornate/uomo attivate fase di cantiere - (NUMERO)	377	136.763.016,56	225.901	156.590,11
	Giornate/uomo complessivamente attivate - (NUMERO)	260	90.056.835,77	121.441,71	69.576,25
	Giornate/uomo necessarie alla messa in opera - (NUMERO)	12	1.903.478,43	1.096	742
	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto - (NUMERO)	1	100.000,00	90	0
	Non Richiesto - (NUMERO)	1	12.005.000,00	1	1
	Occupazione creata - (NUMERO)	738	152.951.938,76	270.849,61	121.206,57

Sezione : Indicatore Occupazionale

	Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
		Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31.12.2018
Indicatori di Risultato QSN	Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (% - Non Definito)	1.416	397.771.283,61		

Tabella 10 - Avanzamento fisico del Programma alla data di monitoraggio del 31.12.2018 - Fonte Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE

4. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE PRIORITÀ DEL PROGRAMMA

Nella Tabella 11 è riportato l'avanzamento finanziario del PRA Molise 2007/2013 al 31.12.2018 con riferimento alla priorità del QSN.

Priorità	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
	1.416	397.901.243,61	368.807.558,18	169.977.876,33
Totale	1.416	397.901.243,61	368.807.558,18	169.977.876,33

Tabella 11 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31.12.2018 (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

5. STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DEGLI APQ E DEGLI ATTI INTEGRATIVI

Nella Tabella 12 è riportato l'avanzamento finanziario del PRA Molise 2007/2013 al 31.12.2018 con riferimento agli Accordi di Programma Quadro e Atti integrativi stipulati.

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MOA1 - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	104	17.812.452,45	16.813.417,29	13.664.183,03
MOA2 – Danni alluvionali OPCM 3268/2003	56	18.223.067,10	17.676.715,19	15.332.630,42
MOA3 - Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10	46	6.000.060,53	5.860.546,96	5.468.394,91
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	30	14.743.602,55	14.455.963,35	13.633.153,11
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	219	90.508.507,78	83.615.673,62	64.778.177,26
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	109	38.210.978,32	36.298.680,23	22.014.514,78
MOS4 - Edilizia scolastica	21	24.856.315,43	20.638.726,32	14.303.517,34
MOS5 - Opere pubbliche	16	2.954.225,59	2.663.389,60	1.878.191,43
MOS6 – Interventi di riparazione funzionale	137	2.867.202,93	2.702.008,20	2.553.751,97
MOS7 - Anticipazione al Comune di S.Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale	1	12.005.000,00	12.005.000,00	11.990.236,05
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale - I^ Atto Integrativo	162	4.625.858,55	4.449.200,35	3.220.829,75
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "All Atto Integrativo	514	155.111.413,59	152.880.168,57	52.572.742,19
MOSZ - Azioni di sistema	1	9.982.558,79	9.972.006,72	9.972.006,72
Totale	1416	397.901.243,61	380.031.496,40	231.382.328,96

Tabella 12 - Avanzamento finanziario del Programma articolato per APQ alla data di monitoraggio del 31.12.2018 (Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Di seguito la restituzione grafica.

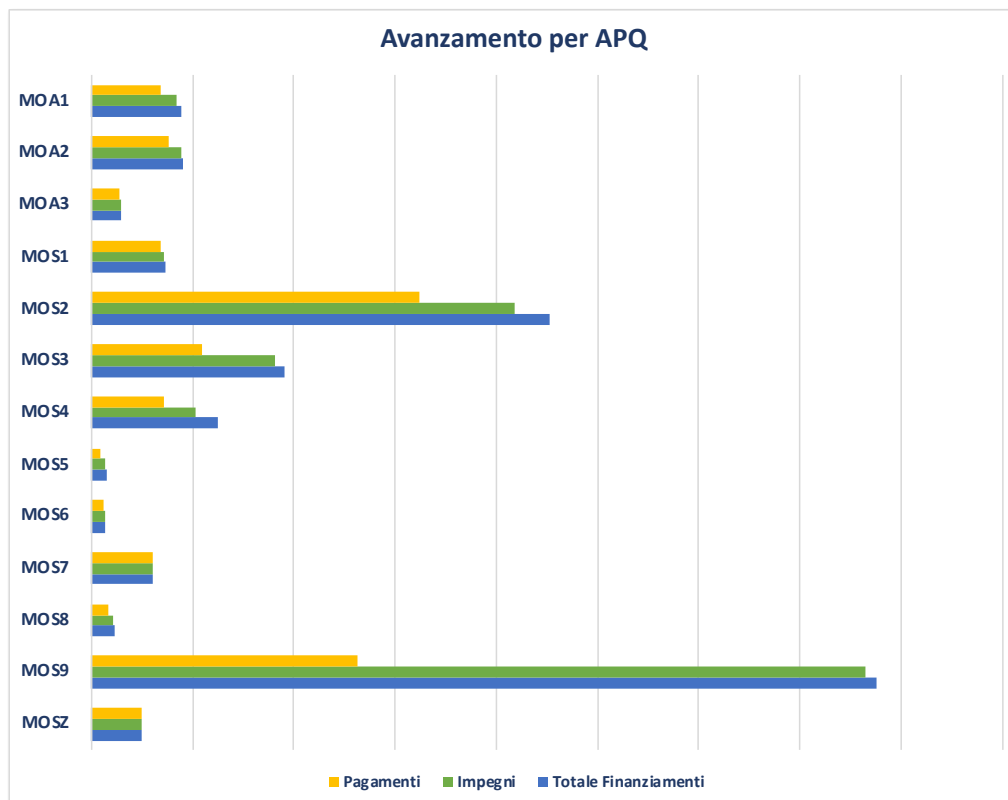


Grafico 11 – Avanzamento finanziario per APQ

6. ANALISI QUALITATIVA DELLA GESTIONE DELLE ECONOMIE

Al 31.12.2018 si rilevano le economie complessive riportate nello schema che segue, distinte per assegnazione e per APQ:

Codice e titolo APQ	Economie euro	di cui FSC CIPE 62/2011 euro
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	287.789,20	287.789,20
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	4.721.539,68	4.638.247,78
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	959.837,81	853.664,26
MOS4 - Edilizia scolastica	1.637.944,58	983.698,16
MOS5 - Opere pubbliche	71.400,93	71.368,01
MOS6 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE	165.194,73	165.194,73
MOS7 - Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale	14.763,95	14.763,95
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale - I^ Atto Integrativo	290.442,14	290.442,14
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" II Atto Integrativo	2.224.569,69	2.224.569,69
MOSZ - Azioni di sistema	-	-
MOA1 - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	1.092.165,40	1.091.752,61
MOA2 - DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003	569.400,94	569.400,94
MOA3 - Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10 - PRA MOLISE 2007-2013	139.513,57	139.513,57
Totale	12.174.562,62	11.330.405,04

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Linea di azione	Economie	di cui FSC CIPE 62/2011 euro
Sisma 2002 - percorso di ricostruzione	10.373.482,71	9.529.325,13
Danni alluvionali (DPCM 2210/10)	139.513,57	139.513,57
Danni alluvionali (OPCM 3268/03)	569.400,94	569.400,94
Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	1.092.165,40	1.092.165,40
Totale	12.174.562,62	11.330.405,04

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Così come evidenziato nel Rapporto Annuale di Esecuzione del 2017, alcuni interventi inseriti negli Accordi di Programma Quadro e Atti integrativi a carico delle risorse riferite alla Quota "Sisma 2002-Percorso ricostruzione", la cui copertura finanziaria è assicurata da più fonti di finanziamento e riportati nell'Allegato A allo stesso, presentavano economie evidenziate in SGP non correttamente imputate a ciascuna fonte di finanziamento. Per tale motivo gli interventi erano stati posti nello stato informatico "non monitorato".

Nel corso del 2018, così come rappresentato nei Rapporti Annuali di Monitoraggio il RUA ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere le cause di sospensione e, conseguentemente, a monitorarne l'avanzamento procedurale e finanziario.

MOS1 – APQ “EDIFICI DI CULTO E IMMOBILI ANNESSI”

Con deliberazione 2 ottobre 2012, n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione". Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi a Edifici di culto e immobili annessi.

In data 10 luglio 2013 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Edifici di culto e immobili annessi”, del valore complessivo di euro 14.743.602,55 euro a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011, relativo ai soli 30 interventi di edilizia di culto del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012.

Avanzamento APQ:

Tutti gli interventi alla data del 30 giugno 2014 hanno raggiunto l'OGV (aggiudicazione provvisoria). In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi”, con evidenza del numero degli interventi e del valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Cofinanziamento Soggetti Attuatori	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	30	14.743.602,55	-	14.743.602,55
OGV assunta tra 01.07.2014 e 31.12.2014	0	-	-	-
OGV non assunta	0	-	-	-
Totale	30	14.743.602,55	-	14.743.602,55

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Al 31 dicembre 2018 l'avanzamento finanziario (pagamenti) dell'Accordo è pari a euro 13.633.153,11 mentre quello economico (costo realizzato) è pari a euro 14.080.676,30.

Il 96,66% degli interventi (29 su 30) ha completato i lavori con un rapporto costo realizzato/costo totale pari al 100%.

Nello specifico, l'avanzamento dei 30 progetti per stato procedurale può essere così sintetizzato:

- n. 1 intervento è in fase di esecuzione lavori;
- n. 29 interventi sono funzionali.

	Costo Totale euro	di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	14.455.813,35	14.455.813,35	13.633.153,11	94,31%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto annuale di monitoraggio del RUA, il totale delle risorse FSC trasferite ai soggetti attuatori e ai soggetti aggiudicatari, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2015, Art. 20 comma 3, risultano pari a euro 13.878.012,70. I trasferimenti effettuati dall'ARPS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono pari ad euro 24.606,93.

MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A”

Con deliberazione 2 ottobre 2012, n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione". Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi agli immobili privati in classe di priorità “A”.

In data 9 ottobre 2013 è stato sottoscritto l'APQ "Immobili privati in classe di priorità A" relativo a n. 219 interventi "cantierabili", di cui n. 41 a gestione pubblica e n. 178 a gestione privata, del valore complessivo di euro 90.508.507,79, di cui euro 86.928.173,29 di risorse FSC 2007-2013 ed euro 3.580.334,50 di risorse riferite ad altre fonti.

Avanzamento APQ

Tutti gli interventi alla data del 31.12.2014 hanno raggiunto l'OGV. In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ "MOS2 - Immobili privati in classe di priorità A", con evidenza del numero degli interventi e del valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Altre Risorse Pubbliche	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	217	86.006.614,34	1.101.879,43	2.351.318,96	89.459.812,73
OGV assunta tra 01.07.2014 e 31.12.2014	2	921.558,95	-	127.136,11	1.048.695,06
OGV non assunta	0	-	-	-	-
Totale	219	86.928.173,29	1.101.879,43	2.478.455,07	90.508.507,79

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Al 31 dicembre 2018 risultano in "esecuzione lavori" il 56% degli interventi (123 su 219). Sono conclusi 91 interventi, 66 sono funzionali, 24 nello stato chiusura interventi e 4 con collaudo espletato.

L'avanzamento finanziario (pagamenti) risulta essere pari a euro 64.778.177,26, mentre quello economico (costo realizzato) è di euro 70.284.215,13.

Inoltre, sempre alla data del 31 dicembre 2018, n. 5 interventi risultano con avanzamento (costo realizzato) pari a zero, per un valore finanziario complessivo di risorse FSC 2007-2013 di euro 1.765.228,77.

I precedenti Rapporti Annuali di Monitoraggio segnalavano che, per n. 99 interventi dei n. 219 ricompresi nell'Accordo vi era stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP), relativo alla classificazione dell'intervento. Nello specifico, l'errore era stato commesso nella classificazione della natura del progetto: "Realizzazione di Lavori Pubblici" invece di "Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive" e/o viceversa. La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata investita fin dal primo momento per la risoluzione di tale problematica, ma, alla data del 31 dicembre 2018, la stessa permane.

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, si segnala, inoltre, che l'intervento Cod. SGP MOS2.EP153PU "Lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 71 Sp 1", con soggetto attuatore il Comune di Rotello, dell'importo complessivo di euro 797.396,67 di cui euro 712.865,34 di risorse FSC, risulta, dalla sessione di monitoraggio del 28/02/2018, posto nello stato informatico sospeso.

Per detto intervento, costituito da sei unità immobiliari, di cui quattro di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) e due di proprietà di soggetti privati, l'Agenzia per la Ricostruzione Post-Sisma ha adottato il provvedimento n. 7 del 29/02/2016 con cui ha accolto il subentro dello IACP quale soggetto attuatore del PEU 71 SP1 in sostituzione del Comune, previa formale intesa fra i due Enti. Ciò al fine di accelerare il percorso di ricostruzione nonché il rientro, nelle proprie abitazioni, dei soggetti evacuati.

Risultano, inoltre, nello stato informatico "sospeso" gli interventi Cod. SGP MOS2.EP084PU e MOS2.EP100PR (dalla sessione di monitoraggio del 28/02/2018 a quella del 31.12.2018) e gli interventi Cod. SGP MOS2.EP030PR e MOS2.EP067PU (dalla sessione di monitoraggio del 30/06/2017 a quella del 31.12.2018).

	Costo Totale euro	di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/ Costo totale) %
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	85.786.968,10	82.289.925,51	64.778.177,26	75,51%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, i trasferimenti effettuati dall'ARPS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono pari a euro 6.443.378,88.

MOS3 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A – I ATTO INTEGRATIVO”

L'Accordo MOS3 costituisce Atto integrativo all'Accordo principale “MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A”.

Risultano ricompresi nel I Atto integrativo all'APQ “Immobili privati in classe di priorità A” n. 109 interventi per un importo complessivo pari a euro 38.210.978,32 di cui euro 35.128.170,26 a valere sul fondo FSC, euro 2.263.958,99 a carico del cofinanziamento di privati ed euro 818.849,07 a carico di altre risorse “Stato”.

Avanzamento APQ

Tutti gli interventi, dai dati di monitoraggio, risultano con OGV assunta al 30.06.2014.

In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS3 – Immobili privati in classe di priorità A – I Atto Integrativo”, con evidenza del numero degli interventi e del valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Altre Risorse Pubbliche	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	109	35.128.170,26	818.849,07	2.263.958,99	38.210.978,32
OGV assunta tra il 01.07.2014 e 31.12.2014	0	-	-	-	-
OGV non assunta	0	-	-	-	-
Totale	109	35.128.170,26	818.849,07	2.263.958,99	38.210.978,32

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Al 31 dicembre 2018 risultano in “esecuzione lavori” il 56,88% degli interventi (62 su 109). Inoltre, 11 interventi sono conclusi, 26 sono funzionali e 4 con collaudo espletato.

L'avanzamento finanziario (pagamenti) risulta essere pari a euro 22.014.514,78, mentre quello economico (costo realizzato) è di euro 26.155.902,07.

Inoltre, sempre alla data del 31 dicembre 2018, n. 7 interventi risultano con avanzamento (costo realizzato) pari a zero, per un valore finanziario complessivo di risorse FSC 2007-2013 di euro 1.998.755,89.

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, si evidenzia che, per n. 60 interventi dei n. 109 ricompresi nell'Accordo vi è stato un errore da parte dell'Ente Attuatore nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) relativo alla classificazione dell'intervento.

Nello specifico, l'errore è stato commesso nella classificazione della natura dell'intervento: “Realizzazione di Lavori Pubblici” invece di “Concessione di Contributi ad altri Soggetti – Diversi da Unità produttive” e/o viceversa.

La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata investita fin dal primo momento per la risoluzione di tale problematica, ma, alla data del 31 dicembre 2018, la stessa permane.

	Costo Totale euro	Di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" I Atto integrativo	37.251.140,51	34.274.506,00	22.014.514,78	59,10 %

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, l'ammontare dei trasferimenti riferiti al solo anno 2018, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2015, Art. 20 comma 3, risulta pari ad euro 1.222.242,02.

MOS4 – APQ “EDILIZIA SCOLASTICA”

Con deliberazione 2 ottobre 2012 n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione". Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi all'Edilizia scolastica.

In data 19 giugno 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Edilizia scolastica”, del valore complessivo di euro 27.859.855,43, di cui euro 19.334.970,00 a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011, euro 1.034.885,43 quale cofinanziamento dei Soggetti Attuatori ed euro 7.490.000,00 a valere su altre risorse "Stato", relativo ai soli 22 interventi di edilizia scolastica del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012.

Avanzamento APQ

Tutti gli interventi alla data del 31 dicembre 2014 hanno raggiunto l'OGV (aggiudicazione provvisoria), fatta eccezione per l'intervento Cod. MOS4.ES.022 “Autorizzazione alla modifica dell'intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola elementare e media in ricostruzione con l'assegnazione di un finanziamento integrativo - Scuola elementare e media” – Comune di Ururi - del valore complessivo di euro 3.003.540,00, di cui 853.540,00 a valere sulle risorse FSC assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011, che, a partire dalla sessione di monitoraggio al 28 febbraio 2015, è stato posto in SGP nello stato informatico sospeso.

In dettaglio, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS4 - Edilizia scolastica”, con evidenza del numero degli interventi e del valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Cofinanziamento Soggetti Attuatori	Altre Risorse Pubbliche	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	18	14.647.930,00	448.757,00	640.000,00	15.736.687,00
OGV assunta tra il 01.07.2014 e il 31.12.2014	3	3.833.500,00	586.128,43	4.700.000,00	9.119.628,43
OGV non assunta	1	853.540,00	-	2.150.000,00	3.003.540,00
Totale	22	19.334.970,00	1.034.885,43	7.490.000,00	27.859.855,43

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Al 31 dicembre 2018, il 66,66% degli interventi (14 su 21) ha completato i lavori, con un rapporto costo realizzato/costo totale pari al 94,63%.

Nello specifico, l'avanzamento dei 21 progetti per stato procedurale può essere così sintetizzato:

- n. 1 intervento ha concluso la progettazione esecutiva;
- n. 6 interventi sono in fase di esecuzione lavori;
- n. 14 interventi sono funzionali.

L'avanzamento finanziario (pagamenti) risulta essere pari a euro 14.303.517,34, mentre quello economico (costo realizzato) è di euro 16.456.319,84.

	Costo Totale euro	di cui FSC* euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOS4 - Edilizia scolastica	23.218.370,85	17.497.731,84	14.303.517,34	61,60%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

* il valore FSC riportato in tabella non include euro 1.200.000,00 di risorse FSC del PAR Molise

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, il totale delle risorse FSC trasferite ai soggetti attuatori e ai soggetti aggiudicatari ai sensi della Legge Regionale n. 8/2015, Art. 20 comma 3, risultano pari a euro 12.147.302,63. I trasferimenti effettuati dall'ARPS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono pari a euro 1.466.142,07.

MOS5 – APQ “OPERE PUBBLICHE”

Con deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione". Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi alle Opere Pubbliche.

In data 27 luglio 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Opere Pubbliche”, del valore complessivo di euro 2.954.225,59, di cui euro 2.951.710,59 a valere sulle risorse FSC assegnate con delibera CIPE n. 62/2011 ed euro 2.515,00 quale cofinanziamento dei Soggetti Attuatori, relativo ai soli 16 interventi classificati come opere pubbliche del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012.

Avanzamento APQ

Tutti gli interventi hanno assunto OGV nei termini e, nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS5 - Opere pubbliche”, con evidenza del numero degli interventi e del valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Altre Risorse Pubbliche	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	14	2.011.710,59	2.515,00	2.014.225,59
OGV assunta tra il 01.07.2014 e il 31.12.2014	2	940.000,00	-	940.000,00
OGV non assunta	0	-	-	-
Totale	16	2.951.710,59	2.515,00	2.954.225,59

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Al 31 dicembre 2018, dei 16 interventi, n. 14 sono già conclusi, n. 1 in fase di collaudo e n. 1 è nella fase di “esecuzione lavori”. Il 93,75% % degli interventi ha completato i lavori (15 su 16) e ha un avanzamento economico (costo realizzato/costo totale) pari al 85,64%. L'avanzamento finanziario (pagamenti) risulta essere pari a euro 1.878.191,43, mentre quello economico (costo realizzato) è di euro 2.267.719,37.

Come segnalato nei precedenti Rapporti Annuali di Monitoraggio del RUA, si evidenzia che per n. 2 interventi, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto, riguardante nello specifico la natura dello stesso: “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui”, invece di “Realizzazione di opere pubbliche”. La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata interessata fin dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che a tutt'oggi permane.

	Costo Totale euro	Di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOS5 - Opere pubbliche	2.882.824,66	2.880.342,58	1.878.191,43	65,15%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, il totale delle risorse FSC trasferite ai soggetti attuatori e ai soggetti aggiudicatori, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2015, Art. 20 comma 3, risultano pari a euro 2.136.484,87. I trasferimenti effettuati dall'ARPS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono pari a euro 483.650,31.

MOS6 – APQ “INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE”

Con deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002 - Percorso di ricostruzione", integrato con successiva deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719.

Con deliberazione 1° ottobre 2014, n. 498, successivamente revocata e aggiornata dalla deliberazione n. 614 del 18 novembre 2014, la Giunta regionale ha approvato la ridefinizione del Programma degli interventi non ancora inseriti in APQ.

Nell'ambito del predetto Programma sono ricompresi gli interventi relativi alla riparazione funzionale.

In data 14 ottobre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Interventi di riparazione funzionale”, del valore complessivo di euro 2.867.202,93 euro, di cui euro 2.839.428,56 a valere sulle risorse FSC assegnate dalla delibera CIPE n. 62/2011 ed euro 27.774,37 quale cofinanziamento dei privati, relativo ai soli 137 interventi di riparazione funzionale del Programma degli interventi di cui alle deliberazioni su richiamate.

Avanzamento APQ

Tutti gli interventi, che si configurano come “Erogazione di finanziamento” hanno assunto OGV nei termini con l'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento. Nella tabella che segue si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ con evidenza del numero degli interventi e del valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	136	2.819.428,56	27.774,37	2.847.202,93
OGV assunta tra il 01.07.2014e il 31.12.2014	1	20.000,00	-	20.000,00
OGV non assunta	0	-	-	-
Totale	137	2.839.428,56	27.774,37	2.867.202,93

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Tutti gli interventi risultano ultimati, ma non conclusi. L'avanzamento finanziario (pagamenti) dell'Accordo è pari a euro 2.553.751,97, mentre quello economico (costo realizzato) è pari a euro 2.702.008,20.

Come si evince dai precedenti Rapporti Annuali di Monitoraggio del RUA, si evidenzia che per n. 1 intervento, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto, riguardante, nello specifico la natura dello stesso: “Realizzazione di opere pubbliche”, invece di “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui”. La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata interessata fin dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che a tutt'oggi permane.

Infine, si segnala che nel Rapporto Annuale di Monitoraggio 2016, il RUA ha evidenziato che l'intervento MOS6.EP016RF è stato posto nello stato informatico “non monitorato”, dalla sessione del 31 agosto 2015, a motivo della necessità della verifica della eleggibilità della spesa, di cui non viene data alcuna evidenza nel Rapporto Annuale di Monitoraggio 2018.

	Costo Totale euro	Di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOS6 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE	2.702.008,20	2.674.233,83	2.553.751,97	94,51%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, il totale delle risorse FSC trasferite ai soggetti attuatori e ai soggetti aggiudicatori, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2015, Art. 20 comma 3, risultano pari a euro 2.315.532,08. I trasferimenti effettuati dall'ARPS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 sono pari a 0,00.

MOS7 – APQ “ANTICIPAZIONE AL COMUNE DI S. GIULIANO DI PUGLIA PER RISARCIMENTO DANNI, PATRIMONIALI E NON, RICONOSCIUTI ALLE PARTI CIVILI A SEGUITO DEL CROLLO DELLA SCUOLA JOVINE. SENT. 173/2010 SCC IV SEZ. PENALE”

Nel Rapporto annuale di monitoraggio il RUA ha ripercorso, a partire dall'evento sismico, le fasi che hanno portato alla firma del presente Accordo come segue.

Il sisma del 31 ottobre 2002 ha provocato il crollo di un'intera ala dell'Istituto scolastico "Jovine" del Comune di San Giuliano di Puglia. A causa di detto crollo hanno perso la vita 27 bambini ed una insegnante, mentre altre 39 persone (tra bambini, insegnanti ed altri operatori scolastici) hanno riportato lesioni di varia entità.

Come emerge anche dagli accertamenti peritali espletati nel corso del procedimento penale conseguito ai suddetti tragici eventi, la scuola "Jovine", ubicata tra Corso Vittorio Emanuele III e Via Giovanni XIII, era composta nel suo complesso di due edifici: il primo, che si sviluppava su due livelli, comprendeva due corpi di fabbrica parzialmente collegati tra loro, che accoglievano l'uno la scuola materna e l'altro la scuola elementare e media; il secondo edificio, staccato dall'altro, era invece adibito a palestra.

A crollare fu il corpo dell'edificio che accoglieva la scuola elementare e media, mentre sia l'altro corpo parzialmente collegato del medesimo edificio (che accoglieva la scuola materna), sia il casotto in muratura dell'impianto termico, pure aderente all'ala della scuola crollata e sia l'altra costruzione adibita a palestra, seppur gravemente danneggiati, ressero alle scosse telluriche. Dei 27 bambini deceduti nel crollo, 15 si trovavano nelle due aule sottostanti la sopraelevazione del 2002, mentre gli altri 12 si trovavano nella restante porzione della scuola elementare e media.

Le indagini giudiziarie, portate a compimento dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Larino, sfociate in un processo, stabilirono che il crollo della scuola era stato determinato da responsabilità umane. Con sentenza n. 173 del 28 gennaio 2010 della Suprema Corte di Cassazione - IIV Sez. Penale, veniva confermata la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 50 del 25 febbraio 2009, nella parte in cui gli imputati ed il Comune di San Giuliano di Puglia, quale "Responsabile Civile", tutti in solido tra loro, sono stati condannati al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per la somma di euro 12.500.000,00, a titolo di provvisionale e spese legali.

Con Deliberazione consiliare n. 4 dell'8 giugno 2011, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di San Giuliano di Puglia ha disposto il riconoscimento del debito fuori bilancio di euro 12.463.055,00 a seguito della emanazione della sentenza n. 173 del 28 gennaio 2010 della Suprema Corte di Cassazione - IV Sez. Penale. Con la medesima delibera venivano applicate le misure previste dagli artt. 193 e 194 del TUOEL, approvato con D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e veniva adottata ogni altra iniziativa connessa alla fattispecie, tra cui l'adozione di un piano triennale di rateizzazione del debito che prevedeva, fra l'altro, ai fini del reperimento delle risorse necessarie, la vendita dei beni realizzati dopo il terremoto e finanziati dallo Stato, come meglio risulta nella delibera consiliare n. 4/2011, per cui gli adempimenti successivi venivano subordinati alla concessione dell'autorizzazione del Governo alla vendita di tali beni.

Con nota n. 3984 del 23 giugno 2011, il Dipartimento della protezione Civile ed il Presidente della Giunta Regionale del Molise, inoltravano, al Presidente del Consiglio dei Ministri, formale istanza di autorizzazione ad alienare i beni realizzati durante la fase di ricostruzione post-sisma con i finanziamenti statali, ribadendo, in alternativa, la necessità dell'intervento diretto dello Stato in considerazione dell'enorme spesa da fronteggiare e della impossibilità di reperire le risorse in altro modo.

L'autorizzazione alla vendita dei beni non è stata mai assentita dallo Stato.

Di seguito le fasi preliminari alla firma dell'Accordo.

La Legge Regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, cui sono state demandate le competenze relative al sisma 2002, all'art.4, comma 3, ha stabilito: *"Al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciute alle parti civili con sentenza della Corte di Cassazione, IV Sez. Penale, n. 173 del 28 gennaio 2010, l'Agenzia è autorizzata ad anticipare al Comune di San Giuliano di Puglia le somme occorrenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assicurate con deliberazione CIPE del 3 agosto 2011 relativamente agli interventi post sisma"*.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 608 del 02/10/2012 nell'approvare il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili a carico della complessiva assegnazione di 346,2 milioni di euro riferita alla quota "Sisma 2002 - Percorso ricostruzione" non ha programmato l'importo di 12,5 mln di euro.

Con successiva deliberazione n. 609 del 2 ottobre 2012, la Giunta regionale, ha deliberato di richiedere al Ministro per la Coesione Territoriale e al Ministro dello Sviluppo Economico il formale riconoscimento, a ratifica, della destinazione di 12,500 milioni di euro delle risorse "Sisma 2002 Percorso ricostruzione", assegnate dal CIPE con la delibera n. 62/2011, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riconosciuti alle parti civili con sentenza n. 173/2010.

Su espresso mandato della Giunta regionale di cui alla suddetta deliberazione n. 609/2012, in data 8 ottobre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Largo Chigi a Roma, sull'argomento, si è tenuto, negli Uffici del Ministro per la Coesione Territoriale, un incontro a cui hanno partecipato, i rappresentanti della Regione, il Capo del Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, il Direttore Generale della Direzione Generale per la Politica regionale Unitaria Nazionale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (oggi Agenzia per la Coesione Territoriale) del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione - Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il Direttore dell'Ufficio per gli Investimenti immateriali, l'ambiente, lo sviluppo e la coesione territoriale del DIPE – CIPE.

Con successiva deliberazione n. 719 del 13 novembre 2012, la Giunta regionale ha:

- a) approvato il riconoscimento dell'ammissibilità della destinazione di 12,005 milioni di euro a carico delle risorse del FSC 2007-2013, di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con deliberazione n. 62/2011 per "Sisma 2002 Percorso ricostruzione" al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subordinando lo stesso alle seguenti condizioni: I. la Regione Molise potrà trasferire, a titolo di anticipazione, al Comune di San Giuliano di Puglia l'importo di 12,005 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 di cui all'assegnazione disposta dal CIPE con delibera n. 62/2011, relativo al solo risarcimento dei danni accertati, al netto delle spese legali; II. è fatto obbligo, al Comune di San Giuliano di Puglia, di restituire alla Regione la somma versata secondo modalità e tempi da definire in un Piano da concordare con la Regione. Il Piano di restituzione delle somme anticipate, non appena formalizzato dovrà essere trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico – DPS e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE; III. il Comune di San Giuliano di Puglia è altresì tenuto ad esercitare l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori obbligati al risarcimento dei danni a favore delle suddette parti civili, fermo restando le competenze della Corte dei Conti; IV. la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro chiude la procedura di formale assenso;
- b) disposto che il Piano di restituzione, non appena formalizzato, dovrà essere inviato dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile al Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Molise ai fini dei conseguenti adempimenti. L'Agenzia Regionale di Protezione Civile provvederà, altresì, al costante monitoraggio dello stesso Piano, i cui dati aggiornati dovranno, di volta in volta, essere inviati al predetto Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, al fine di consentire la programmazione delle risorse che verranno restituite dal Comune di San Giuliano di Puglia per interventi aventi le stesse finalità delle risorse "Sisma 2002 - Percorso ricostruzione".
- c) subordinato l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro.

Come confermato anche dal rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA riferito all'anno 2018, con Determinazione n. 653 del 23 novembre 2012, l'ARPC ha autorizzato l'erogazione di un primo acconto pari ad euro 8.000.000,00, in conto anticipazione sui fondi della delibera CIPE 62/2011.

Con nota n. 1899 del 10 maggio 2014, il Comune di San Giuliano di Puglia ha trasmesso alla Regione Molise, in adempimento a quanto previsto dalla DGR n. 719/2012, copia degli atti relativi ad una prima fase dell'esercizio

dell'azione di regresso nei confronti dei debitori principali, posti in essere sia dalla Procura della Corte dei Conti Regionale del Molise che dal Comune di San Giuliano di Puglia stesso, e relativi all'importo di euro 8.000.000,00.

Con nota prot. n. 3262 del 3 settembre 2014, il Sindaco del Comune di San Giuliano di Puglia, in adempimento a quanto disposto dalla predetta DGR n. 719/2012, ha trasmesso copia della deliberazione consiliare n. 13 adottata in data 1° settembre 2014, di approvazione del Piano di restituzione delle somme.

Con deliberazione n. 490 del 01/10/2014 la Giunta regionale ha approvato il Piano di restituzione delle somme per 12,005 milioni di euro, obbligando il Comune di San Giuliano di Puglia a:

- attivare ogni altra azione di regresso a carico dei debitori principali, necessaria per completare il recupero dell'intera somma di euro 12.005.000,00, nonché ad inoltrare i relativi atti alla Procura della Corte dei Conti Regionale;
- restituire le somme di cui al Piano in parola durante il periodo decorrente dall'esercizio finanziario 2015 a tutto l'esercizio 2050 compreso;
- accreditare, per ogni esercizio finanziario di riferimento, alla Tesoreria della Regione Molise la somma indicata nel Piano di restituzione;
- adottare annualmente le dovute iscrizioni nei propri atti contabili, per ogni triennio di riferimento;
- informare la Regione Molise di ogni eventuale condizione migliorativa in termini di disponibilità di risorse che possa accelerare il percorso di restituzione.

In data 30 ottobre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e dalla Regione Molise, l'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» "Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale", del valore complessivo di euro 12.005.000,00.

In data 20 novembre 2015, il Comune di San Giuliano di Puglia, con mandato n. 1079 ha provveduto al pagamento della prima annualità relativa all'Anno 2015 del richiamato Piano di restituzione.

In data 16 giugno 2017, il Comune di San Giuliano di Puglia, ha provveduto al pagamento della seconda annualità relativa all'Anno 2016 del Piano.

Dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA riferito all'anno 2018, non risulta alcun altro pagamento relativo alle annualità successive del Piano.

Avanzamento APQ

L'unico intervento ricompreso nell'Accordo ha assunto l'OGV nei termini.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Cofinanziamento Soggetti Attuatori	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	1	12.005.000,00	-	12.005.000,00
OGV assunta tra 01.07.2014e 31.12.2014	0	-	-	-
OGV non assunta	0	-	-	-
Totale	1	12.005.000,00	-	12.005.000,00

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

	Costo Totale euro	Di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOS7 - Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale	11.990.236,05	11.990.236,05	11.990.236,05	100%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, il totale delle risorse FSC trasferite al Comune di San Giuliano risultano pari a euro 12.000.000,00, di cui euro 11.990.236,05 trasferiti, dal Comune di San Giuliano di Puglia attraverso acconti provvisori, nei confronti degli aventi diritto al risarcimento dei danni patrimoniali riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della scuola "Jovine".

MOS8 – APQ “INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE - I ATTO INTEGRATIVO”

L'Accordo MOS8 costituisce Atto integrativo all'Accordo principale “MOS6 – APQ “Interventi di riparazione funzionale”.

Con la deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002- Percorso di ricostruzione e con successiva deliberazione 1 ottobre 2014, n. 498, successivamente revocata e aggiornata dalla deliberazione n. 614 del 18 novembre 2014, la Giunta regionale ha approvato la ridefinizione del Programma degli interventi non ancora inseriti in APQ.

Nell'ambito del predetto Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili sono ricompresi gli interventi relativi alla riparazione funzionale.

In data 19 novembre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e dalla Regione Molise, il I Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Interventi di riparazione funzionale”, del valore complessivo di euro 4.625.858,55 euro, di cui 4.563.030,46 euro a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011, 40.000,00 euro quale altre risorse "Stato" e 22.828,09 euro quale cofinanziamento dei privati, relativo ai rimanenti 162 interventi di riparazione funzionale del Programma degli interventi di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012, e alla DGR n. 498/2014, successivamente revocata e aggiornata dalla deliberazione n. 614 del 18 novembre 2014.

Avanzamento APQ

Tutti gli interventi, che si configurano come “Erogazione di finanziamento”, hanno assunto OGV nei termini con l'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento.

Nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS8 - Interventi di riparazione funzionale - I Atto Integrativo”, con evidenza del numero degli interventi e del valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Altre Risorse Pubbliche	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	156	4.243.030,46	40.000,00	22.828,09	4.305.858,55
OGV assunta tra il 01.07.2014 e il 31.12.2014	6	320.000,00	-	-	320.000,00
OGV non assunta	0	-	-	-	-
Totale	162	4.563.030,46	40.000,00	22.828,09	4.625.858,55

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Degli interventi inseriti in Accordo, alla data del 31 dicembre 2018, n. 20 sono in esecuzione e n. 10 hanno terminato l'esecuzione dei lavori, mentre n. 111 interventi hanno concluso i lavori e n. 6 risultano in fase di funzionalità.

L'avanzamento finanziario (pagamenti) dell'Accordo risulta essere pari a euro 3.220.829,75, mentre quello economico (costo realizzato) è di euro 3.734.325,99.

Inoltre, sempre alla data del 31 dicembre 2018, n. 29 interventi risultano con avanzamento (costo realizzato) pari a zero, per un valore finanziario complessivo di risorse FSC 2007-2013 di euro 593.646,33.

	Costo Totale Euro	Di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale - I Atto Integrativo	4.335.416,41	4.272.588,32	3.220.829,75	74,29 %

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, l'ammontare dei trasferimenti riferiti al solo anno 2018, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2015, Art. 20 comma 3, risulta essere pari ad euro 183.863,59.

MOS9 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ “A” II ATTO INTEGRATIVO”

L'Accordo MOS9 costituisce Atto integrativo all'Accordo principale “MOS2 – APQ “IMMOBILI PRIVATI IN CLASSE DI PRIORITÀ A”.

Con deliberazione 2 ottobre 2012. n. 608, la Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi, cantierabili e non cantierabili, integrato con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2012, n. 719, riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Sisma 2002- Percorso di ricostruzione e con successiva deliberazione 1 ottobre 2014, n. 498, la Giunta regionale ha approvato la ridefinizione del Programma degli interventi, relativo all'assegnazione “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, non ancora inseriti in APQ.

Successivamente, con deliberazione 18 novembre 2014, n. 614, la Giunta regionale ha ridefinito il Programma degli interventi, relativo all'assegnazione “Sisma 2002 – Percorso ricostruzione”, non ancora inseriti in APQ, fra cui gli interventi relativi agli Immobili Privati in classe di priorità “A”, revocando la deliberazione della Giunta regionale n. 498 del 1° ottobre 2014 e riapprovando il Programma. Infine, con deliberazione 24 novembre 2014, n. 636, la Giunta regionale ha approvato alcune rettifiche al Programma degli interventi relativi agli Immobili Privati in classe di priorità “A”, non ancora inseriti in APQ, oggetto di precedente approvazione con la predetta deliberazione n. 614/2014.

In data 27 novembre 2014 è stato firmato, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e dalla Regione Molise, il II Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro «rafforzato» “Immobili Privati in classe di priorità A”, del valore complessivo di euro 157.137.895,39 a valere sulle risorse FSC assegnate con Delibera CIPE n. 62/2011, relativo ai rimanenti 526 interventi di Immobili Privati in classe di priorità A del Programma di cui alla DGR n. 608/2012, integrata con DGR n. 719/2012, DGR n. 614/2014 e DGR n. 636/2014.

Avanzamento APQ

Nella tabella che segue, si riporta la sintesi dello stato di attuazione dell'APQ “MOS9 - Immobili privati in classe di priorità “A” II Atto Integrativo”, con evidenza del numero degli interventi e del valore finanziario riferiti alla data di assunzione delle OGV.

Assunzione OGV	Numero interventi	Risorse FSC delibera CIPE n. 62/2011	Quota privati	Valore complessivo
OGV assunta al 30.06.2014	0	-	-	-
OGV assunta tra il 01.07.2014 e il 31.12.2014	514	155.111.413,59	-	155.111.413,59
OGV non assunta	12	2.026.481,80	-	2.026.481,80
Totale	526	157.137.895,39	-	157.137.895,39

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Tutti gli interventi alla data del 31 dicembre 2014 hanno raggiunto l'OGV (aggiudicazione provvisoria), fatta eccezione per n. 12 interventi di seguito riportati per un valore complessivo di euro 2.026.481,80 interamente a carico delle risorse FSC assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011. Tali progetti, di seguito riportati, sono stati posti dal RUPA (Responsabile della Programmazione – Responsabile del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), nel Sistema Gestione Progetti, nello stato informatico annullato nella sessione di monitoraggio del 31/08/2018, successivamente alla pubblicazione nella G.U.R.I. della delibera CIPE n. 97 del 22 dicembre 2017, che tra l'altro, ha disposto la revoca delle predette risorse a causa del mancato raggiungimento delle OGV entro il 31 dicembre 2014.

Codice intervento in SGP	Titolo dell'intervento	Soggetto attuatore	Importo FSC Delibera CIPE n.62/2011
MOS9.EP264PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 7 Sp 1	Comune di Lucito	58.052,27
MOS9.EP265PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 46 Sp 1	Comune di Lucito	91.662,20
MOS9.EP273PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 2	Comune di Lucito	131.316,83
MOS9.EP495PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 49 Sp 1	Comune di Lupara	64.525,36
MOS9.EP524PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 65	Comune di Cercemaggiore	38.969,05
MOS9.EP525PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 46	Comune di Cercemaggiore	28.699,52
MOS9.EP526PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 13 Sp 1	Comune di Cercemaggiore	100.400,47
MOS9.EP148PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 20 Sp 1	Comune di Campodipietra	164.273,12
MOS9.EP151PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 17 Sp 3	Comune di Campodipietra	328.438,92
MOS9.EP323PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 87 Sp 1	Comune di Sant'Elia a Pianisi	271.039,99
MOS9.EP337PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 4	Comune di Sant'Elia a Pianisi	128.929,86
MOS9.EP345PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 42 Sp 1	Comune di Sant'Elia a Pianisi	620.174,21
TOTALE			2.026.481,80

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Come già evidenziato al paragrafo 2.1, con deliberazione della Giunta regionale n. 709 del 23 dicembre 2014, sono state proposte le modifiche relative alla mera modalità di gestione, da pubblica a privata, per n. 4 interventi (cod. SGP MOS9.EP257PU, MOS9.EP324PU, MOS9.EP353PU e MOS9.EP462PU) inseriti nel II Atto Integrativo all'APQ "Immobili Privati in classe di priorità A" Cod. MOS9, nonché la sostituzione di n. 5 interventi (cod. SGP MOS9.EP148PU, MOS9.EP151PU, MOS9.EP323PU, MOS9.EP337PU e MOS9.EP345PU), che si prevedeva non potessero raggiungere l'obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) nei termini previsti dalla Delibera CIPE n. 21 del 30 giugno 2014 (31 dicembre 2014), con n. 8 interventi PEU, già oggetto di OGV e posti a carico di altre risorse.

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, con nota n. 291 del 14 gennaio 2015 non ha dato il proprio assenso alla proposta regionale di sostituzione degli interventi cod. MOS9.EP148PU, MOS9.EP151PU, MOS9.EP323PU, MOS9.EP337PU e MOS9.EP345PU, mentre, con nota n. 588 del 23 gennaio 2015 ha assentito alla variazione da gestione pubblica a privata degli interventi cod. MOS9.EP257PU, MOS9.EP324PU, MOS9.EP353PU e MOS9.EP462PU.

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, si evidenzia che per n. 103 interventi dei 526 inseriti in Accordo, nella generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) da parte del Soggetto Attuatore, vi è stato un errore nella Classificazione del progetto, riguardante, nello specifico, la natura, classificando tali progetti come "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui", anziché "Realizzazione di opere pubbliche" o viceversa.

La Struttura di Supporto CUP della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata interessata fin dal primo momento per la risoluzione di tale problema, che a tutt'oggi non risulta ancora superato.

Inoltre, come riportato nel predetto Rapporto Annuale, il RUA, alla sessione di monitoraggio al 31 ottobre 2015, ha posto, in SGP, nello stato informatico "sospeso" n. 105 interventi, di cui 12 per il mancato raggiungimento dell'OGV, per una verifica degli atti amministrativi.

Il RUA ha posto gli interventi, originariamente nello stato informatico "verifica centrale", in stato "sospeso" dopo che il RUPA li ha "restituiti" in "correzione". Inoltre, nella sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2015, il RUA ha posto

nello stato informatico “non monitorato” n. 146 interventi su indicazione del RUPA, avendo il Direttore dell’ARPC rappresentato formalmente, al competente Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che gli stessi presentavano quote di cofinanziamento (c.d. “accogli”) da parte dei soggetti privati, non evidenziati dallo stesso RUA nella documentazione trasmessa al RUPA ai fini della sottoscrizione dell’Atto integrativo, né nei relativi provvedimenti di concessione del finanziamento adottati dal Direttore dell’ARPC. Gli stessi interventi sono stati posti, in SGP, nello stato informatico “sospeso” nella sessione di monitoraggio al 31 dicembre 2016 al fine di predisporre la documentazione utile per intraprendere le azioni necessarie a sanare la criticità. Nel corso del 2017 gli interventi posti nello stato “sospeso” per le stesse motivazioni sono saliti a n. 199.

Con nota prot. n. 150354/2018 del 26 novembre 2018, il Direttore dell’ARPS, ha comunicato il superamento delle cause che avevano determinato la sospensione degli interventi indicati nell'allegato alla stessa nota (interventi inseriti negli Allegati B e C ai RAE 2016 e 2017) e ne ha chiesto la riattivazione informatica. Il RUPA, in data 27 novembre 2018, ha sbloccato gli interventi ai fini dell’aggiornamento dei relativi dati in SGP nell’ambito della sessione al 31 dicembre 2018.

Al 31 dicembre 2018 risultano in “esecuzione lavori” il 79,18% degli interventi (407 su 514), l'avanzamento finanziario (pagamenti) risulta essere pari a euro 52.572.742,19, mentre quello economico (costo realizzato) è di euro 81.705.129,36.

Inoltre, sempre alla data del 31 dicembre 2018, n. 98 interventi risultano con avanzamento (costo realizzato) pari a zero, per un valore finanziario complessivo di risorse FSC 2007-2013 di euro 23.951.333,81 .

	Costo Totale euro	Di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" II Atto Integrativo	152.886.843,90	152.886.843,90	52.572.742,19	34,39%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, il totale delle risorse FSC trasferite ai soggetti attuatori e ai soggetti aggiudicatori, ai sensi della Legge Regionale n. 8/2015, Art. 20 comma 3, risulta pari a euro 54.393.183,71, di cui euro 21.925.259,54 trasferiti dall’ARPS dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

MOSZ - AZIONI DI SISTEMA

Il punto 4.2 della delibera CIPE n. 166/2007 dispone che ogni Programma attuativo FSC, analogamente ai Programmi operativi cofinanziati da risorse dei fondi strutturali e nei casi pertinenti con modalità complementari agli stessi, può prevedere, ove ne sussistano necessità e condizioni, il finanziamento di azioni volte a migliorare la capacità del Programma stesso di conseguire i propri obiettivi. Dette Azioni vanno programmate in relazione alle dimensioni della dotazione complessiva del Programma. Il punto 2.13 della delibera CIPE n. 1/2009 definisce pari al 3% il limite entro cui programmare le risorse destinate alle predette per i Programmi con importi fino a 500 milioni di euro.

Per gli Accordi “MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi”, “MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A" e “MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" I Atto integrativo”, i primi tre ad essere sottoscritti, la percentuale relativa alle Azioni di sistema è stata pari al 2%, mentre, successivamente, a seguito della nota del 16 gennaio 2014 del Ministro per la Coesione Territoriale, detta percentuale è stata elevata al 3%, unicamente con riferimento alle risorse FSC della quota “Sisma 2002- percorso ricostruzione”.

Il valore delle Azioni di sistema riconosciuto nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro “rafforzati” sottoscritti è di euro 10.068.959,44, pari al 3% del valore delle risorse FSC programmate, relative alla quota “Sisma 2002 - percorso di ricostruzione” e, ai sensi di quanto previsto al punto 4.2 dalla delibera del CIPE n. 166/2007, deve assicurare le stesse, al Programma, fino al 31 dicembre 2018 e, a valle della delibera del CIPE n. 57/2016, fino alla chiusura degli interventi. Di seguito la sintesi contenente anche la quota delle Azioni di sistema da decurtare a seguito del mancato raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il 31 dicembre 2014.

APQ	Risorse FSC Delibera CIPE n. 62/2011 (A)	Azione di sistema [3% di (A)] MOSZ	Importo FSC Delibera CIPE n. 62/2011 OGV non assunte (B)	Quota Azione di sistema da decurtare [3% di (B)]
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	14.743.602,55	442.308,08	-	-
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	86.928.173,29	2.607.845,20	-	-
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	35.128.170,26	1.053.845,11	-	-
MOS4 - Edilizia scolastica	19.334.970,00	580.049,10	853.540,00	25.606,20
MOS5 - Opere Pubbliche	2.951.710,59	88.551,32	-	-
MOS6 - Interventi di riparazione funzionale	2.839.428,56	85.182,86	-	-
MOS7 - Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti civili	12.005.000,00	360.150,00	-	-
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale 1° Atto integrativo	4.563.030,46	136.890,91	-	-
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	157.137.895,39	4.714.136,86	2.026.481,80	60.794,45
Totale		10.068.959,44	2.880.021,80	86.400,65

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

APQ	Valore Azione di sistema euro (A)	Quota Azione di sistema da decurtare Post Delibera CIPE n. 62/2011 euro (B)	Valore attuale MOSZ [(A)-(B)]
MOSZ - Azioni di sistema	10.068.959,44	86.400,65	9.982.558,79

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

	Costo Totale euro	Di cui FSC euro	Pagamenti euro	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOSZ - Azioni di sistema	9.982.558,79	9.982.558,79	9.972.006,72	99.89%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Al 31 dicembre 2018 risultano pagamenti pari a euro 9.972.006,72, con un incremento nel corso del 2018 pari a euro 269.624,85 rispetto al precedente anno.

MOA1 – APQ “EVENTI ATMOSFERICI 2008 OPCM 3734/09”

A seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 5 della legge 20.02.1992, n. 225.

Per il superamento dell'emergenza, derivante dagli eventi calamitosi di cui sopra, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, con OPCM n. 3734 del 16.01.2009, vennero nominati Commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Con la stessa OPCM, i Commissari delegati furono autorizzati ad avvalersi di soggetti attuatori per accertare i danni, adottare tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di rischio, assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi e porre in essere ogni utile attività per l'avvio, in termini di somma urgenza, della messa in sicurezza delle aree colpite e degli interventi urgenti.

Il Presidente della Regione Molise, in qualità di Commissario delegato, con Decreto n. 1 del 17 febbraio 2009, ha nominato Soggetto Attuatore il dirigente responsabile del Servizio regionale per la Protezione Civile ed ha costituito un Gruppo Operativo Regionale di supporto.

Con deliberazione 31 maggio 2010, n. 399, fra l'altro, è stato affidato al Servizio per la Protezione Civile ogni attività connessa alla gestione post emergenza e post Commissariale messa in campo a seguito di eventi calamitosi dichiarati dalla Regione Molise ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 1.

A seguito della legge regionale 30 aprile 2012, n. 12, istitutiva dell'Agenzia regionale di Protezione civile, la stessa opera, per le attività di cui alle assegnazioni disposte dal CIPE con la delibera n. 62/2011 (Danni alluvionali - DPCM 2210/10 e OPCM 3268/03, Eventi atmosferici 2008 - OPCM 3734/09 e Sisma 2002 - Percorso ricostruzione), quale struttura preposta alla gestione e attuazione del Programma.

La delibera CIPE n. 62/2011 ha assegnato al Molise, tra l'altro, le risorse relative a "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)" pari a 17,7 milioni di euro, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007/2013.

La Giunta regionale del Molise, con deliberazione 2 ottobre 2012 n. 608, ha approvato il Programma degli interventi cantierabili e non cantierabili riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)"

In data 23 maggio 2014 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro "Eventi Atmosferici 2008 (OPCM 3734/2009)" tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e la Regione Molise per un valore complessivo di euro 17.812.452,45 di cui: euro 17.732.177,99 a carico delle risorse FSC assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, euro 60.269,46 a carico di altre risorse pubbliche regionali, euro 5,00 di altre risorse pubbliche comunali ed euro 20.000,00 quale quota di cofinanziamento di privati.

L'Accordo prevede la realizzazione di n. 104 interventi di cui n. 16 già realizzati per un valore complessivo di euro 311.441,78, n. 83 cantierabili per un valore complessivo di euro 16.390.000,00 e n. 5 non cantierabili per un valore complessivo di euro 1.100.000,00.

Avanzamento APQ

Procedurale

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, dal punto di vista procedurale, alla data del 31 dicembre 2018, i 104 interventi inseriti nell'Accordo, tutti afferenti al macroprocesso "Realizzazione di Opere pubbliche" sono conclusi. Il Servizio di Protezione Civile attende, dagli enti attuatori, l'aggiornamento dei mandati di pagamento al fine di porre nello stato informatico "chiuso" gli interventi nel Sistema Gestione Progetti.

Finanziario

Dal punto di vista finanziario, al 31 dicembre 2018, si registra il seguente livello di attuazione: gli impegni raggiunti sono pari a euro 16.813.417,29 (94,39% del totale finanziamenti), mentre i pagamenti risultano pari a euro 13.664.183,03 (76,71% dei finanziamenti e 81,27% degli impegni). In termini di variazione percentuale rispetto al 31 dicembre 2017, i pagamenti sono aumentati del 11,04%, mentre gli impegni del 1,03%.

Economico

Al 31 dicembre 2018, il valore del costo realizzato dell'Accordo è pari a euro 16.720.287,05 (+0,83% rispetto al 2017) corrispondente al 100% del costo totale. Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, la

realizzazione degli interventi ha seguito un andamento normale, non essendo state rilevate criticità di tipo amministrativo, finanziario o tecnico.

	Costo Totale euro	Di cui FSC euro	Costo realizzato	Pagamenti euro	Economie	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOA1 - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	16.720.287,05	16.640.425,38	16.720.287,05	13.664.183,03	1.092.165,40	81,72%

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'Agenzia regionale di Protezione Civile prima e, successivamente, dal Servizio di Protezione Civile del IV Dipartimento in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2018, come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, risultano pari a euro 16.636.450,07 (comprensivi di euro 311.441,78 pagati dalla Regione prima della stipula dell'APQ), a fronte di un importo FSC di costo realizzato pari a euro 16.640.452,38.

MOA2 – APQ “DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003”

A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, previa Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, anche nel territorio della Regione Molise veniva proclamato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 20.02.1992, n. 225.

Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, il Presidente della Regione Molise veniva nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi di prima emergenza diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi, avvalendosi delle strutture tecnico-amministrative della Regione, degli Enti locali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

In conformità con quanto stabilito nell'ordinanza n. 3268/03, il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato, con Decreto n. 3 in data 13 maggio 2003, provvedeva ad individuare i territori dei Comuni della Regione colpiti dagli eventi meteorologici in oggetto e, con successivo Decreto n. 4 del 14 maggio 2003, all'accertamento della stima dei danni nei Comuni di cui al precedente Decreto n. 3/2003.

Con successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3414 del 18 marzo 2005 veniva disposto che il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato – provvedesse all'attuazione ed al completamento, entro il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico determinato dagli eventi del gennaio 2003.

Durante la fase di emergenza, a salvaguardia della pubblica incolumità, sono stati autorizzati interventi urgenti ed indifferibili a strutture viarie principali, quali la ricostruzione del ponte sul fiume Trigno, nel Comune di Montenero di Bisaccia, realizzata dalla Provincia di Campobasso, con cofinanziamento da parte della Provincia di Chieti, la sistemazione della strada provinciale Santa Giusta, nel Comune di Palata, anch'essa realizzata dalla Provincia di Campobasso, ed interventi urgenti ad infrastrutture pubbliche nei Comuni di Agnone, Mafalda, Riccia, Trivento e San Martino in Pensilis per un costo totale (comprensivo di cofinanziamenti) di euro 9.664.678,47.

Inoltre, il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 2, dell'OPCM n. 3414/05, veniva autorizzato ad erogare contributi a favore dei proprietari di immobili danneggiati a seguito degli eventi meteorologici dei 23, 24 e 25 gennaio 2003 e non ripristinabili in sito (Piano Casa).

Con delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, sono state assegnate al Molise, tra l'altro, le risorse relative a "Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)" pari a 16,6 milioni di euro, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007/2013.

La Giunta Regionale del Molise, con deliberazione n. 608 del 02/10/2012, successivamente modificata e rettificata con deliberazioni n. 65 del 25/01/2013, n. 681 del 20/12/2013 e n. 131 del 28/03/2014, ha approvato il Programma degli interventi riferito alle singole assegnazioni disposte dal CIPE, tra cui quello relativo a "Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)".

In data 01/10/2014 è stato stipulato l'Accordo di Programma Quadro "Danni alluvionali (OPCM 3268/2003)" tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, oggi Agenzia per la Coesione Territoriale, e la Regione Molise che prevede la realizzazione di n. 56 interventi, per un valore complessivo di euro 18.233.067,10 di cui: euro 15.386.133,62 a carico delle risorse FSC assegnate al Molise dalla delibera CIPE n. 62/2011, euro 1.086.933,48 a carico di risorse regionali ed euro 1.750.000,00 di altre risorse pubbliche.

L'Accordo prevede la realizzazione di n. 56 interventi di cui n. 8 già realizzati per un valore complessivo di euro 9.664.678,47, n. 23 cantierabili per un valore complessivo di euro 4.505.614,23, n. 23 interventi in corso di realizzazione (Piano Casa) per un valore complessivo di euro 3.702.774,40 e n. 2 non cantierabili per un valore complessivo di euro 350.000,00.

Avanzamento APQ

Procedurale

- n. 33 interventi, tutti afferenti al macroprocesso Realizzazione Opere pubbliche, sono conclusi per un valore (finanziamenti - economie) pari a 13.950.891,76, che rappresenta il 76,56% del valore totale dell'Accordo;
- n. 23 interventi sono ancora in corso di realizzazione per un valore (finanziamenti - economie) pari a euro 3.702.774,40, che rappresenta il 20,32% del valore totale dell'Accordo; tutti riguardano "erogazioni di finanziamenti e aiuti a imprese".

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, per gli interventi relativi alla tipologia "Opere pubbliche" il Servizio di Protezione Civile attende l'aggiornamento dei mandati di pagamento da parte dei soggetti attuatori al fine di poter porre nello stato di "chiuso" gli interventi nel Sistema Gestione Progetti, mentre gli interventi afferenti alla tipologia "Erogazione di finanziamenti", che rappresentano solo il 20% del finanziamento complessivo dell'Accordo, sono tutti ancora in corso di realizzazione.

Finanziario

Dal punto di vista finanziario, al 31 dicembre 2018, si registra il seguente livello di attuazione: gli impegni raggiunti sono pari a euro 17.676.715,19 (97,00% del totale dei finanziamenti), mentre i pagamenti risultano pari a euro 15.332.630,42 (84,14% dei finanziamenti e 86,74% degli impegni). In termini di variazione percentuale rispetto al 31 dicembre 2017, i pagamenti risultano aumentati del 1,38%.

Economico

Al 31.12.2018, il valore del costo realizzato dell'Accordo è pari a euro 17.185.773,46 (+2,76% rispetto al 2017), corrispondente al 97,35% del costo totale.

Come evidenziato nel Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, la realizzazione degli interventi segue un andamento normale, non essendo state rilevate criticità di tipo amministrativo, finanziario o tecnico.

	Costo Totale euro	Di cui FSC euro	Costo realizzato	Pagamenti euro	Economie	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOA2 Danni Alluvionali OPCM 3268/2003	17.653.666,16	14.816.732,68	17.185.773,46	15.332.630,42	569.400,94	86,85 %

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Trasferimenti

Il totale dei trasferimenti di risorse FSC effettuati dall'Agenzia regionale di Protezione Civile prima e, successivamente, dal Servizio di Protezione Civile del IV Dipartimento in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2018, come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, sono pari a euro 14.375.271,92 (comprensivi di euro

4.405.016,03 pagati dalla Regione prima della stipula dell'APQ), a fronte di un importo FSC realizzato pari ad euro 14.348.839,98.

MOA3 – APQ “DANNI ALLUVIONALI D.P.C.M. 2210/2010”

L'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Danni alluvionali D.P.C.M. 2210/2010", dell'importo di euro 6.000.060,53, sottoscritto in data 20 novembre 2014, prevede la realizzazione di un programma di opere volte al ripristino della funzionalità degli edifici, delle strutture, infrastrutture ed impianti pubblici, nonché alla riparazione di beni immobili e mobili registrati di proprietà privata, danneggiati a causa dell'eccezionale evento atmosferico (grandinata) verificatosi il 24 luglio 2010, che ha interessato alcuni territori della regione Molise, in particolare, le aree dei Comuni di Tavenna, Palata, Mafalda, Rotello, Larino e Santa Croce di Magliano.

Gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza delle suddette aree.

Il valore finanziario, alla stipula, dei 46 interventi inseriti nell'Accordo, tutti "cantierabili", ammonta a euro 6.000.060,53, di cui euro 6.000.000,00 a carico delle risorse del FSC - quota "Danni alluvionali D.P.C.M. 2210/2010" assegnate al Molise dalla Delibera CIPE n. 62/2011, ricomprese nell'ambito della relativa Linea di azione della Pianificazione Regionale Attuativa PRA Molise 2007-2013, ed euro 60,53 a carico di risorse comunali.

Avanzamento APQ

Procedurale

I 46 interventi inseriti nell'Accordo sono ripartiti per macroprocesso secondo quanto segue:

- Realizzazione Opere Pubbliche: 32 interventi per un finanziamento totale pari a euro 2.021.791,86;
- Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui: 13 interventi per un finanziamento totale pari a euro 3.970.022,39;
- Acquisizione di beni e servizi: 1 intervento per un finanziamento di euro 8.246,28.

Come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, dal punto di vista procedurale, si rileva che:

- I 46 interventi sono conclusi per un valore (finanziamenti - economie) pari a 5.860.546,96, che rappresenta il 97,67% del valore totale dell'Accordo; di questi, n. 32 interventi riguardano la realizzazione di opere pubbliche per un importo di euro 1.937.629,77; n. 13 afferiscono alla tipologia "Erogazione di finanziamenti" per un importo di euro 3.914.670,91 e n. 1 intervento è relativo all'acquisizione di beni e servizi per un importo di euro 8.246,28.

Per la totalità degli interventi si attende dagli Enti Attuatori l'aggiornamento dei mandati di pagamento al fine di poter porre nello stato di "chiuso" gli interventi nel Sistema Gestione Progetti.

Finanziario

Dal punto di vista finanziario, al 31 dicembre 2018, si registra il seguente livello di attuazione: gli impegni raggiunti sono pari a euro 5.860.546,96 (97,67% del totale finanziamenti), mentre i pagamenti risultano pari a euro 5.468.394,91 (91,14% dei finanziamenti e 93,31% degli impegni). In termini di variazione percentuale rispetto al 31 dicembre 2017, i pagamenti sono aumentati del 5,05%, mentre gli impegni del 0,91%.

Economico

Al 31.12.2018, il valore del costo realizzato dell'Accordo è pari a euro 5.860.546,96 (+0,01% rispetto al 2017), corrispondente al 100% del costo totale.

Come evidenziato nel Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, la realizzazione degli interventi ha seguito un andamento normale, non essendo state rilevate criticità di tipo amministrativo, finanziario o tecnico.

	Costo Totale euro	Di cui FSC Euro	Costo realizzato	Pagamenti euro	Economie	Efficienza realizzativa (Pagamenti/Costo totale) %
MOA3 - Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10	5.860.546,96	5.860.486,43	5.860.546,96	5.468.394,91	139.513,57	93,31%

Il totale dei trasferimenti delle risorse FSC effettuati dall'Agenzia regionale di Protezione Civile prima e, successivamente, dal Servizio regionale di Protezione Civile del IV Dipartimento in favore dei soggetti attuatori, al 31 dicembre 2018, come si evince dal Rapporto Annuale di Monitoraggio del RUA, sono pari a euro 5.861.960,48 (comprensivi di euro 4.894.769,99 pagati dalla Regione prima della stipula dell'APQ), a fronte di un importo FSC realizzato di euro 5.860.486,43.

7. RISORSE DANNI ALLUVIONALI (DPCM 2210/10) E (OPCM 3268/03) ED EVENTI ATMOSFERICI 2008 (OPCM 3734/09) E SISMA 2002 PERCORSO RICOSTRUZIONE, – STATO DI ATTUAZIONE

Lo stato di attuazione riferito alle risorse "Danni alluvionali ed eventi atmosferici" e "Sisma 2002" è riportato nelle tabelle che seguono.

La relativa rappresentazione grafica evidenzia le percentuali, rispettivamente, di impegni e pagamenti sul totale finanziamenti posto pari a 100.

Danni alluvionali ed eventi atmosferici				
Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Finanziamenti *	Impegni **	Pagamenti ***
MOA1 - Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	104	17.812.452,45	16.813.417,29	13.664.183,03
MOA2 - DANNI ALLUVIONALI OPCM 3268/2003	56	18.223.067,10	17.676.715,19	15.332.630,42
MOA3 - Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10 - PRA MOLISE 2007-2013	46	6.000.060,53	5.860.546,96	5.468.394,91
Totale	206	42.035.580,08	40.350.679,44	34.465.208,36

* Finanziamenti: è dato dalla sommatoria delle diverse fonti finanziarie che concorrono alla realizzazione dei progetti

**Impegni: sono gli impegni contrattualizzati ossia l'insieme di atti con cui il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto si impegna, sotto il profilo contabile, alla corresponsione delle relative risorse;

***Pagamenti: è la sommatoria degli atti contabili che dispongono l'erogazione delle somme in favore dei soggetti che hanno svolto le attività previste per la realizzazione dei progetti.

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

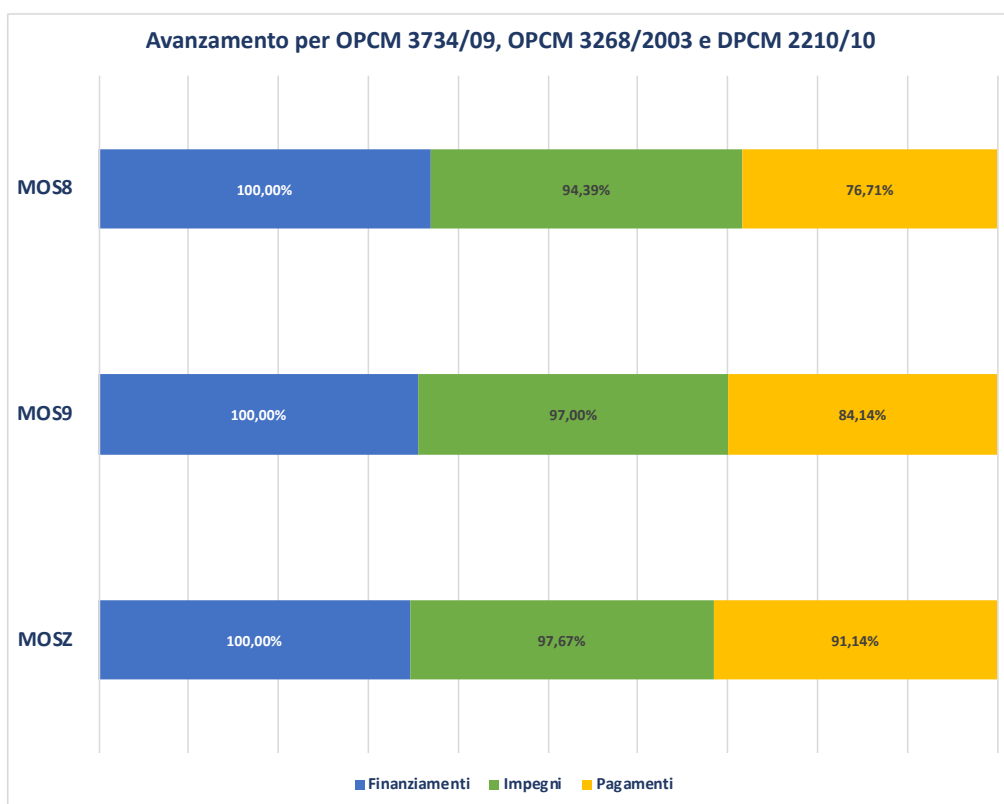


Grafico 12 – Avanzamento OOPCM e DPCM

Sisma 2002				
Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	30	14.743.602,55	14.455.963,35	13.633.153,11
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	219	90.508.507,78	83.615.673,62	64.778.177,26
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	109	38.210.978,32	36.298.680,23	22.014.514,78
MOS4 - Edilizia scolastica	21	24.856.315,43	20.638.726,32	14.303.517,34
MOS5 - Opere pubbliche	16	2.954.225,59	2.663.389,60	1.878.191,43
MOS6 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE FUNZIONALE	137	2.867.202,93	2.702.008,20	2.553.751,97
MOS7 - Anticipazione al Comune di S. Giuliano di Puglia per risarcimento danni, patrimoniali e non, riconosciuti alle parti civili a seguito del crollo della Scuola Jovine. Sent. 173/2010 SCC IV Sez. penale	1	12.005.000,00	12.005.000,00	11.990.236,05
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale - I° Atto Integrativo	162	4.625.858,55	4.449.200,35	3.220.829,75
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità - II Atto Integrativo	514	155.111.413,59	152.880.168,57	52.572.742,19
MOSZ - Azioni di sistema	1	9.982.558,79	9.972.006,72	9.972.006,72
Totale	1.210	355.865.663,53	339.680.816,96	196.917.120,60

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

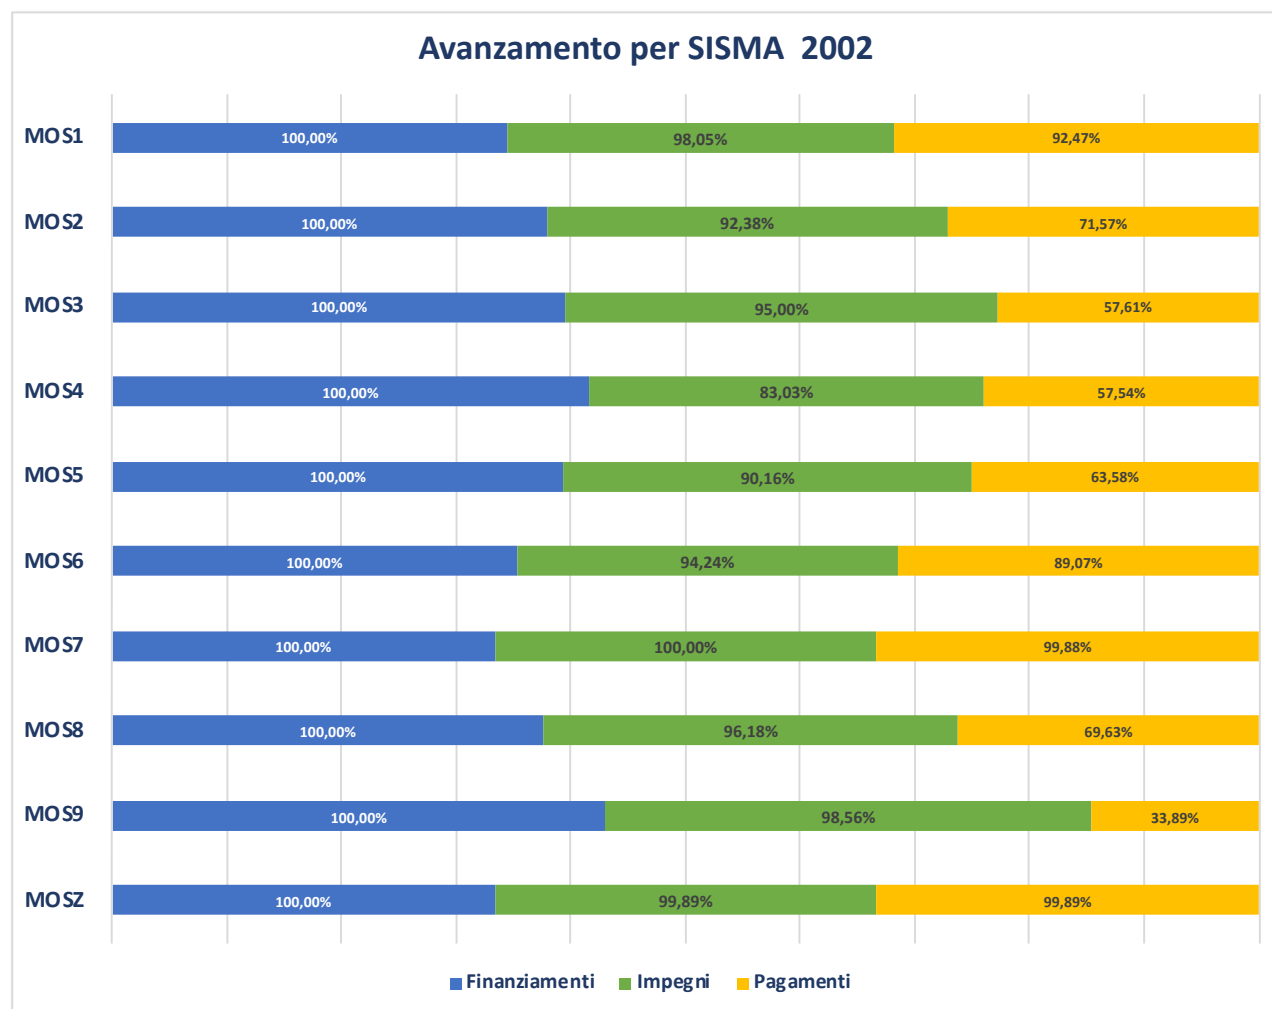


Grafico 13 – Avanzamento SISMA 2002

Per le risorse riferite al “Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione” si rappresentano di seguito i *focus* relativi agli aggregati (Accordo principale e Atti Integrativi) per “Immobili Privati” e “Riparazioni Funzionali”. Le rappresentazioni successive, come quelle presentate in precedenza, evidenziano le percentuali di impegni e pagamenti sul totale dei finanziamenti posto pari a 100.

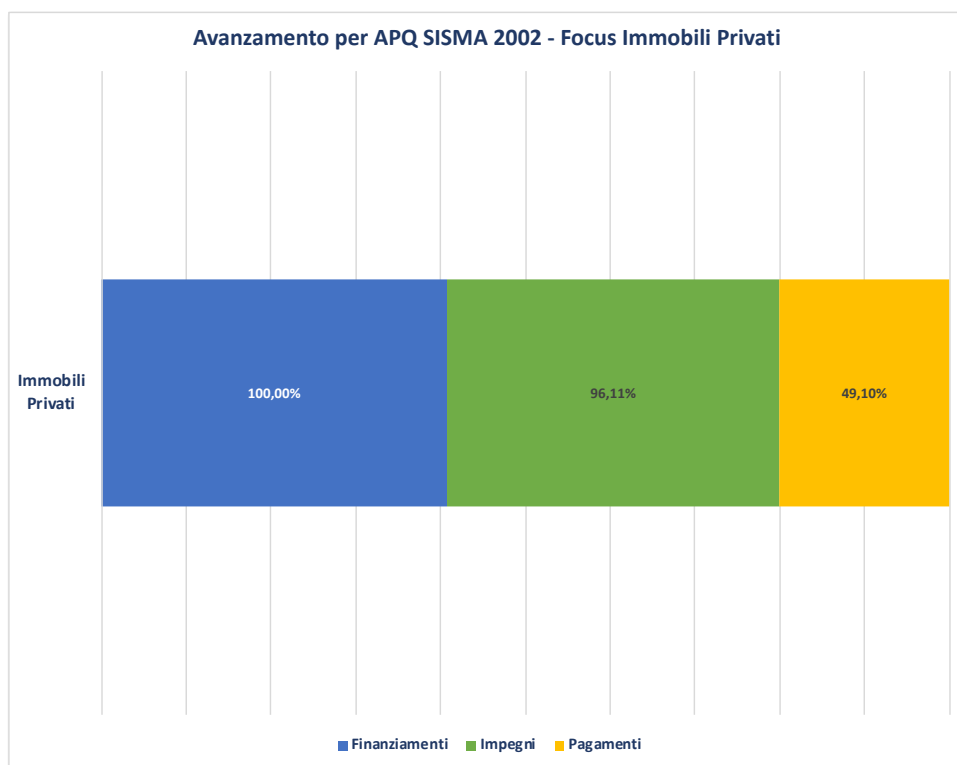


Grafico 14 – Avanzamento SISMA 2002 – focus APQ Immobili Privati

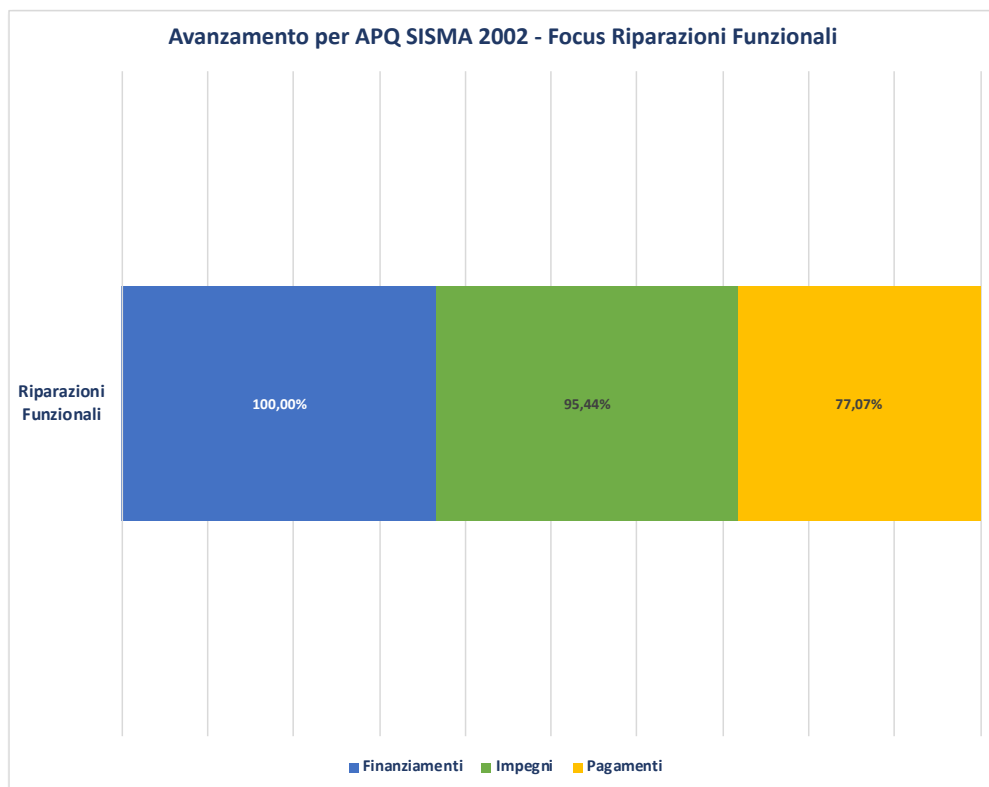


Grafico 15 – Avanzamento SISMA 2002 – Focus APQ Riparazioni Funzionali

Le successive rappresentazioni mostrano l'avanzamento del costo realizzato FSC rispetto alla quota di Finanziamento FSC sia in forma tabellare che grafica.

APQ	Finanziamento FSC	Costo Realizzato FSC
MOS2	86.928.173,29	67.598.852,26
MOS3	35.128.170,26	23.973.422,68
MOS9	155.111.413,59	81.705.129,36
Totale Immobili Privati	277.167.757,14	173.277.404,30

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

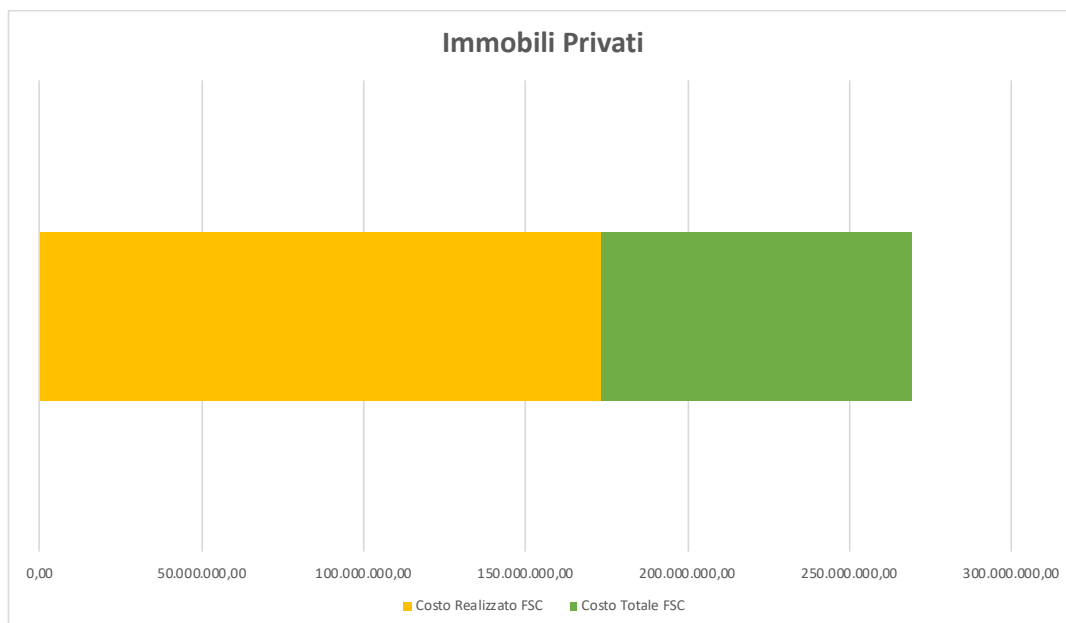


Grafico 16 – Avanzamento costo realizzato FSC - focus APQ Immobili Privati

APQ	Finanziamento FSC	Costo Realizzato FSC
MOS6	2.839.428,56	2.674.233,83
MOS8	4.563.030,46	3.671.497,90
Totale Riparazioni Funzionali	7.402.459,02	6.345.731,73

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

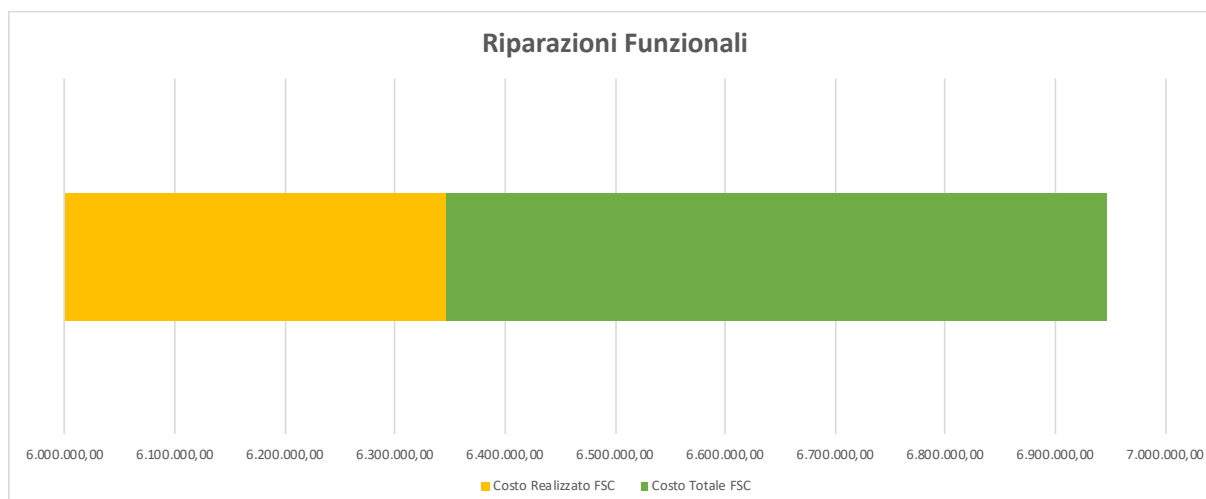


Grafico 17 – Avanzamento costo realizzato FSC - focus APQ Riparazioni funzionali

Inoltre, si rappresenta su mappa la localizzazione degli interventi e il relativo valore finanziario con riferimento al singolo Comune.


Comune	Numero di Progetti finanziati	Finanziamento Totale
Acquaviva Collecroce (CB)	2	595.599,00
Baranello (CB)	1	2.360.197,00
Bojano (CB)	7	231.014,32
Bonefro (CB)	66	25.040.916,37
Busso (CB)	3	60.000,00
Campobasso (CB)	5	12.686.028,40
Campodipietra (CB)	11	2.042.605,08
Campolieto (CB)	13	4.654.035,64
Campomarino (CB)	20	1.771.410,46
Casacalenda (CB)	61	14.533.800,21
Casalciprano (CB)	3	974.579,37
Castellino Del Biferno (CB)	53	13.960.363,98
Castelmauro (CB)	8	3.170.824,03
Castropignano (CB)	3	992.989,21
Cercemaggiore (CB)	16	1.961.261,28
Cercepiccola (CB)	1	19.762,65
Civitacampomarano (CB)	12	3.123.664,39
Colletorto (CB)	85	33.829.221,14
Ferrazzano (CB)	4	235.274,96
Fossalto (CB)	3	933.339,84
Gambatesa (CB)	8	711.940,07
Gildone (CB)	8	1.612.308,69
Guardiafiera (CB)	24	6.395.011,46
Guglionesi (CB)	9	5.597.252,67
Jelsi (CB)	8	2.012.864,90
Larino (CB)	120	38.084.431,65
Limosano (CB)	15	4.216.966,62
Lucito (CB)	19	2.626.449,56
Lupara (CB)	6	1.454.718,74
Macchia Valfortore (CB)	17	3.939.376,95
Matrice (CB)	1	152.592,72
Mirabello Sannitico (CB)	5	539.311,86
Monacilioni (CB)	29	5.061.937,07
Montagano (CB)	21	5.586.019,36
Montecilfone (CB)	7	839.518,71
Montefalcone Nel Sannio (CB)	2	613.127,39
Montelongo (CB)	18	1.421.222,09
Montenero Di Bisaccia (CB)	6	733.375,72
Montorio Nei Frentani (CB)	16	6.103.666,67
Morrone Del Sannio (CB)	5	2.085.503,44
Oratino (CB)	1	82.158,45
Palata (CB)	5	1.947.724,46
Petacciato (CB)	33	1.273.870,42
Petrella Tifernina (CB)	12	3.506.056,61
Pietracatella (CB)	7	2.015.805,57
Pietracupa (CB)	4	2.508.269,48
Portocannone (CB)	23	1.764.264,92
Provvidenti (CB)	5	1.352.092,55
Riccia (CB)	4	436.296,41
Ripabottoni (CB)	19	15.262.368,75
Ripalimosani (CB)	1	358.645,42
Roccamare (CB)	1	325.270,48
Rotello (CB)	44	18.562.773,22
Salcito (CB)	6	1.470.244,87
San Felice Del Molise (CB)	2	568.187,40
San Giacomo Degli Schiavoni (CB)	2	364.654,78
San Giovanni In Galdo (CB)	1	163.218,82
San Giuliano Di Puglia (CB)	1	12.005.000,00
San Martino In Pensilis (CB)	24	5.427.577,37
San Polo Matese (CB)	1	153.713,47
Sant'Angelo Limosano (CB)	6	335.718,23
Sant'Elia A Pianisi (CB)	39	17.440.467,92

Comune	Numero di Progetti finanziati	Finanziamento Totale
Santa Croce Di Magliano (CB)	109	24.582.548,13
Sepino (CB)	8	1.704.437,85
Tavenna (CB)	1	387.061,67
Termoli (CB)	2	138.057,01
Torella Del Sannio (CB)	5	2.745.651,46
Toro (CB)	16	4.555.279,18
Trivento (CB)	41	10.020.204,80
Tufara (CB)	7	901.970,24
Ururi (CB)	69	14.176.606,14
Vinchiatturo (CB)	1	350.000,00
Totale complessivo	1221	359.850.679,75


(Dati estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Quota Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione

Comuni beneficiari

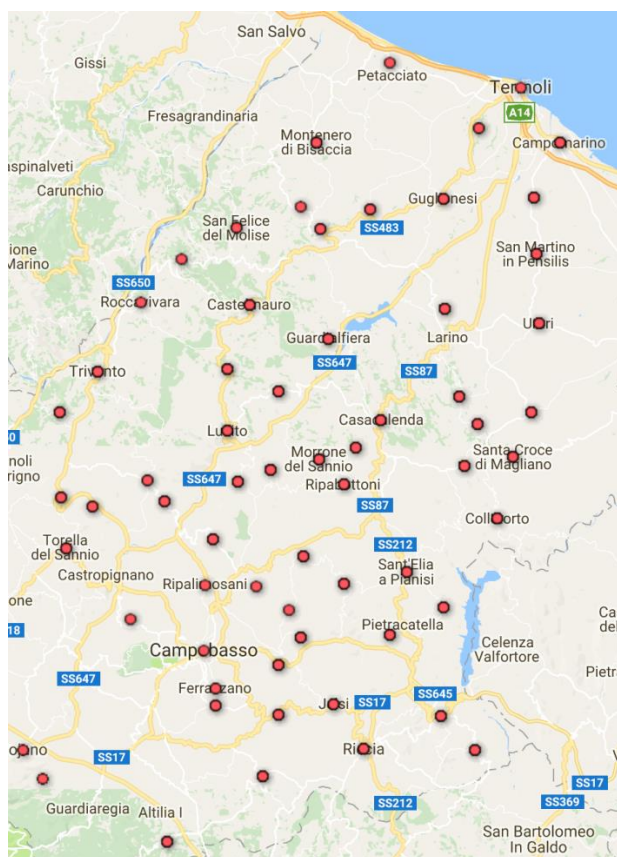



Valore finanziario

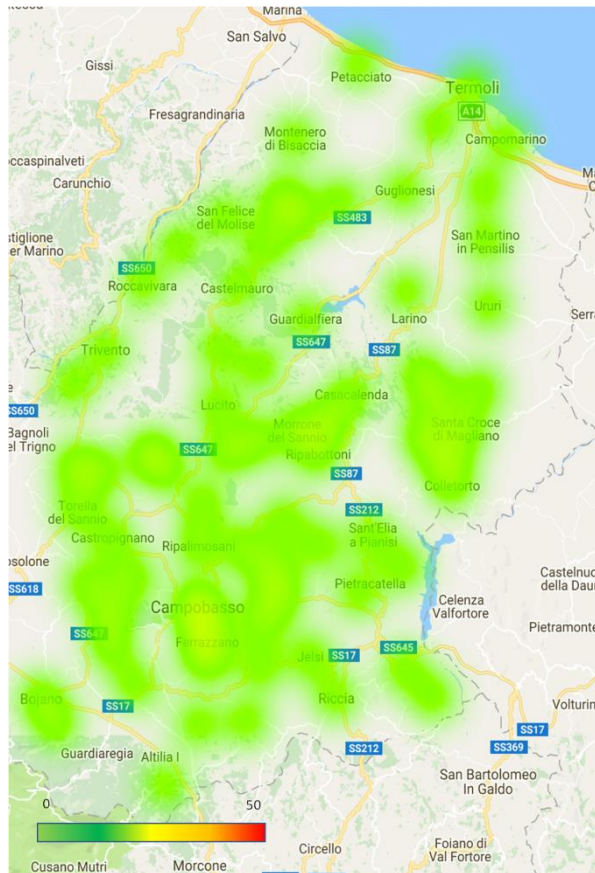

Grafici 18 e 19 – Rappresentazione su mappa degli interventi e valore finanziario

Infine, con riferimento all'Accordo di Programma Quadro "Immobili privati in classe di priorità A" e Atti Integrativi, si rappresenta su mappa la localizzazione degli interventi e il relativo valore finanziario per singolo Comune.

Quota Sisma 2002 – APQ Immobili Privati in classe di priorità A
Comuni beneficiari **Valore finanziario**

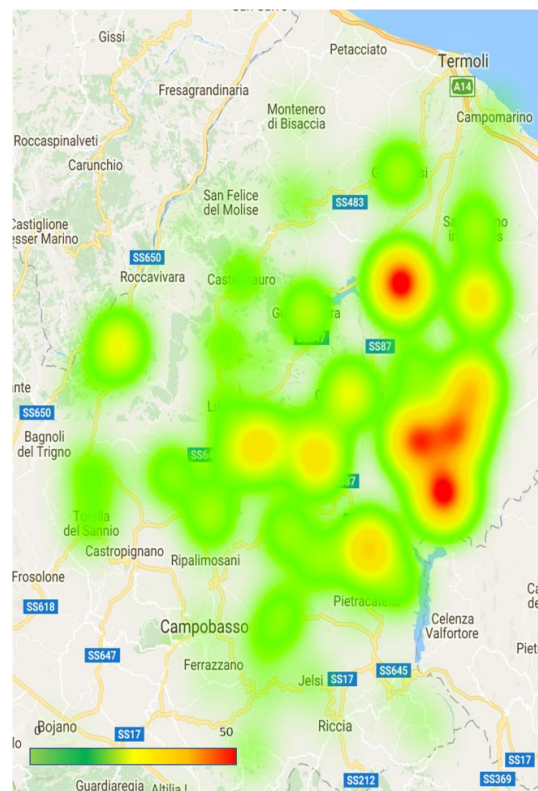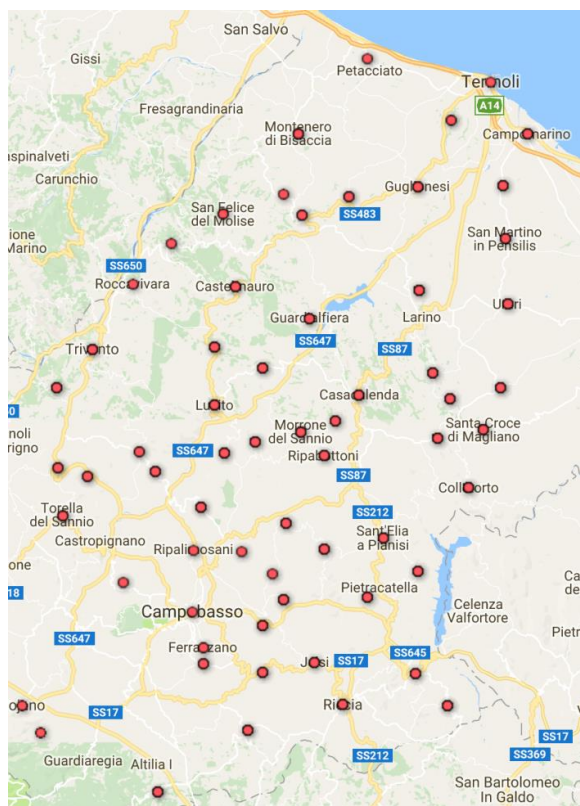

Grafici 20 e 21 - Rappresentazione su Mappa degli interventi e valore finanziario

8. CRONOPROGRAMMA DI SPESA FSC

Anno	Costo Realizzato FSC	Costo da Realizzare FSC
2001	-	-
2003	-	-
2004	181.676,94	-
2005	2.385.922,71	-
2006	2.588.764,11	-
2007	894.741,57	-
2008	401.660,05	-
2009	612.150,92	-
2010	345.727,06	-
2011	3.067.051,49	-
2012	23.667.543,01	-
2013	47.727.760,79	-
2014	21.206.794,11	-
2015	47.539.905,14	94.699,92
2016	25.383.673,48	1.022.147,13
2017	36.857.965,95	760.568,27
2018	44.726.125,17	502.735,68
2019	-	108.621.311,17
Totale	257.587.462,50*	111.001.462,17

Tabella 12 - Cronoprogramma di spesa delle risorse FSC assegnate dalla delibera del CIPE n. 62/2011 alla data di monitoraggio del 31.12.2018 – Fonte Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE

*Il totale contiene euro 49.457,38 di costo realizzato maturato dall'intervento MOS4.ES.022 con OGV non assunta nei termini

Di seguito la rappresentazione grafica dei dati riportati nella tabella.

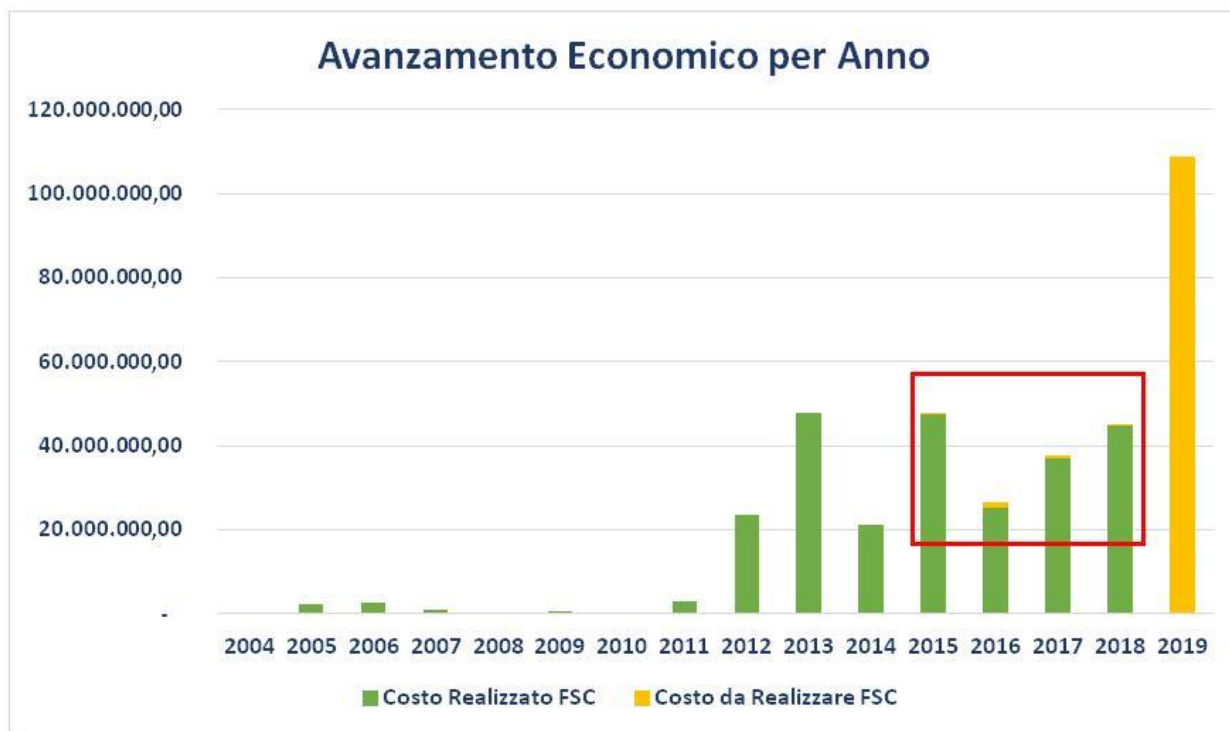


Grafico 22 - Fonte Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE dati al 31.12.2018

9. MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Come si esporrà puntualmente al successivo paragrafo 15. *Impegni giuridicamente vincolanti*, con delibera 17 dicembre 2013, n. 94, il CIPE ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla delibera n. 14/2013, con riferimento agli interventi finanziati, fra l'altro, dalla delibera CIPE n. 62/2011 (punto 1.).

Con successiva delibera 30 giugno 2014, n. 21, il CIPE, in relazione agli esiti della ricognizione effettuata da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, ai sensi della suddetta delibera n. 94/2013, ha sottratto alla disponibilità delle Regioni meridionali e, quindi, al Molise, le risorse per le quali l'OGV fosse prevista oltre i termini del 31 dicembre 2014, salvaguardando, invece, le risorse per le quali l'OGV fosse stata assunta entro il 30 giugno 2014.

Per il Molise, le risorse sottratte a motivo di assenza di previsione di OGV, in quanto non programmate, ammontano a euro 1.609.772,42, così come indicato nell'allegato 2 alla delibera n. 21/2014.

Di seguito si riporta l'articolazione delle risorse sottratte per singola assegnazione:

	Risorse FSC assegnate dalla delibera CIPE 62/2011	Risorse FSC sottratte (All. 2 CIPE 21/2014)*	Risorse FSC post delibera CIPE 21/2014
Sisma 2002 - percorso di ricostruzione	346.200.000,00	428.167,00	345.771.833,00
Danni alluvionali (DPCM 2210/10)	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Danni alluvionali (OPCM 3268/03)	16.590.000,00	1.173.783,41	15.416.216,59
Eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09)	17.740.000,00	7.822,01	17.732.177,99
Totale	386.530.000,00	1.609.772,42	384.920.227,58

Tabella 13 - Dati rielaborati da report di Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE

* Valore FSC degli interventi strategici senza previsione di OGV. Interventi di cui alle delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 60/2012 e 87/2012 al netto delle previsioni di legge

La stessa delibera CIPE n. 21/2014 al punto 2.1, ha disposto, inoltre, per le risorse relative ai progetti che hanno assunto OGV oltre il 30 giugno 2014, ma entro il 31 dicembre 2014, la decurtazione del 10%. Tuttavia, al fine di evitare l'insorgenza di criticità finanziarie, il CIPE ha stabilito che tale decurtazione sarà posta a carico della programmazione regionale FSC 2014-2020.

Di seguito si riporta la sintesi.

APQ	Risorse FSC con OGV assunta tra il 30.06.2014 e il 31.12.2014	Decurtazione del 10% (delibera CIPE 21/2014 punto 2.1)
MOS1 - Edifici di culto e immobili annessi	-	-
MOS2 - Immobili privati in classe di priorità "A"	921.558,95	92.155,90
MOS3 - Immobili privati in classe di priorità "A" I Atto integrativo	-	-
MOS4 - Edilizia scolastica	3.833.500,00	383.350,00
MOS5 - Opere Pubbliche	940.000,00	94.000,00
MOS6 - Interventi di riparazione funzionale	20.000,00	2.000,00
MOS7 - Anticipazione al Comune di San Giuliano di Puglia per risarcimento danni riconosciuti alle parti civili	-	-
MOS8 - Interventi di riparazione funzionale I Atto integrativo	320.000,00	32.000,00
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" II Atto integrativo	155.111.413,59	15.511.141,36
MOA1 - Eventi atmosferici 2008 OPCM 3734/09	16.370.000,00	1.637.000,00
MOA2 - Danni alluvionali OPCM 3268/2003	4.585.000,00	458.500,00
MOA3 - Danni alluvionali - D.P.C.M. 2210/10 - PRA MOLISE 2007-2013	776.204,86	77.620,49
Totale	182.877.677,40	18.287.767,74

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

10. PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

Nel corso del 2018 il RUPA ha provveduto, a seguito delle periodiche ricognizioni effettuate sulla base dei dati di monitoraggio degli interventi a carico della quota "Sisma 2002 – Percorso di ricostruzione", inseriti nel Sistema Gestione Progetti alle diverse sessioni di monitoraggio, a evidenziare al Direttore dell'ARPS, RUA, criticità relative all'assenza di avanzamento (costo realizzato pari a zero) per numerosi interventi posti nello stato "sospeso", come peraltro riportato nei RAE (Rapporti Annuali di Esecuzione) riferiti all'anno 2016 e 2017, piuttosto che al perdurare dell'assenza di monitoraggio per alcuni interventi per più bimestri, chiedendo di porre in essere ogni azione tesa a risolvere le criticità attuative e a scongiurare la perdita delle risorse (note prot. n. 25925/2018 del 22 febbraio 2018, prot. n. 116979/2018 del 13 settembre 2018 e prot. n. 158663/2018 del 13 dicembre 2018). Con nota prot. n. 150354/2018 del 26 novembre 2018, il Direttore dell'ARPS, ha comunicato il superamento delle cause che avevano determinato la sospensione degli interventi inseriti nel II Atto integrativo all'APQ Immobili privati in classe di priorità "A" (MOS9) indicati nell'allegato alla stessa nota (interventi inseriti negli Allegati B e C ai RAE 2016 e 2017) e ne ha chiesto la riattivazione informatica. Il RUPA, in data 27 novembre 2018, ha sbloccato gli interventi ai fini dell'aggiornamento dei relativi dati in SGP nell'ambito della sessione al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, al 31 dicembre 2018, a seguito della chiusura della sessione di monitoraggio intervenuta a gennaio 2019, nonostante la riattivazione, permane il ritardo nell'attuazione per n. 139 interventi con avanzamento (costo realizzato) pari a zero. L'importo finanziario di detti interventi è di euro 28.996.596,76, di cui euro 28.308.964,80 di risorse FSC.

Gli Accordi di Programma Quadro in cui sono inseriti i predetti interventi con criticità sono i seguenti:

Codice SGP	Descrizione	N. Interventi con costo realizzato pari a zero	Totale finanziamenti degli interventi con costo realizzato pari a zero	di cui FSC
MOS2	Immobili privati in classe di priorità "A"	5	1.918.209,95	1.765.228,77
MOS3	Immobili privati in classe di priorità "A" 1° Atto integrativo	7	2.533.406,67	1.998.755,89
MOS8	Interventi di riparazione funzionale 1° Atto integrativo	29	593.646,33	593.646,33
MOS9	Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	98	23.951.333,81	23.951.333,81
Totale		139	28.996.596,76	28.308.964,80

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conosciuti (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

L'elenco degli interventi privi di avanzamento al 31 dicembre 2018 è il seguente:

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS2.EP030PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 73 Sp 1	COMUNE DI CASTELMAURO (CB)	689.281,73	-	689.281,73
MOS2.EP084PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 35 Sp 2	COMUNE DI LARINO (CB)	202.125,74	-	202.125,74
MOS2.EP099PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 343 Sp 1	COMUNE DI LARINO (CB)	37.395,56	35.720,44	73.116,00
MOS2.EP100PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 371 Sp 1	COMUNE DI LARINO (CB)	123.560,40	32.729,41	156.289,81
MOS2.EP153PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 71 Sp 1	COMUNE DI ROTELLO (CB)	712.865,34	84.531,33	797.396,67

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS3.EP001PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES L	COMUNE DI CAMPOBASSO (CB)	641.341,78	192.976,28	834.318,06
MOS3.EP026PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 30 Sp 1	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	449.421,05	-	449.421,05
MOS3.EP031PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 64 Sp 06	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	94.290,69	-	94.290,69
MOS3.EP034PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 60 Sp 01	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	316.628,51	-	316.628,51
MOS3.EP066PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 128	COMUNE DI GUGLIONESI (CB)	43.230,24	122.059,80	165.290,04
MOS3.EP091PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PEU 39 Sp 1	COMUNE DI SALCITO (CB)	242.153,43	44.243,22	286.396,65
MOS3.EP096PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" - PES 19	COMUNE DI TAVENNA (CB)	211.690,19	175.371,48	387.061,67
MOS8.EP007RF Lavori di riparazione funzionale - COMUNE DI CASACALENDA (ex DI PIETRANTONIO Pasquale)	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP008RF Lavori di riparazione funzionale - FORNILLO Daniele	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP023RF Lavori di riparazione funzionale - FERRANTE Maria Vittoria	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP025RF Lavori di riparazione funzionale - DE LISIO Angiolina	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP030RF Lavori di riparazione funzionale - DE LUCA Giuseppe	COMUNE DI GAMBATESA (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP039RF Lavori di riparazione funzionale - CERIMELE O. - CERIMELE R. - LANZA Maria L.	COMUNE DI LARINO (CB)	49.939,90	-	49.939,90
MOS8.EP057RF Lavori di riparazione funzionale - DE MARCO Armando	COMUNE DI MONTELONGO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP061RF Lavori di riparazione funzionale - D'ETTORRE Gilda	COMUNE DI PETACCIATO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP064RF Lavori di riparazione funzionale - CAPRARA Guido	COMUNE DI PETACCIATO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP065RF Lavori di riparazione funzionale - IURESCIA Pasquale - IURESCIA Gabriele	COMUNE DI PETACCIATO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP066RF Lavori di riparazione funzionale - IURESCIA Pasquale	COMUNE DI PETACCIATO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP067RF Lavori di riparazione funzionale - DI GIACOBBE Mario	COMUNE DI PETACCIATO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP069RF Lavori di riparazione funzionale - Eredi CASOLINO Enzo - MINICUCCI Licia	COMUNE DI PORTOCANNONE (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP088RF Lavori di riparazione funzionale - DEL GATTO Nunzio	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS8.EP094RF Lavori di riparazione funzionale - BARBERIO Giuseppe	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP095RF Lavori di riparazione funzionale - VIDETTI Gino	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP097RF Lavori di riparazione funzionale - PIGNATELLI Luigi	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	14.004,48	-	14.004,48
MOS8.EP099RF Lavori di riparazione funzionale - MARINO Emilio	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP100RF Lavori di riparazione funzionale - SEBASTIANO Vincenzo	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP104RF Lavori di riparazione funzionale - IAMMARINO Flaviano	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP105RF Lavori di riparazione funzionale - IAMMARINO Flaviano	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP107RF Lavori di riparazione funzionale - IANTOMASI Flavio	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP122RF Lavori di riparazione funzionale - MORGANTE Antonio	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	10.048,47	-	10.048,47
MOS8.EP124RF Lavori di riparazione funzionale - PETTI Luigi	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP126RF Lavori di riparazione funzionale - COLOMBO Ida	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	19.653,48	-	19.653,48
MOS8.EP128RF Lavori di riparazione funzionale - CASAMONICA Rosaria	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP135RF Lavori di riparazione funzionale - OCCHIONERO Elisa	COMUNE DI URURI (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP156RF Lavori di riparazione funzionale - FRATINO Chiarina	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS8.EP161RF Lavori di riparazione funzionale - NASILLO Davide	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	20.000,00	-	20.000,00
MOS9.EP011PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 271 Sp 1	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	366.254,25	-	366.254,25
MOS9.EP013PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 89 Sp 1	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	515.681,84	-	515.681,84
MOS9.EP019PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 200 Sp 1	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	161.065,42	-	161.065,42
MOS9.EP021PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 58 Sp 1	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	852.201,40	-	852.201,40
MOS9.EP032PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 178 Sp 3	COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB)	226.781,74	-	226.781,74
MOS9.EP034PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 133	COMUNE DI ROTELLO (CB)	84.529,95	-	84.529,95

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS9.EP045PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 64 Sp 1	COMUNE DI ROTELLO (CB)	505.167,24	-	505.167,24
MOS9.EP046PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 34 Sp 2	COMUNE DI ROTELLO (CB)	604.861,54	-	604.861,54
MOS9.EP074PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 10-231 Sp 01	COMUNE DI BONEFRO (CB)	98.210,07	-	98.210,07
MOS9.EP101PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 51.592	COMUNE DI TRIVENTO (CB)	198.578,79	-	198.578,79
MOS9.EP114PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 20 Sp 1	COMUNE DI CAMPOLIETO (CB)	111.917,91	-	111.917,91
MOS9.EP124PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 62 Sp 1	COMUNE DI CAMPOLIETO (CB)	170.968,14	-	170.968,14
MOS9.EP131PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 57 Sp 1	COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB)	225.015,46	-	225.015,46
MOS9.EP142PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 60 Sp 1	COMUNE DI PALATA (CB)	279.082,47	-	279.082,47
MOS9.EP144PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 6 Sp 1	COMUNE DI PALATA (CB)	316.810,51	-	316.810,51
MOS9.EP158PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 54 Sp 1	COMUNE DI CAMPODIPIETRA (CB)	12.893,71	-	12.893,71
MOS9.EP162PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 668 Sp 1	COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)	146.518,58	-	146.518,58
MOS9.EP164PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 656 Sp 3	COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)	145.839,76	-	145.839,76
MOS9.EP182PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 28 Sp 2	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB)	121.233,64	-	121.233,64
MOS9.EP184PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 18 Sp 2	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB)	35.334,56	-	35.334,56
MOS9.EP186PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 28 Sp 3	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB)	155.459,39	-	155.459,39
MOS9.EP188PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 45 Sp 01	COMUNE DI CIVITACAMPOMARANO (CB)	496.926,75	-	496.926,75
MOS9.EP191PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 71 Sp 1	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA (CB)	61.101,75	-	61.101,75
MOS9.EP194PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 26 Sp 1	COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA (CB)	287.979,33	-	287.979,33

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS9.EP201PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 219 Sp 1	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	21.999,48	-	21.999,48
MOS9.EP204PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 25 Sp 2	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	49.283,03	-	49.283,03
MOS9.EP207PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 23 Sp 1	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	323.918,05	-	323.918,05
MOS9.EP217PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 10 Sp 3	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	345.864,18	-	345.864,18
MOS9.EP220PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 46 Sp 4	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	271.122,32	-	271.122,32
MOS9.EP224PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 219 Sp 2	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	40.830,39	-	40.830,39
MOS9.EP227PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 23 Sp 2	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	68.509,73	-	68.509,73
MOS9.EP231PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 94 Sp 01	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	957.644,04	-	957.644,04
MOS9.EP237PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 6 Sp 4	COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)	67.445,41	-	67.445,41
MOS9.EP240PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 8 Sp 1	COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)	158.143,55	-	158.143,55
MOS9.EP242PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 43 Sp 1	COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)	98.606,79	-	98.606,79
MOS9.EP248PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 30 Sp 1	COMUNE DI MONTAGANO (CB)	102.101,04	-	102.101,04
MOS9.EP255PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 57 Sp 1	COMUNE DI MONTAGANO (CB)	181.031,71	-	181.031,71
MOS9.EP268PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 16 Sp 1	COMUNE DI LUCITO (CB)	84.094,41	-	84.094,41
MOS9.EP269PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 94 Sp 1	COMUNE DI LUCITO (CB)	39.507,11	-	39.507,11
MOS9.EP270PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 46 Sp 2	COMUNE DI LUCITO (CB)	90.884,49	-	90.884,49
MOS9.EP278PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 3 Sp 2	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	841.293,45	-	841.293,45
MOS9.EP279PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 3 Sp 3	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	149.137,27	-	149.137,27

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS9.EP280PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 4 Sp 1	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	66.171,42	-	66.171,42
MOS9.EP285PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 12 Sp 1	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	286.739,77	-	286.739,77
MOS9.EP289PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 16 Sp 3	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	461.937,95	-	461.937,95
MOS9.EP290PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 24 Sp 1	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	143.366,17	-	143.366,17
MOS9.EP293PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 27 Sp 1	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	215.512,74	-	215.512,74
MOS9.EP300PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 55 Sp 2	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	117.889,44	-	117.889,44
MOS9.EP301PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 55 Sp 4	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	198.033,60	-	198.033,60
MOS9.EP303PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 75 Sp 1	COMUNE DI CASTELLINO DEL BIFERNO (CB)	354.951,69	-	354.951,69
MOS9.EP315PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 12 Sp 2	COMUNE DI GUARDIALFIERA (CB)	358.868,52	-	358.868,52
MOS9.EP319PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 32 Sp 1	COMUNE DI GAMBATESA (CB)	106.456,75	-	106.456,75
MOS9.EP324PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 25 Sp 1	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (CB)	164.273,12	-	164.273,12
MOS9.EP338PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 100 Sp 1	COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI (CB)	273.716,98	-	273.716,98
MOS9.EP348PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 1	COMUNE DI PIETRACATELLA (CB)	129.529,66	-	129.529,66
MOS9.EP360PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 64	COMUNE DI TORO (CB)	44.114,46	-	44.114,46
MOS9.EP373PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 25	COMUNE DI RIPABOTTONI (CB)	117.830,48	-	117.830,48
MOS9.EP375PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 37	COMUNE DI RIPABOTTONI (CB)	56.567,91	-	56.567,91
MOS9.EP383PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 21/B Sp 1	COMUNE DI PORTOCANNONE (CB)	67.201,88	-	67.201,88
MOS9.EP384PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 1/A Sp 2	COMUNE DI PORTOCANNONE (CB)	97.512,41	-	97.512,41

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS9.EP386PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 1/A Sp 7	COMUNE DI PORTOCANNONE (CB)	82.190,21	-	82.190,21
MOS9.EP389PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 14 Sp 1	COMUNE DI TUFARA (CB)	186.107,17	-	186.107,17
MOS9.EP395PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 73 Sp 1	COMUNE DI RIPALIMOSANI (CB)	358.645,42	-	358.645,42
MOS9.EP396PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 4	COMUNE DI TERMOLI (CB)	120.457,01	-	120.457,01
MOS9.EP399PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 342 Sp 1	COMUNE DI LARINO (CB)	486.382,89	-	486.382,89
MOS9.EP401PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 56 Sp 2	COMUNE DI LARINO (CB)	375.528,45	-	375.528,45
MOS9.EP405PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 44 Sp 1	COMUNE DI LARINO (CB)	332.484,86	-	332.484,86
MOS9.EP408PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 127 Sp 1	COMUNE DI LARINO (CB)	259.133,68	-	259.133,68
MOS9.EP411PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 16 Sp 05	COMUNE DI LARINO (CB)	249.837,70	-	249.837,70
MOS9.EP413PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 56 Sp 7	COMUNE DI LARINO (CB)	207.010,95	-	207.010,95
MOS9.EP415PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 2 Sp 2	COMUNE DI LARINO (CB)	173.967,87	-	173.967,87
MOS9.EP417PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 45 Sp 3	COMUNE DI LARINO (CB)	185.871,29	-	185.871,29
MOS9.EP423PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 22 Sp 1	COMUNE DI LARINO (CB)	116.668,32	-	116.668,32
MOS9.EP427PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 48 Sp 9	COMUNE DI LARINO (CB)	75.349,97	-	75.349,97
MOS9.EP430PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A integrativo al D.C. 63/2007-PEU 28 SP4	COMUNE DI LARINO (CB)	33.875,03	-	33.875,03
MOS9.EP437PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 39 Sp 3	COMUNE DI CASACALENDA (CB)	100.829,87	-	100.829,87
MOS9.EP441PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 43 Sp 1	COMUNE DI LIMOSANO (CB)	495.549,84	-	495.549,84
MOS9.EP442PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 43 Sp 2	COMUNE DI LIMOSANO (CB)	317.235,14	-	317.235,14

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS9.EP446PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 23	COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)	68.509,73	-	68.509,73
MOS9.EP450PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 205	COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)	117.925,12	-	117.925,12
MOS9.EP452PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 51 Sp 4	COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)	83.325,69	-	83.325,69
MOS9.EP453PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 58 Sp 3	COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)	205.314,57	-	205.314,57
MOS9.EP457PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 16 Sp 2	COMUNE DI GILDONE (CB)	596.486,53	-	596.486,53
MOS9.EP464PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 1 Sp 5	COMUNE DI GUGLIONESI (CB)	538.114,52	-	538.114,52
MOS9.EP471PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 62	COMUNE DI MONACILIONI (CB)	92.456,03	-	92.456,03
MOS9.EP475PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 15 Sp 4	COMUNE DI MONACILIONI (CB)	138.280,20	-	138.280,20
MOS9.EP476PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 9 Sp 2	COMUNE DI MONACILIONI (CB)	166.218,05	-	166.218,05
MOS9.EP482PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 2 Sp 1	COMUNE DI ROCCAVIVARA (CB)	325.270,48	-	325.270,48
MOS9.EP484PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 26	COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)	214.406,21	-	214.406,21
MOS9.EP485PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 1 Sp 1	COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO (CB)	76.184,98	-	76.184,98
MOS9.EP506PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 7 Sp 2	COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE (CB)	56.179,87	-	56.179,87
MOS9.EP509PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PEU 19B28 Sp 03	COMUNE DI BONEFRO (CB)	123.156,42	-	123.156,42
MOS9.EP511PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 53 (PES 5)	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (IACP) DI CAMPOBASSO	790.968,20	-	790.968,20
MOS9.EP512PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 52 (PES 4)	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (IACP) DI CAMPOBASSO	855.855,96	-	855.855,96
MOS9.EP513PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 51 (PES 2)	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (IACP) DI CAMPOBASSO	790.968,20	-	790.968,20
MOS9.EP514PU lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 25 (IACP)	ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI (IACP) DI CAMPOBASSO	896.332,34	-	896.332,34

Codice intervento - Intervento	Soggetto attuatore	Finanziamento FSC	Altre fonti di finanziamento	Totale finanziamento
MOS9.EP518PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 21	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	68.509,73	-	68.509,73
MOS9.EP519PR lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità A PES 128	COMUNE DI COLLETORTO (CB)	257.239,71	-	257.239,71
		28.308.964,80	687.631,96	28.996.596,76

Una ulteriore criticità emersa e segnalata dal RUPA al RUA con nota prot. n. 140381/2018 del 5 novembre 2018, riguarda gli interventi che, dalla verifica dei dati al 31 agosto 2018, risultavano “non monitorati” per sei bimestri consecutivi rispetto all’obbligo previsto all’art. 11 della legge regionale n. 16/2010.

11. MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE

Al 31 dicembre 2018 non si rilevano modifiche nell’ambito dell’attuazione.

12. VALUTAZIONE E SORVEGLIANZA

Gli APQ stipulati prevedono che in sede di Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) la Regione, attraverso il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, effettua una valutazione *in itinere* degli interventi inclusi negli stessi. Il rapporto di valutazione integra il RAE e ne costituisce allegato.

Al 31 dicembre del secondo anno successivo alla conclusione degli interventi la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici redige un rapporto di valutazione *ex post* sull'efficacia degli stessi e sui risultati conseguiti.

Il rapporto di valutazione viene trasmesso all’Agenzia per la Coesione Territoriale che provvede all’invio al NUVAP – DPCoe - PCM per le valutazioni di competenza.

Nella considerazione del valore finanziario a carico del FSC dell’APQ Immobili privati in classe di priorità "A" e Atti integrativi, pari a euro 277.167.757,14, che rappresentano il 98 per cento del totale delle risorse attivate sulla Quota Sisma 2002, nonché dell’importanza che gli interventi rivestono nel completamento del percorso di ricostruzione e delle criticità attuative evidenziate, il Responsabile del Programma ha condiviso con il NrVVIP la relativa domanda valutativa.

Il rapporto di valutazione *in itinere* degli APQ, alla data del 31 dicembre 2018, e il predetto approfondimento valutativo redatto costituirà allegato al presente Rapporto Annuale di Esecuzione.

13. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L’Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma (ARPS) per gli APQ e Atti Integrativi riferiti alla Quota “Sisma 2002” e il Servizio regionale di Protezione Civile del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale per gli APQ riferiti alla Quota Danni Alluvionali/Eventi Atmosferici, hanno la responsabilità di porre in essere gli adempimenti e le procedure per l’attuazione degli interventi ad essi affidati, di effettuare le verifiche sulle attestazioni di spesa ivi comprese le verifiche in loco, di verbalizzare e trasmettere le risultanze delle verifiche all’Organismo di Certificazione e al Responsabile della Programmazione (RUPA), di ordinare e contabilizzare la spesa, di raccogliere le dichiarazioni e i rendiconti del soggetto attuatore, di certificare la spesa all’Organismo di Certificazione, di chiudere formalmente l’intervento concluso, di validare ed inviare le informazioni di monitoraggio.

A tal fine svolgono le seguenti attività:

- acquisizione documentazione e attività istruttoria per la concessione ed erogazione del finanziamento;
- formulazione e sottoscrizione della registrazione dell’impegno di spesa;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di approvazione degli interventi e di concessione del finanziamento unitamente al Disciplinare di concessione che sarà sottoscritto dal soggetto attuatore;
- formulazione e sottoscrizione del provvedimento di liquidazione di acconti e stati di avanzamento lavori.

L'attività di controllo di primo livello, da esercitare in concomitanza con la gestione dell'intervento e diretta a verificare la corretta esecuzione delle operazioni gestionali e delle eventuali irregolarità, comprende le seguenti tipologie di verifiche:

- verifiche amministrative di tutta la documentazione presentata dal soggetto attuatore;
- eventuali verifiche in loco.

I controlli di primo livello sono svolti dall'ARPS per gli APQ e Atti Integrativi riferiti alla Quota "Sisma 2002" e dal Servizio regionale di Protezione Civile del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale per gli APQ riferiti alla Quota Danni Alluvionali/Eventi Atmosferici attraverso una unità/Ufficio diverso da quello che provvede all'istruttoria e che propone le decisioni di approvazione di spesa e di pagamento.

L'Ufficio Sorveglianza e Controllo, incardinato presso il Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, espleta la sorveglianza sull'attività di controllo di 1° livello svolta dai predetti Agenzia regionale per la ricostruzione Post Sisma e Servizio regionale di Protezione Civile.

Come disposto dalla delibera CIPE n.166/07, il NUVEC, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, oltre a esaminare l'efficace funzionamento del Sistema di gestione e controllo (procedure, struttura organizzativa, sistemi informatici e informativi), al fine di garantire la corretta e tempestiva attuazione dei programmi e la presenza di adeguati strumenti di controllo per la verifica delle irregolarità, sottoporrà a verifica i singoli interventi del Programma.

La verifica sarà articolata in una fase *desk* di acquisizione dei dati descrittivi del sistema ed una fase in loco per il riscontro dell'effettivo funzionamento, nel rispetto del principio del contraddittorio.

La verifica di sistema consentirà di definirne l'affidabilità e di dimensionare i campioni di operazioni da sottoporre a verifica delle attestazioni di spesa.

Le risultanze di tale attività saranno presentate in appositi rapporti.

14. ASSISTENZA TECNICA

Il punto 2.13 della delibera CIPE n. 1/2009 definisce pari al 3% il limite entro cui programmare le risorse destinate alle azioni di cui al punto 4.2 della delibera n. 166/2007 per i Programmi con importi fino a 500 milioni di euro, per il finanziamento di azioni volte a migliorare la capacità del Programma di conseguire i propri obiettivi. Per i dettagli si rinvia a quanto riportato al precedente paragrafo "MOSZ - Azioni di sistema".

Al 31.12.2018, il valore delle Azioni di sistema riconosciuto nell'ambito degli Accordi di Programma Quadro "rafforzati" sottoscritti è di euro 10.068.959,44, pari al 3% del valore delle risorse FSC programmate relative alla quota "Sisma 2002 - percorso di ricostruzione", che, al netto di euro 86.400,65 derivanti dai meccanismi sanzionatori sopra esposti, risulta pari a euro 9.982.558,79.

15. IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI

La delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14 (*G.U. n.140 del 17 giugno 2013*), recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - attuazione dell'articolo 16 - comma 2 del decreto-legge n. 95/2012 (riduzioni di spesa per le regioni a statuto ordinario) e disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo", nel disporre, al punto 2, la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), previsto dalle delibere del CIPE n. 8/2012 e n. 60/2012 in materia ambientale, ha esteso tale termine anche alle risorse della delibera n. 62/2011.

La Regione Molise si è fatta parte attiva, in sede di Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, per il differimento del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto al 31 dicembre 2013 dalla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate, fra l'altro, con la delibera del CIPE n.62/2011.

La Conferenza delle Regioni ha approvato la proposta del Molise in data 26 settembre 2013 di differimento, al 30 giugno 2014, del termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già fissato al 31 dicembre 2013 dalla suddetta delibera n. 14/2013.

Con delibera 17 dicembre 2013, n. 94 (*G.U. n. 75 del 31 marzo 2014*), concernente il FSC 2007-2013, il CIPE ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), già

stabilito al 31 dicembre 2013 dalla predetta delibera n. 14/2013, con riferimento agli interventi finanziati, fra l'altro, dalla delibera CIPE n. 62/2011 (punto 1.).

La stessa delibera n. 94/2013, ha, inoltre, previsto, al punto 2., che, con riferimento agli interventi per i quali le Regioni prevedano l'impossibilità di rispettare le relative scadenze di impegno e ne confermino in ogni caso la rilevanza strategica, che le medesime Regioni certifichino entro 90 giorni dall'adozione della medesima delibera le date previste per l'assunzione delle relative obbligazioni giuridicamente vincolanti, esponendo per ciascun intervento - a corredo della predetta certificazione e con inclusione degli interventi per i quali le relative OGV non potranno intervenire prima del 30 giugno 2014 - il relativo piano finanziario e il profilo di spesa articolato per anno, al fine di consentire al CIPE di assumere eventuali provvedimenti di salvaguardia in relazione alla manifestata strategicità degli interventi.

Con delibera 30 giugno 2014, n. 21 (*G.U. n. 220 del 22 settembre 2014*), recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse", il CIPE, in relazione agli esiti della ricognizione di cui al punto 2. della citata delibera n. 94/2013, con riferimento alle OGV a valere sulle assegnazioni di cui, fra l'altro, alla delibera n. 62/2011, ha disposto, al punto 2. "Salvaguardia degli interventi e disciplina per l'utilizzo delle risorse" (punti 2.1 e 2.4) quanto segue:

2.1. Sono salvaguardati tutti gli interventi per i quali l'assunzione dell'OGV è prevista entro il 31 dicembre 2014 ... omissis ...

2.4 Saranno altresì sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli interventi di cui al precedente punto 2.1 per i quali non saranno rispettati i termini indicati per l'assunzione dell'OGV. Tali risorse potranno essere riassegnate alle Regioni interessate, al netto di una decurtazione del 15 per cento.

Ai sensi del predetto punto 2.4 della delibera CIPE 21/2014, saranno sottratte al Molise risorse FSC per complessivi euro 2.966.422,45, di cui euro 2.880.021,80 riferiti a n. 13 interventi che non hanno raggiunto l'OGV entro il 31 dicembre 2014 ed euro 86.400,65, quale relativa quota del 3% delle Azioni di Sistema.

Di seguito si riportano gli interventi che non hanno raggiunto l'OGV entro la suddetta data e il valore finanziario degli stessi in riferimento a ciascun APQ.

Codice intervento in SGP	Intervento	Risorse FSC
MOS4.ES.022	Autorizzazione alla modifica dell'intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico della scuola elementare e media in ricostruzione con l'assegnazione di un finanziamento integrativo - Scuola elementare e media	853.540,00
MOS9.EP264PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 7 Sp 1	58.052,27
MOS9.EP265PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 46 Sp 1	91.662,20
MOS9.EP273PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 2	131.316,83
MOS9.EP495PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 49 Sp 1	64.525,36
MOS9.EP524PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 65	38.969,05
MOS9.EP525PR	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PES 46	28.699,52
MOS9.EP526PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 13 Sp 1	100.400,47
MOS9.EP148PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 20 Sp 1	164.273,12
MOS9.EP151PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 17 Sp 3	328.438,92
MOS9.EP323PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 87 Sp 1	271.039,99
MOS9.EP337PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 15 Sp 4	128.929,86
MOS9.EP345PU	lavori di ricostruzione immobili privati in classe di priorità "A" PEU 42 Sp 1	620.174,21
Totale interventi		2.880.021,80
Quota azioni di sistema 3%		86.400,65
Totale risorse da decurtare		2.966.422,45

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

L'importo delle risorse FSC per APQ è il seguente:

APQ	Importo FSC OGV non assunte (A)	Quota Azione di sistema da decurtare [3% di (A)]
MOS4 - Edilizia scolastica	853.540,00	25.606,20
MOS9 - Immobili privati in classe di priorità "A" 2° Atto integrativo	2.026.481,80	60.794,45
	2.880.021,80	86.400,65

(Dati rielaborati da report estratti da Ambienti conoscitivi (SGPQ) SNM – BDU – MEF – IGRUE)

Il Responsabile dell'Ufficio
Programmazione e Coordinamento Attuativo Programmi FSC
F.to Michelina Litterio

Il Direttore del Servizio Coordinamento Fondo per lo Sviluppo e la Coesione f.f.
Direttore del I Dipartimento della Presidenza della Giunta regionale
F.to Ing. Mariolga Mogavero

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82
