

Allegato A

P R O G E T T O

NETWORK ITALIANO DEGLI OSSERVATORI SULLE DIPENDENZE

N I O D

ITALIAN NETWORK OF ADDICTION OBSERVATORIES

Progetto per l'attivazione e supporto di una rete nazionale di Osservatori Regionali sull'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, in accordo con le indicazioni e gli standard europee (EMCDDA)

REGIONE MOLISE



Ente Affidatario

Regione Abruzzo
ASL Lanciano-Vasto-Chieti



In collaborazione con

EMCDDA
Osservatorio Europeo sulle Droghe e Tossicodipendenze



Ministero della Salute



Ministero della salute

INDICE

- 1.0 Titolo del progetto
- 2.0 Referenti amministrativi
- 3.0 Riassunto – Sintesi
- 3.0 Coordinamenti interistituzionali
- 4.0 Obiettivo generale dell'intervento e risultati attesi
- 5.0 Territorio ed ambienti di intervento
- 6.0 Sotto obiettivi specifici
 - 6.1 Sotto obiettivi, macro-attività, indicatori, prodotti tangibili attesi e BLR
- 7.0 Scheduling
 - 7.1 Articolazione in fasi temporali e attività
 - 7.2 Gantt preventivo
- 8.0 Agenda reporting
- 9.0 Risorse e piano finanziario

1.0 TITOLO DEL PROGETTO

Ente committente	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga Capo del Dipartimento: Dott. Giovanni Serpelloni
Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico	Direzione tecnico-scientifica: Dipartimento Politiche Antidroga Presidenza del Consiglio dei Ministri ASL Lanciano Vasto Chieti, Dipartimento di Salute Mentale
Ente affidatario	ASL Lanciano Vasto Chieti, Dipartimento di Salute Mentale
Responsabile del Progetto per l'Ente affidatario	Prof. Nicola Carlesi
Ente Executive	Regione Molise
Responsabile del Progetto per l'Ente Executive	Dr. Salvatore Panaro
Responsabili operativi del Progetto per l'Ente Executive	Dr. Salvatore Panaro

2.0 REFERENTI AMMINISTRATIVI

Coordinate

Per ASL di Lanciano-Vasto-Chieti:

Dott. Francesco Zavattaro

Tel 0871.358715
Fax 0871.63711
Email fnicola.zavattaro@aslchieti.it

Per la Regione

Servio Assistenza Socio-Sanitaria
Tel 0874.424626 - 664
Fax 0874.424682
Email severino.carla@mail.regione.molise.it
cornacchione.rosanna@mail.regione.molise.it

3.0 RIASSUNTO - SINTESI

La Regione Molise, nell'organizzazione delle proprie strutture, ha previsto di incardinare all'interno del Servizio Assistenza Socio-Sanitaria un Osservatorio Regionale sulle Dipendenze, ai fini di rilevare il fenomeno in tutte le sue dimensioni.

Il NIOD (Network Italiano degli Osservatori sulle Dipendenze) è un progetto finalizzato alla definizione di un modello standard di Osservatorio regionale sulle droghe in grado di produrre rapporti omogenei sulle realtà territoriali di competenza e nel contempo trasmettere dati in formato OEDT per la lettura nazionale del fenomeno. Infatti, in Italia è quasi del tutto assente un sistema nazionale coordinato e condiviso di raccolta, elaborazione e trasmissione dati che utilizzi gli standard europei di riferimento ai cinque indicatori epidemiologici chiave armonizzati definiti dall'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT).

4.0 OBIETTIVO GENERALE DELL'INTERVENTO E RISULTATI ATTESI

Attivazione e supporto di una rete nazionale di Osservatori Regionali sull'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, in accordo con le indicazioni e gli standard europei ((OEDT), al fine di realizzare una organizzazione permanente e coordinata di strutture operanti in ogni singola Regione/PA in grado di produrre un report standard e un flusso dati utilizzando i cinque indicatori chiave OEDT.

5.0 TERRITORIO ED AMBIENTI DI INTERVENTO

AREE GEOGRAFICHE COINVOLTE

La Regione Molise ed i SerT territoriali

ELENCO U.O. COINVOLTE


Regione Molise – SerT di Campobasso – SerT di Isernia e Venafro – SerT di Termoli – SerT di Larino – SerT di Agnone.

6.0 SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI

Di seguito sono elencati i sotto obiettivi specifici, cioè in risultati attesi del progetto .

1. Definire e realizzare l'organizzazione regionale con funzioni e compiti di Osservatorio
2. Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore General Population Surveys (GPS)
3. Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore Problem Drug Use (PDU)
4. Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore Drug Related Deaths and Mortality (DRD)
5. Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore Treatment Demand Indicator (TDI)
6. Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore Drug Related Infectious Disease (DRID)

In seguito, questi sotto obiettivi vengono ulteriormente definiti nella componente operativa e chiariti, elencando una serie di specifiche e ulteriori informazioni necessarie per la loro realizzazione, utilizzando il framework logico sotto riportato.

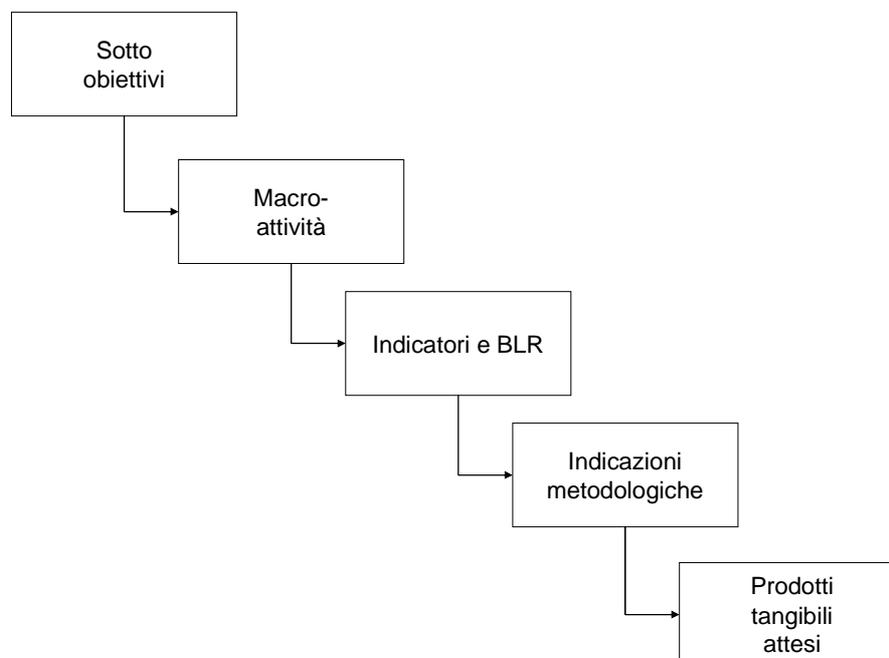

6.1 SOTTO OBIETTIVI, MACRO-ATTIVITA' E INDICATORI

N°	SOTTO OBIETTIVI SPECIFICI	MACROATTIVITA'	INDICATORI QUANTITAVI	PRODOTTI TANGIBILI ATTESI	BLR
1	Definire e realizzare l'organizzazione regionale con funzioni e compiti di Osservatorio	a- costituzione di un ufficio preposto alle funzioni di osservatorio, organizzazione di risorse umane, economiche e strumentali	Numero documenti	Documento formale di identificazione delle strutture e delle persone coinvolte	1
		b-; attività divulgativa e formativa, rivolta ai professionisti dei SerT, orientato ai criteri di governance (sistemi di qualità- risk management- evidence based- medicine- lea).	Numero eventi		1
		c-; Fare verifica della connettività fra i SerT territoriali;	Numero verifiche		1
		d- Dotarsi di un sistema di software già in uso e validato, mFp	Adozione sistema		1
2	Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore General Population Surveys (GPS)	a- analisi di fattibilità di indagini nella popolazione locale, con metodologia standard europea. b- pianificazione di un'indagine in popolazione pilota nell'anno 2011. Verifica della disponibilità dati locali o da fonti nazionali (relazioni al parlamento).		1. Report attività	1
				2. Database	1
				3. Descrittiva metodologica	1
3	Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore Problem Drug Use (PDU)	Verifica della disponibilità dati locali o da fonti nazionali (relazioni al parlamento).		1. Report attività	1
				2. Database	1
				3. Descrittiva metodologica	1
4	Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore Drug Related Deaths and Mortality (DRD)	Verifica della disponibilità di dati locali o da archivi nazionali, SDO, Ministero della Salute, degli Interni, D.P.A.		1. Report attività	1
				2. Database	1
				3. Descrittiva metodologica	1
5	Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore Treatment Demand Indicator (TDI)	Pianificazione, informatizzazione con hardware e software del sistema regionale.		1. Report attività	1
				2. Database	1
				3. Descrittiva metodologica	1
6	Raccolta dati per il calcolo dell'indicatore Drug Related Infectious Disease (DRID)	Ottimizzazione per la raccolta dati per HIV, attraverso modelli suggeriti dal DPA		1. Report attività	1
				2. Database	1
				3. Descrittiva metodologica	1

7.0 SCHEDULING

7.1 ARTICOLAZIONE IN FASI TEMPORALI E ATTIVITA'

INIZIO PREVISTO:
durata totale prevista (gg):

Fasi	Macro attività previste	Durata
1	a- costituzione di un ufficio preposto alle funzioni di osservatorio, organizzazione di risorse umane, economiche e strumentali	2 mesi
	b-; attività divulgativa e formativa, rivolta ai professionisti dei SerT, orientato ai criteri di governance (sistemi di qualità- risk management- evidence based medicine- lea).	1 giornata
	c-; Fare verifica della connettività fra i Ser.t territoriali;	2 settimane
	d- Dotarsi di un sistema di software già in uso e validato, mFp	1 mese
2	a- analisi di fattibilità di indagini nella popolazione locale, con metodologia standard europea.	1 mese
	b- pianificazione di un'indagine in popolazione pilota nell'anno2011.	1 mese
3	Verifica della disponibilità dei dati locali o da fonti nazionali (relazioni al parlamento)	2 mesi
4	verifica della disponibilità di dati locali o da archivi nazionali, SDO, Ministero della Salute, degli Interni, D.P.A.	2 mesi
5	Pianificazione, informatizzazione con hardware e software del sistema regionale	2 mesi
6	Ottimizzazione per la raccolta dati per HIV, attraverso modelli suggeriti dal DPA	2 mesi

8.0 AGENDA REPORTING

SIGLA REPORT	DATA PREVISTA	TIPO DI RAPPORTO
RR1	Dopo 4 mesi	Report in progress, dettagliato, sulla base degli obiettivi e degli indicatori predichiarati riguardante i risultati tecnici ottenuti
RF1	Dopo 4 mesi	Rendicontazione finanziaria primo semestre

9.0 RISORSE E PIANO FINANZIARIO”

A. E' stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento omnicomprensivo di € 75.000,00 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto, ripartito secondo le seguenti quote:

BENI (Inventariabili e di consumo):	10.000,00 euro
SERVIZI E FORMAZIONE:	20.000,00 euro
PERSONALE A CONTRATTO:	30.000,00 euro
MISSIONI:	5.000,00 euro
RIMBORSI:	5.000,00 euro
COSTI GENERALI DI GESTIONE:	5.000,00 euro

TOTALE 75.000,00 euro

Sono esclusi finanziamenti a favore di personale di ruolo
