



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID -19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O CARDARELLI DI CAMPOBASSO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:

Ing Francesco Volpe

ELABORATO:

**Relazione Descrittiva
e Stima sommaria**

ELABORATO:

A

SCALA:

—

DATA:

MARZO 2023

REDAZIONE:

Arch. P. Rizzo

VERIFICA:

Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:

Ing. F. Mastellone

EMESSO PER:


REV.: —

ASIREMOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 53090/2023 del 22-03-2023
Allegato 1 - Copia Documento

PRONTO SOCCORSO CARDARELLI


➤ **STATO DI FATTO**

La zona di interesse è ubicata al piano terra ed ha una superficie di circa 316,4 mq (sup. lorda); all'interno di tali aree, nella configurazione attuale, sono presenti ambulatori, locali tecnici (depositi, wc, spogliatoi), la cucina a servizio del Pronto Soccorso e una zona di connettivo orizzontale a servizio del reparto di Terapia Intensiva.

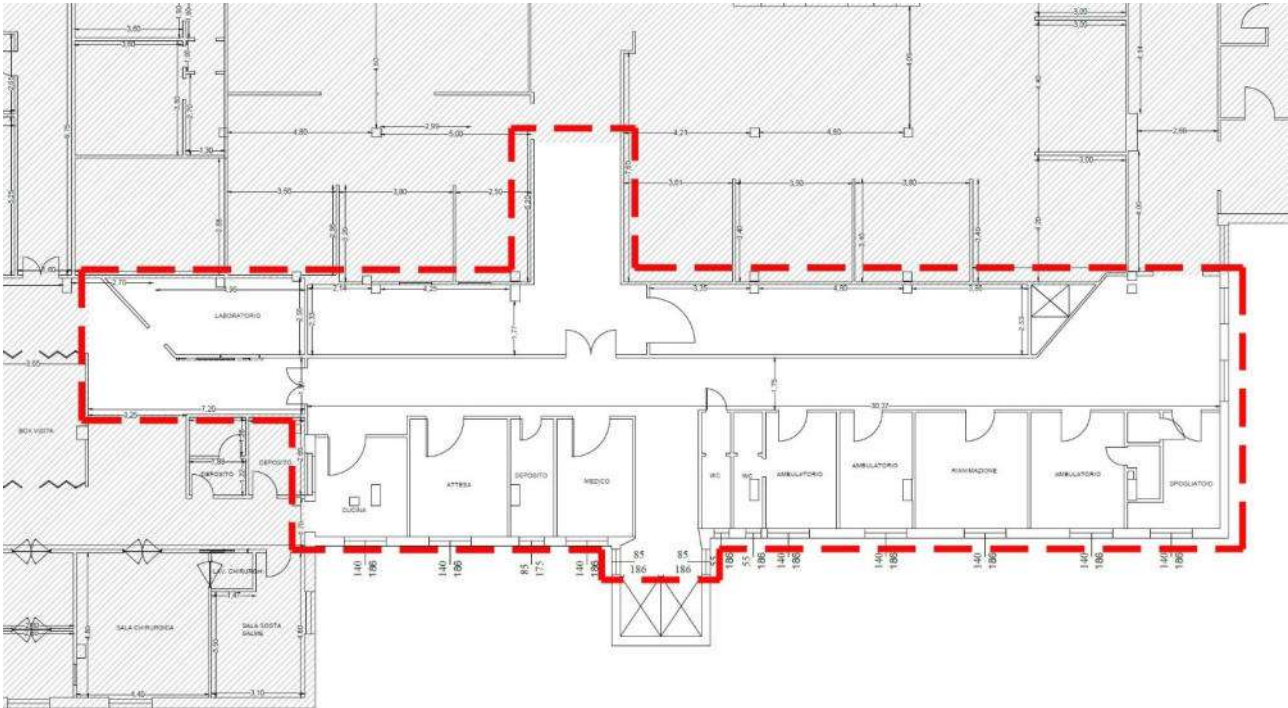

➤ **PROPOSTA PROGETTUALE**

Le aree suddette, verranno rimodulate integralmente, al fine di ottenere una stecca di stanze adibite ad Osservazione Breve a servizio del Pronto Soccorso esistente. Le stanze, saranno tutte a tre o quattro posti letto con annesso servizio igienico dedicato. Oltre alle degenze verrà realizzata una medicheria, il nuovo connettivo orizzontale per accedere alle suddette aree e al reparto di Terapia Intensiva prospiciente il reparto ed infine un nuovo locale laboratorio, al posto di quello esistente, che verrà rimosso dalla posizione attuale per permettere l'ingresso alle nuove aree di Osservazione Breve e T.I.

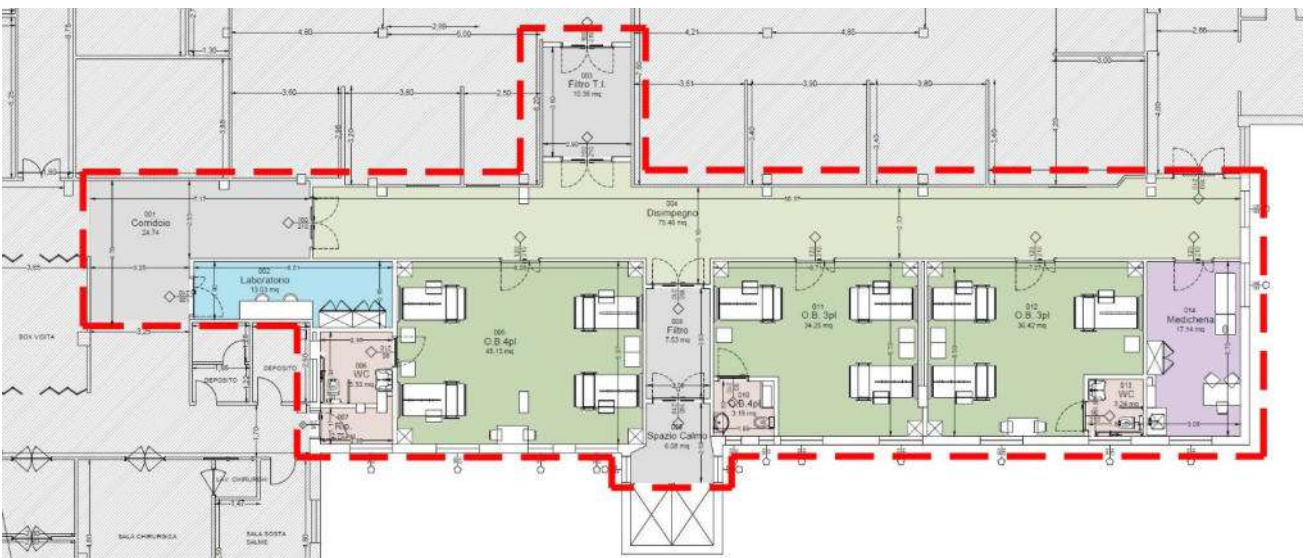

In sintesi, le lavorazioni previste sono le seguenti:

- Interventi di demolizioni e rimozioni delle tramezzature esistenti;
- realizzazione di tramezzature in doppia lastra di cartongesso con interposta struttura metallica e isolante termico in fibre minerali;
- rimozione e rifacimento delle pavimentazioni interne esistenti;
- rimozione dei vecchi rivestimenti e rifacimento degli stessi con cloruro di polivinile fino al controsoffitto;
- rimozione e rifacimento dei controsoffitti esistenti con pannelli in alluminio;
- rimozione e sostituzione delle porte interne nell'area oggetto di ristrutturazione;
- sostituzione di infissi sui prospetti oggetto di intervento;
- rimozione e rifacimento dell'impiantistica meccanica sia relativa alla climatizzazione, idrica e ai gas medicali delle aree in oggetto;
- rimozione e rifacimento dell'impiantistica inerente sia gli impianti elettrici che speciali;
- conferimento dei materiali provenienti dalle demolizioni (tramezzi, pavimenti controsoffitti, infissi ecc.) a discarica autorizzata.


Per la realizzazione di tali interventi l'importo dei lavori stimato previsto ammonterebbe a € 569.606,40 ed è splittato come di seguito elencato

Distinta superfici utili		DEGENZE	CONNETTIVO DEGENZE	AMBULATORI	UFFICI E SPAZI PERSONALE MEDICO	CONNETTIVO	SERVIZI IGIENICI LOC.TECNICI DEPOSITI, ECC.	Totali
Piano Terra	mq	118,8	75,46	17,15	13,03	48,73	14,51	287,68
Tot mq	mq	118,8	75,46	17,15	13,03	48,73	14,51	316,4

Stima lavori	Edile	Strutture	Elettrico	Termo meccanico		
	550,00 €	90,00 €	560,00 €	600,00 €	€/mq	1.800,00 €
	174.046,40 €	28.480,32 €	177.210,88 €	189.868,80 €	Tot €	569.606,40 €




PRONTO SOCCORSO

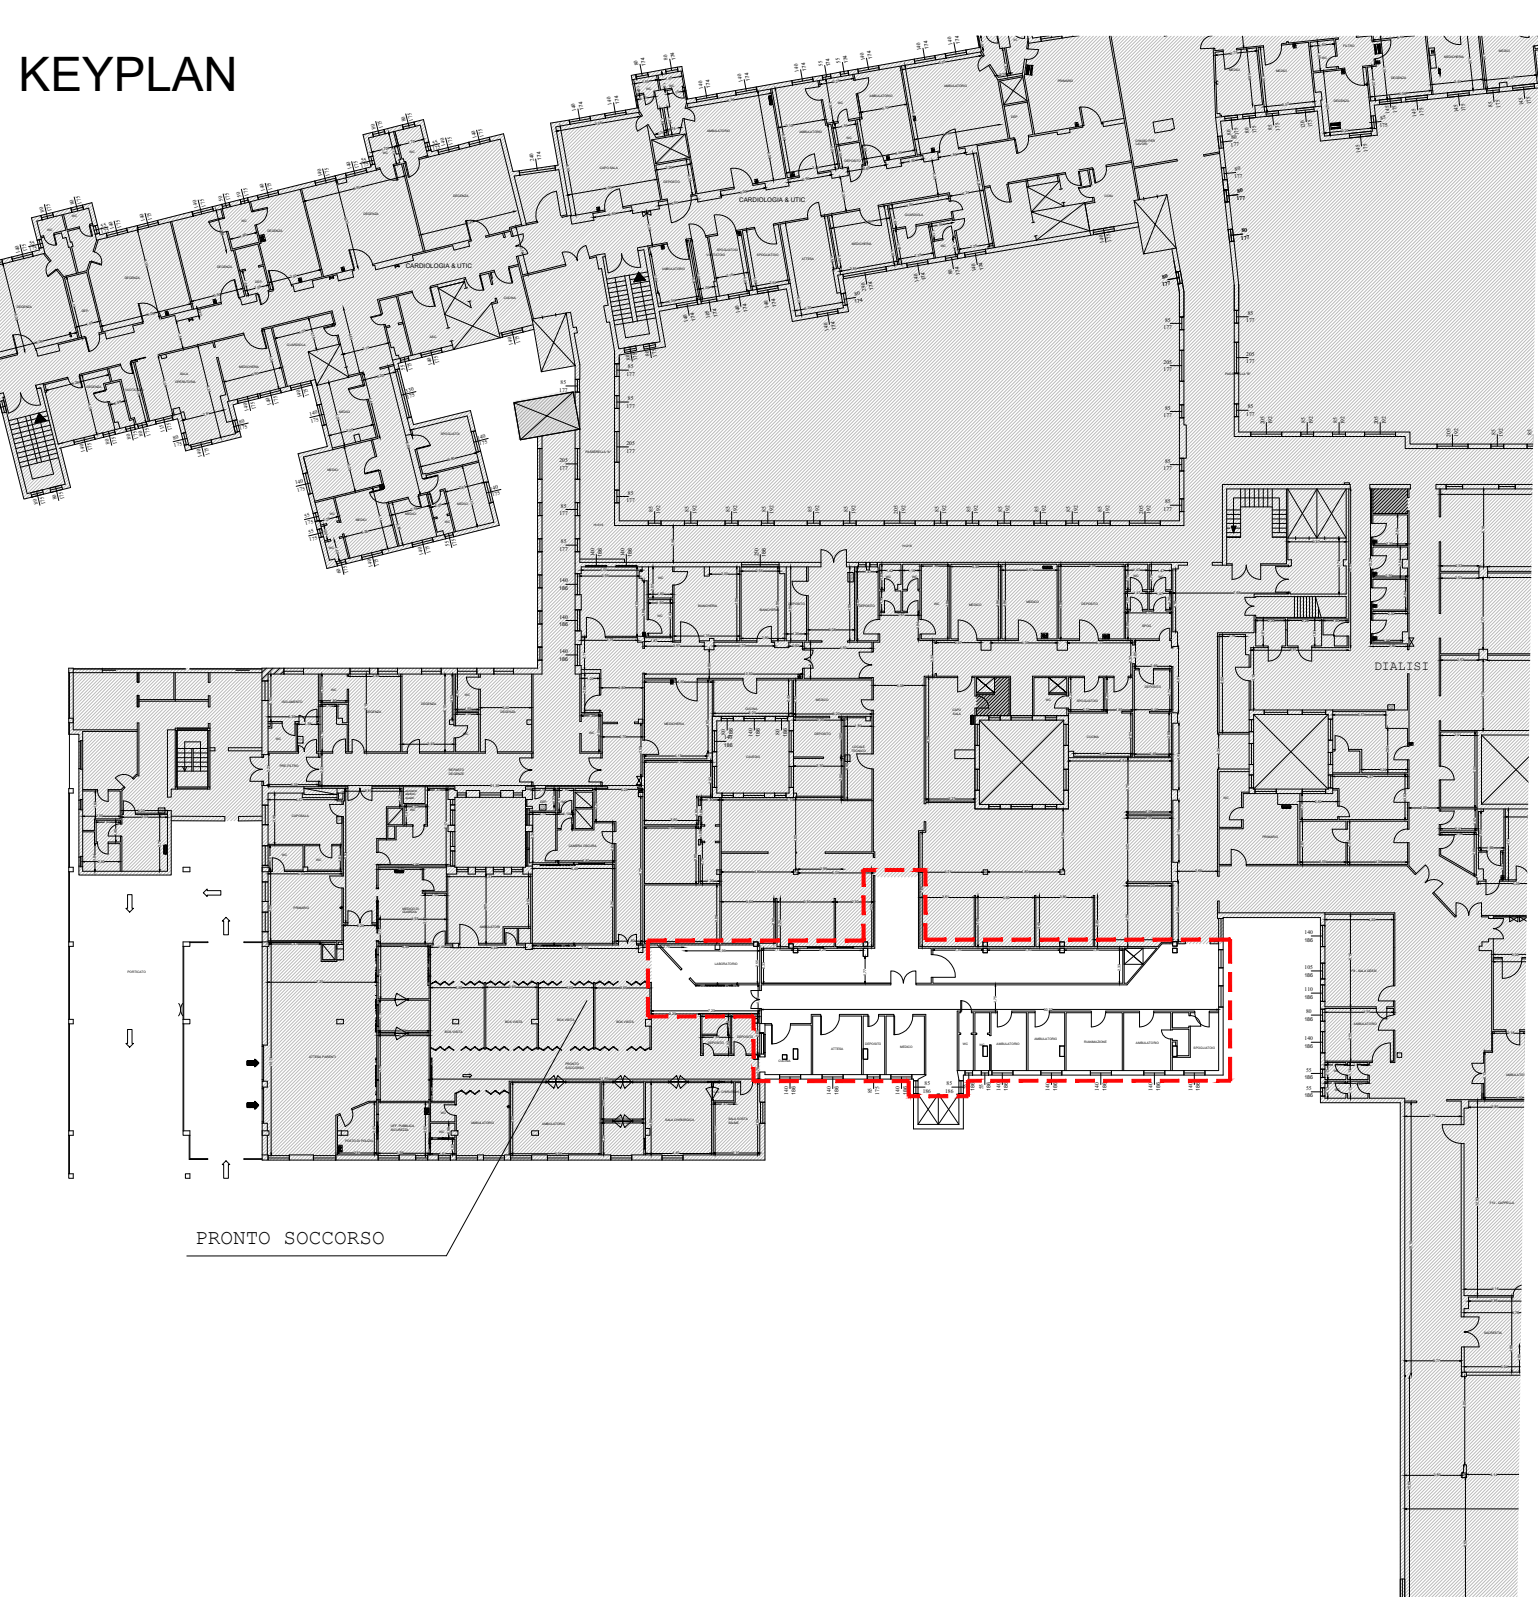

LEGENDA

ZONA DI INTERVENTO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O CARDARELLI DI CAMPOBASSO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT - Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECTA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:
Ing. Francesco Volpe

ELABORATO:
Pianta di Stato di Fatto

ELABORATO:
■

REDAZIONE:
Arch. P. Rizzo

VERIFICA:
Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:
Ing. F. Mastellone


EMESSO PER:
REV.: —

SCALA: 1:100

DATA: MARZO 2023



KEYPLAN

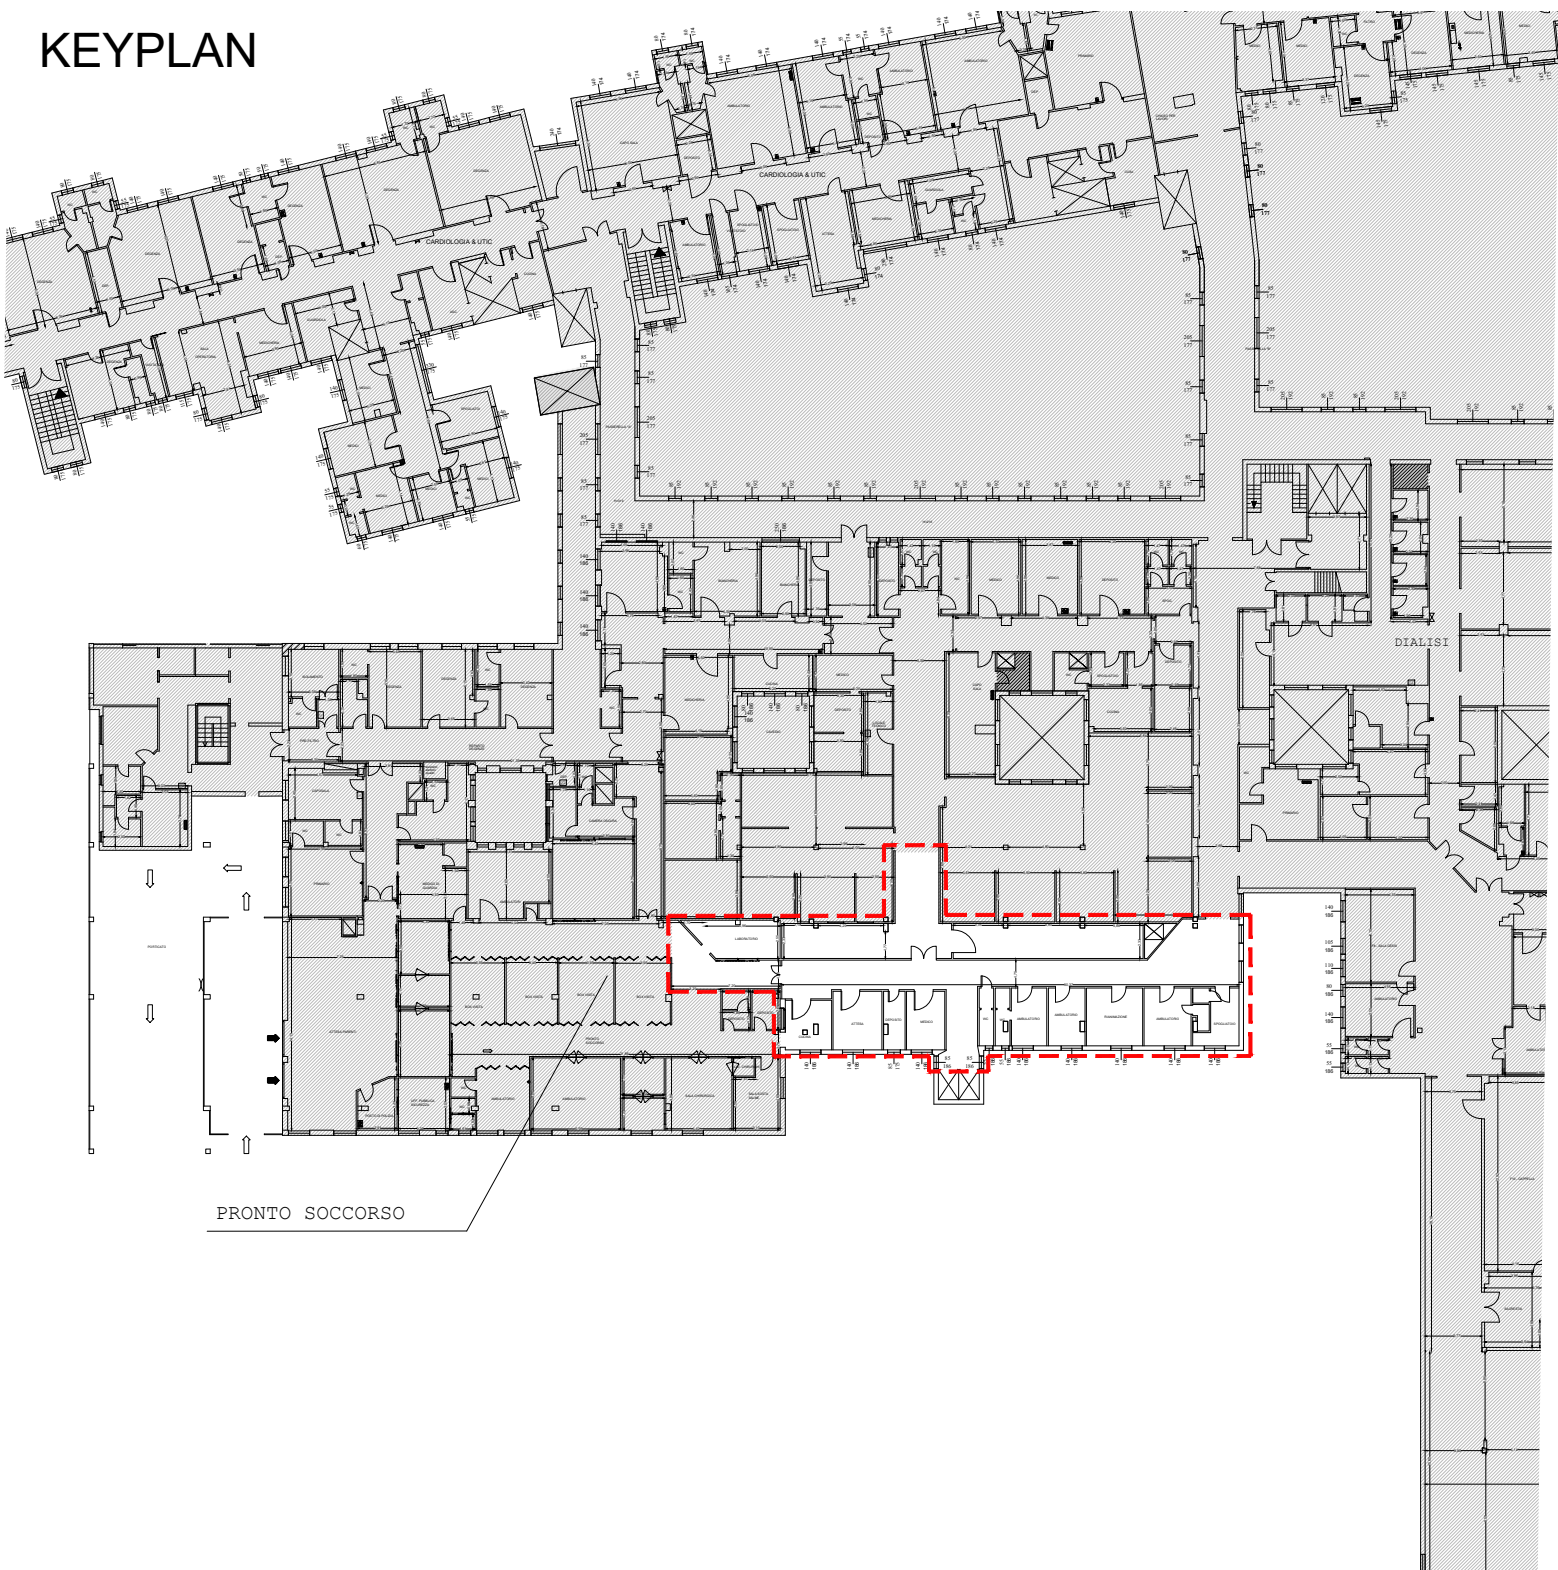

LEGENDA

- ZONA DI INTERVENTO
- OSSERVAZIONE BREVE
- CONNETTIVO OSSERVAZIONE BREVE
- CONNETTIVO
- SERVIZI IGIENICI, TECNICI, DEPOSITI, ECC.
- MEDICHERIA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O CARDARELLI DI CAMPOBASSO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECTA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:
Ing Francesco Volpe

ELABORATO:
Proposta layout di progetto

ELABORATO:
SCALA:
1:100
DATA:
MARZO 2023

REDAZIONE:
Arch. P. Rizzo

VERIFICA:
Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:
Ing. F. Mastellone

EMESSO PER:
REV:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID -19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



**PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A.
N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL
PRONTO SOCCORSO DEL P.O CARDARELLI DI CAMPOBASSO**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:

Ing Francesco Volpe

ELABORATO:

Quadro Economico

ELABORATO:

B

SCALA:

—

DATA:

MARZO 2023

REDAZIONE:

Arch. P. Rizzo

VERIFICA:

Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:

Ing. F. Mastellone

EMESSO PER:

REV.:

01

ASIREMMOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 53936/2023 del 24-03-2023
BdcegrtmgipateassCopia Documento

INTERVENTO n. 1 - ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE "A. CARDARELLI" DI CAMPOBASSO

A) LAVORI			
	Importo totale dei lavori		€ 569 606,40
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :			
B 1	Imprevisti		€ 37 250,83
B 2	Lavori in economia e oneri per il conferimento a discarica		€ 37 250,83
B 3	Adeguamento modulo prefabbricato di Terapia Intensiva, comprensivo di IVA		€ 32 000,00
B 4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 34 176,39
B 5	Spese per incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/05		€ 11 392,13
B 6	Spese tecniche per progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza		€ 68 352,77
B 7	IVA ed eventuali altre imposte		
B 7.1	I.V.A. su A	10,00%	€ 56 960,64
B 7.2	I.V.A. su B1 e B2	10,00%	€ 7 450,17
B 7.3	CNPAIA 4% su B4		€ 1 367,06
B 7.4	CNPAIA 4% su B6		€ 2 734,11
B 7.5	I.V.A. su B3 e su CNPAIA B.7.3	22,00%	€ 7 819,56
B 7.6	I.V.A. su B5 e su CNPAIA B.7.4	22,00%	€ 15 639,11
	Totale IVA e Imposte		€ 91 970,65
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€ 312 393,60
	TOTALE (A+B)		€ 882 000,00

RESISTENZA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 33936/2023 del 24-03-2023
 Adeguamento Pronto Soccorso
 Documento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID -19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O SAN TIMOTEO DI TERMOLI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:

Ing. Francesco Volpe

ELABORATO:

**Relazione Descrittiva
e Stima sommaria**

ELABORATO:

A

SCALA:

—

DATA:

MARZO 2023

REDAZIONE:

Arch. P. Rizzo

VERIFICA:

Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:

Ing. F. Mastellone

EMESSO PER:


REV.: —

ASIREMOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 53092/2023 del 22-03-2023
Allegato 4 - Copia Documento

PRONTO SOCCORSO TERMOLI


➤ **STATO DI FATTO**

La zona di interesse è ubicata al piano terra ed ha una superficie di circa 113 mq (sup. lorda). Nella configurazione di stato di fatto l'attuale Camera Calda ha una superficie di 211 mq e nelle aree tra quest'ultima e l'attuale modulo prefabbricato di T.I. sono presenti un disimpegno e due stanze di visita ecografica e studio medico.

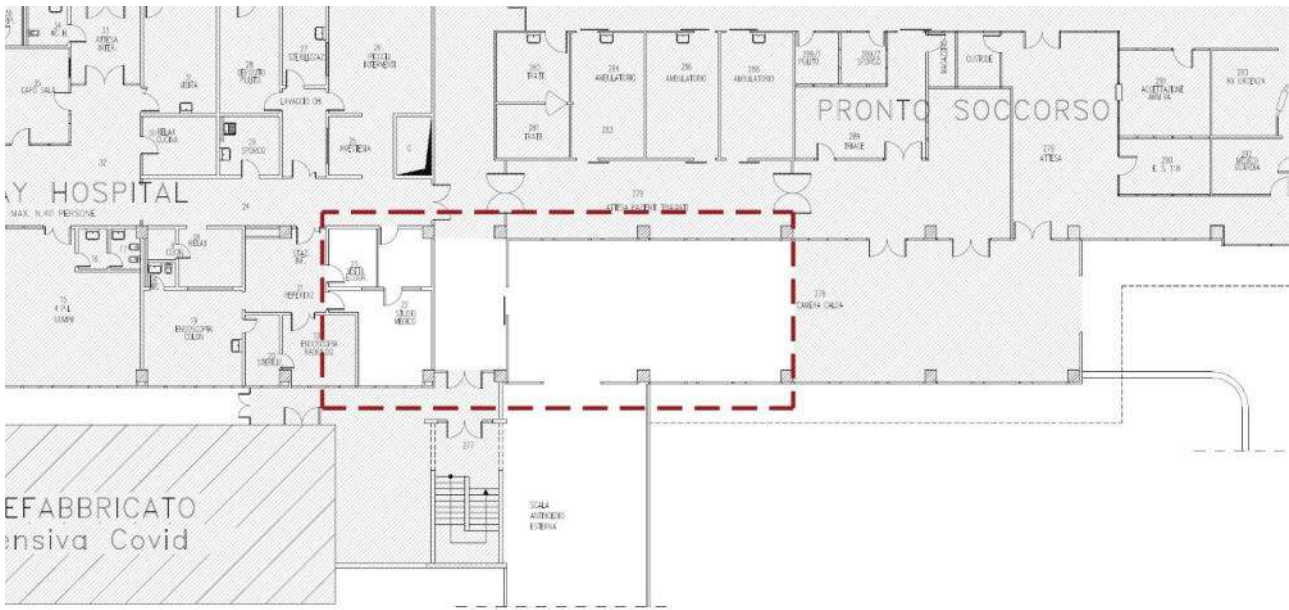

➤ **PROPOSTA PROGETTUALE**

Verrà divisa in due l'attuale camera calda realizzando una partizione interna con un portone con serranda scorrevole che, in condizioni normali, resterà sempre aperto, mentre in caso di pandemia verrà chiuso realizzando quindi due camere calde indipendenti. Verrà inoltre realizzata la chiusura a mezzo di porta del corridoio alla sinistra dell'ingresso della nuova camera calda covid e realizzati infine due nuove stanze per la vestizione e svestizione dei DPI da parte del personale medico.

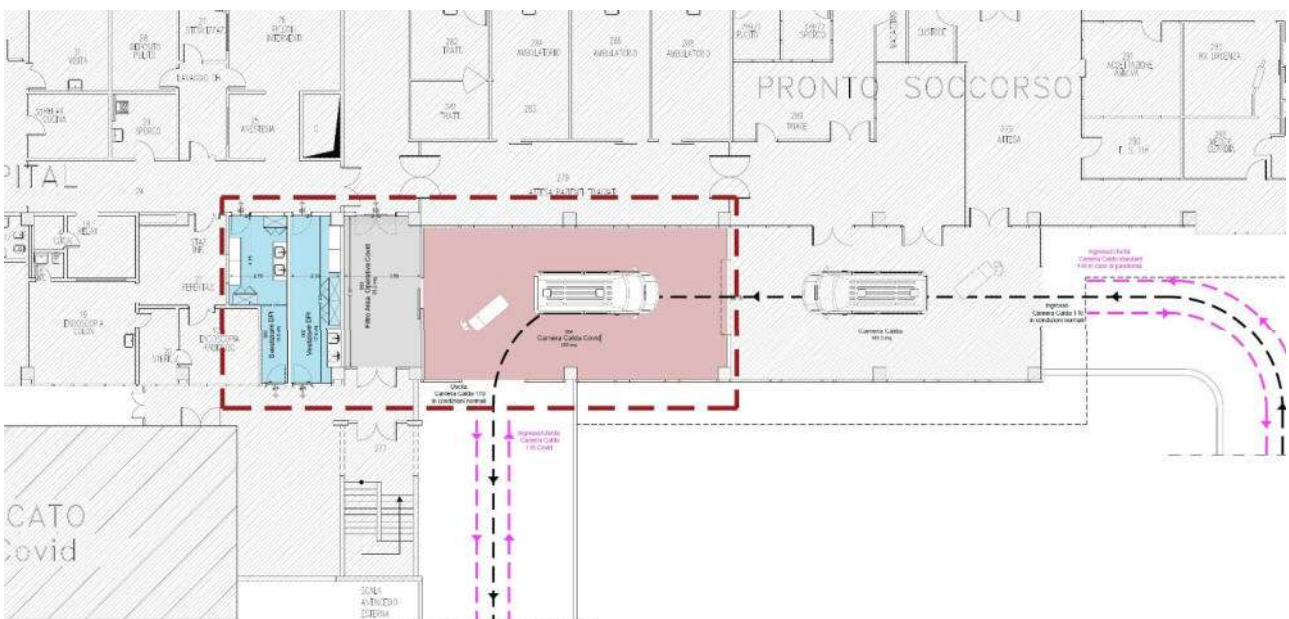

In sintesi, le lavorazioni previste sono le seguenti:

- Interventi di demolizioni e rimozioni di porzione delle tramezzature esistenti;
- realizzazione di tramezzature in doppia lastra di cartongesso con interposta struttura metallica e isolante termico in fibre minerali;
- rimozione e rifacimento delle pavimentazioni interne nei locali oggetto di ristrutturazione;
- rimozione dei vecchi rivestimenti e rifacimento degli stessi con cloruro di polivinile fino al controsoffitto;
- rimozione e rifacimento dei controsoffitti esistenti con pannelli in alluminio;
- rimozione e sostituzione delle porte interne nell'area oggetto di ristrutturazione;
- rimozione e rifacimento dell'impiantistica meccanica sia relativa alla climatizzazione, idrica e ai gas medicali delle aree in oggetto;
- rimozione e rifacimento dell'impiantistica inerente sia gli impianti elettrici che speciali;
- partizione verticale dell'attuale Camera Calda;
- conferimento dei materiali provenienti dalle demolizioni (tramezzi, pavimenti controsoffitti, infissi ecc.) a discarica autorizzata.


Per la realizzazione di tali interventi l'importo dei lavori stimato previsto ammonterebbe a € 203.456,00 ed è splittato come di seguito elencato

Distinta superfici utili		DEGENZE	CONNETTIV O DEGENZE	AMBULATORI	UFFICI E SPAZI PERSONALE MEDICO	CONNETTIVO	SERVIZI IGIENICI LOC. TECNICI DEPOSITI, ECC.	Totali
Piano Terra	mq	0	0	0	33,2	69,6	0	102,8
Tot mq	mq	0	0	0	33,2	69,6	0	113,0

Stima lavori	Edile	Strutture	Elettrico	Termo meccanico		
	550,00 €	90,00 €	560,00 €	600,00 €	€/mq	1.800,00 €
	62.167,11 €	10.172,80 €	63.297,42 €	67.818,67 €	Tot €	203.456,00 €



KEYPLAN

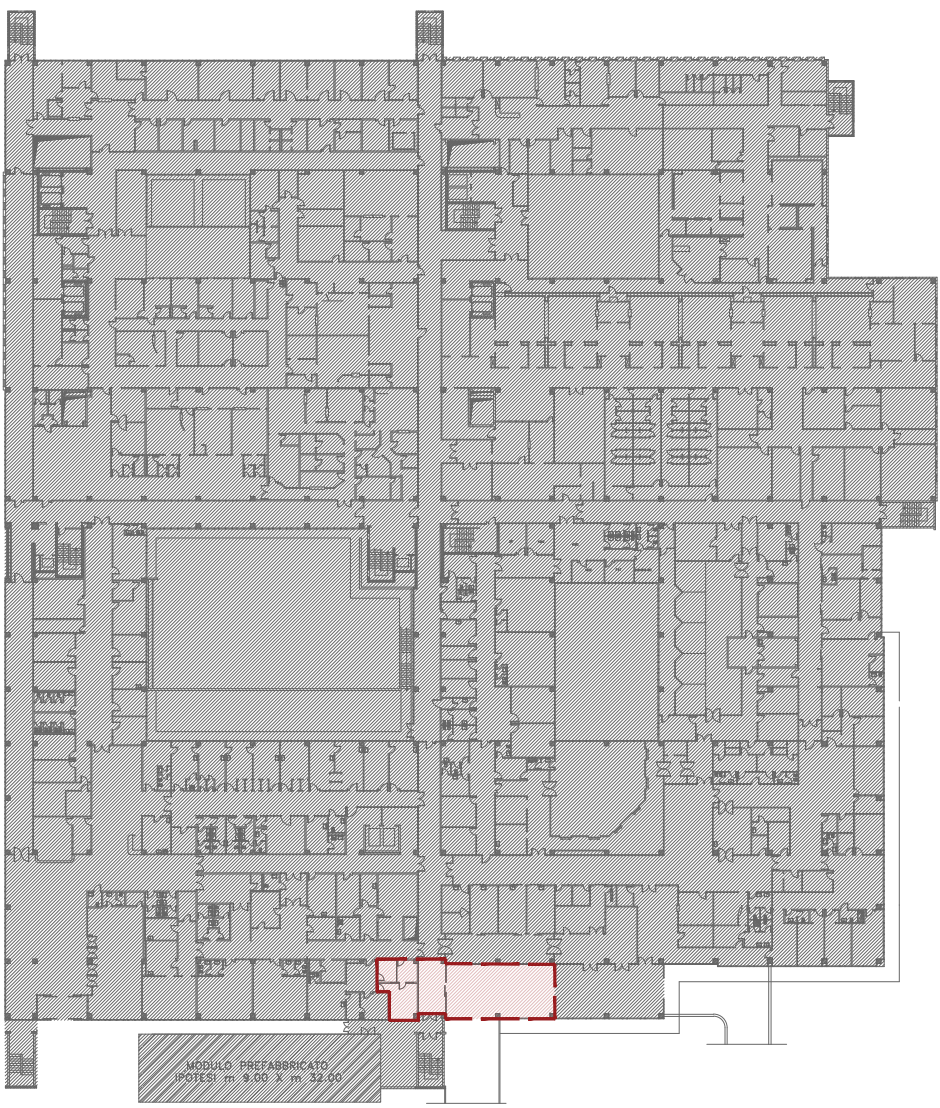

LEGENDA

 ZONA DI INTERVENTO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19


ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO




PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O SAN TIMOTEO DI TERMOLI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti Capogruppo: MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l. Mandanti: ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l. Ing. Erica Proietti	Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Volpe		
ELABORATO: Pianta di Stato di Fatto	ELABORATO: — SCALA: — DATA: MARZO 2023		
REDAZIONE: Arch. P. Rizzo	VERIFICA: Arch. S. Fulci	APPROVAZIONE: Ing. F. Mastellone	EMESSO PER: REV.: —

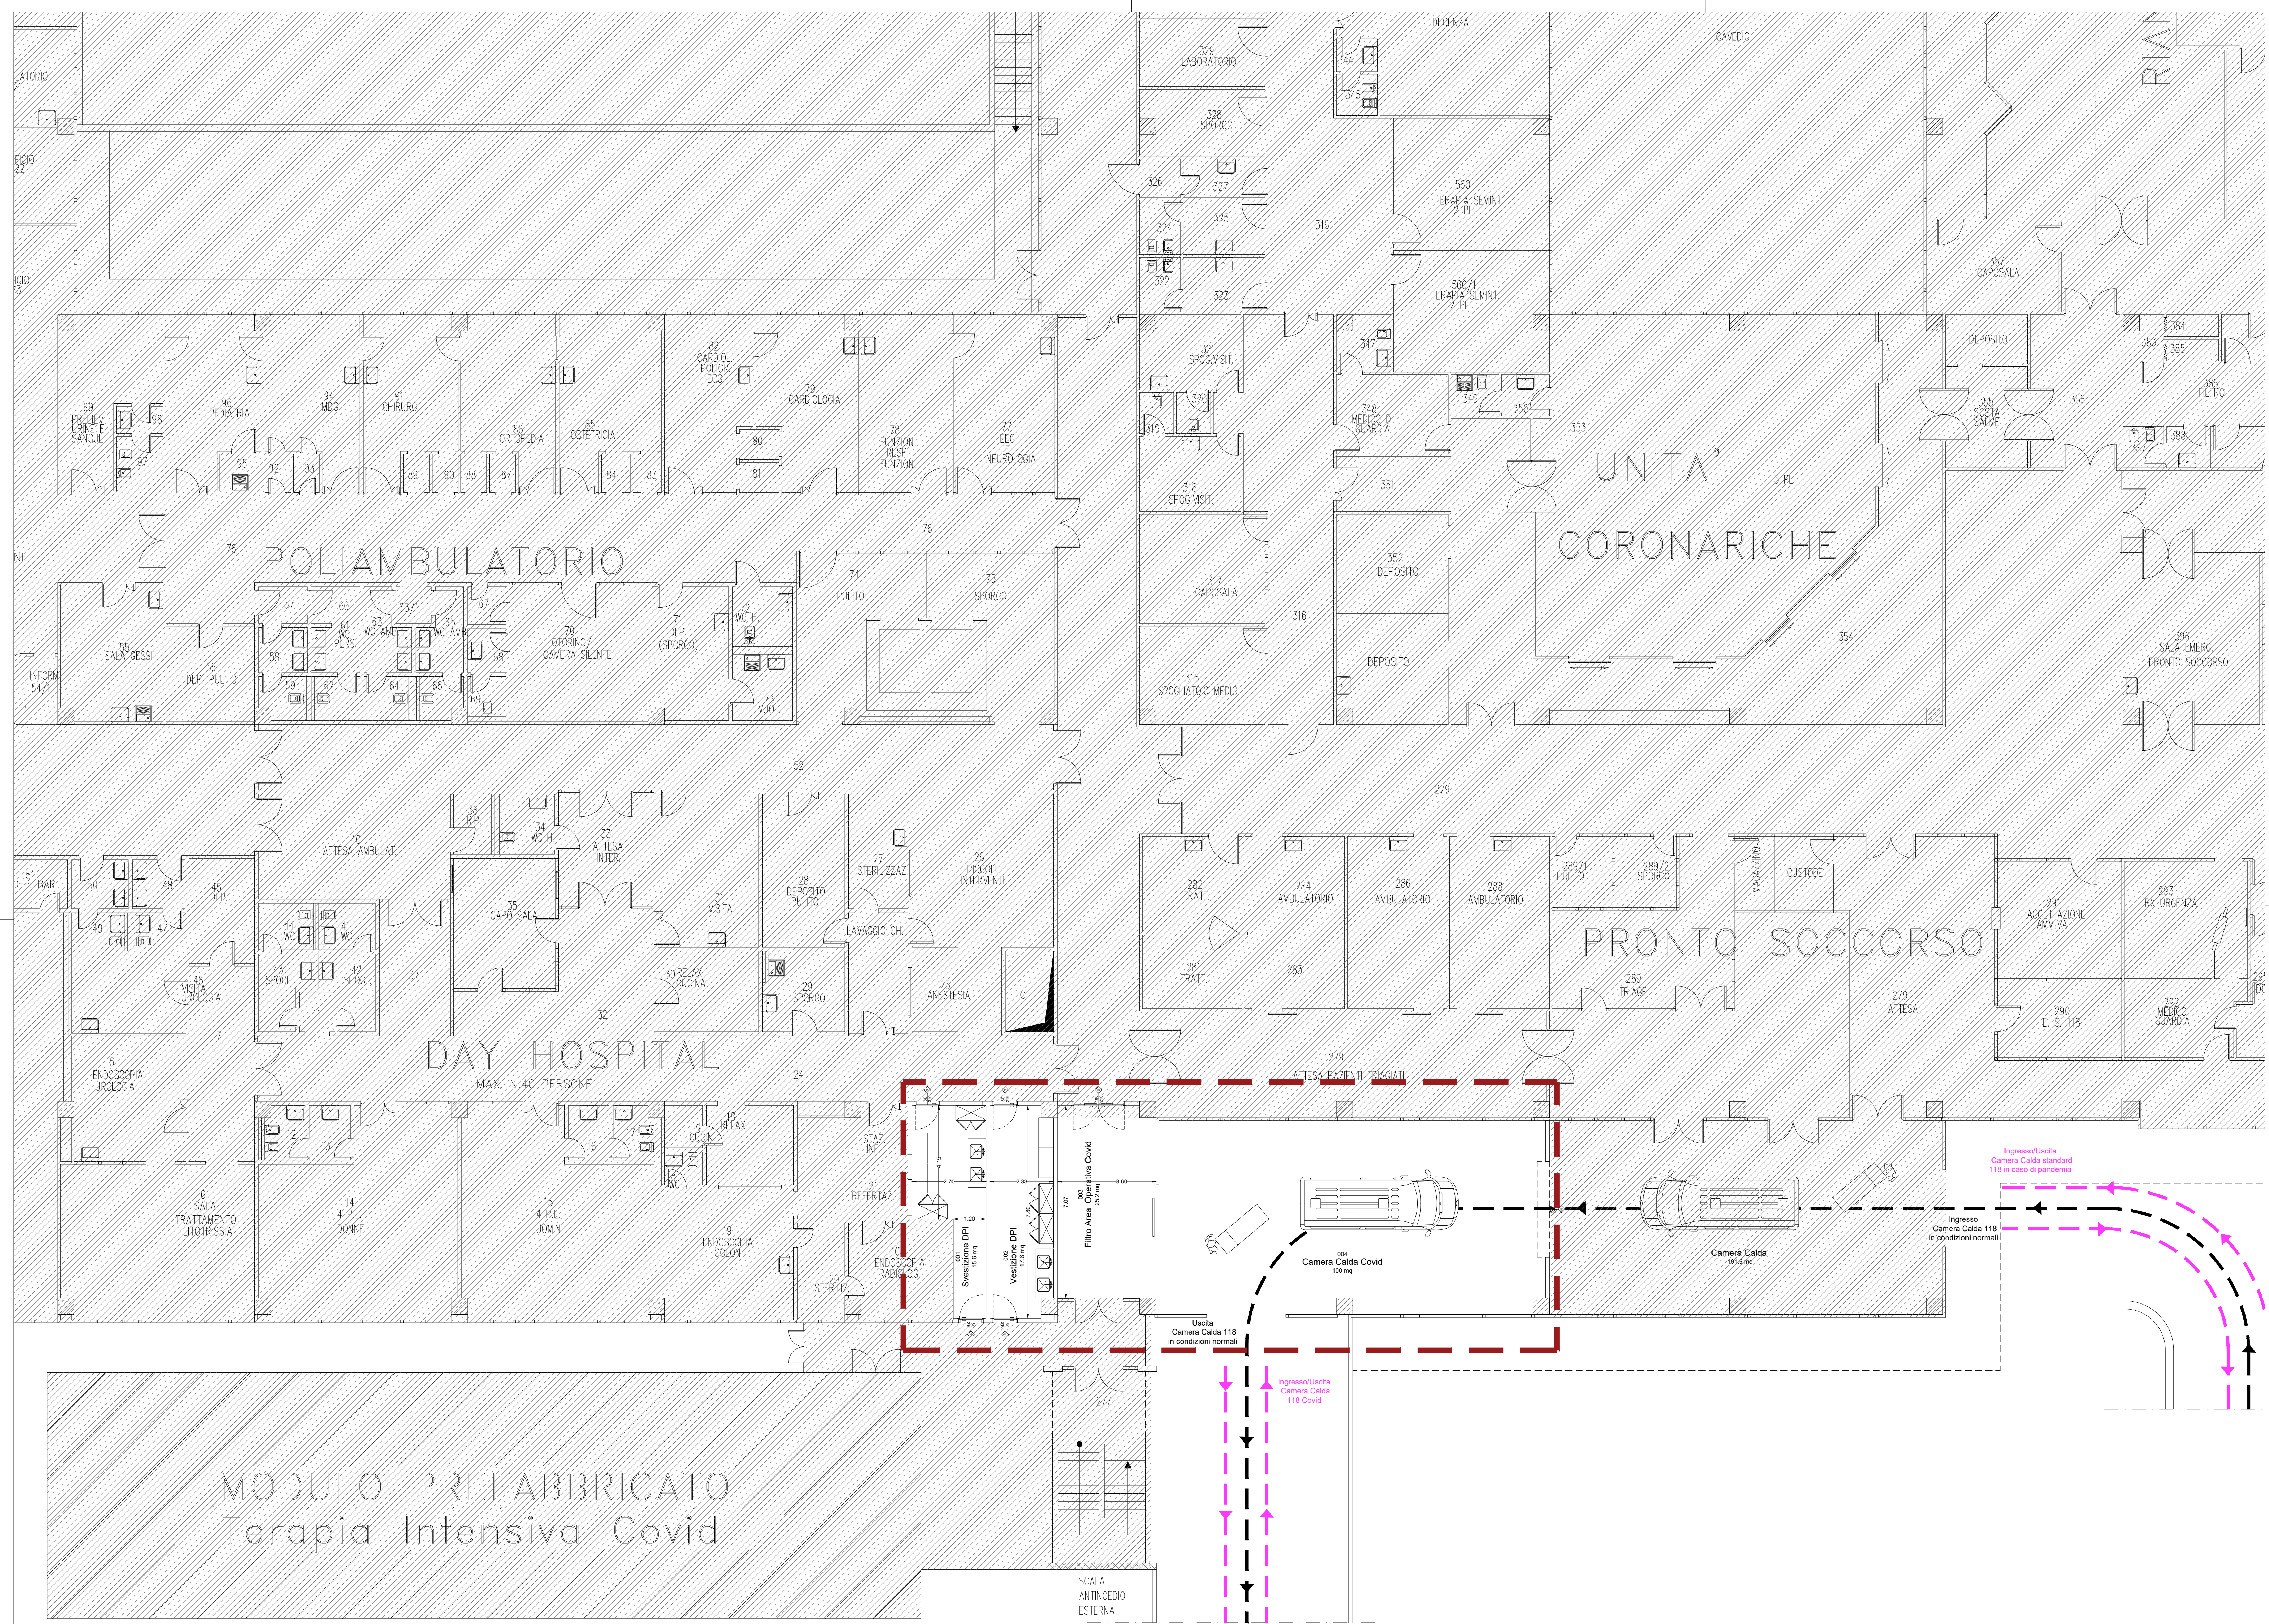

KEYPLAN

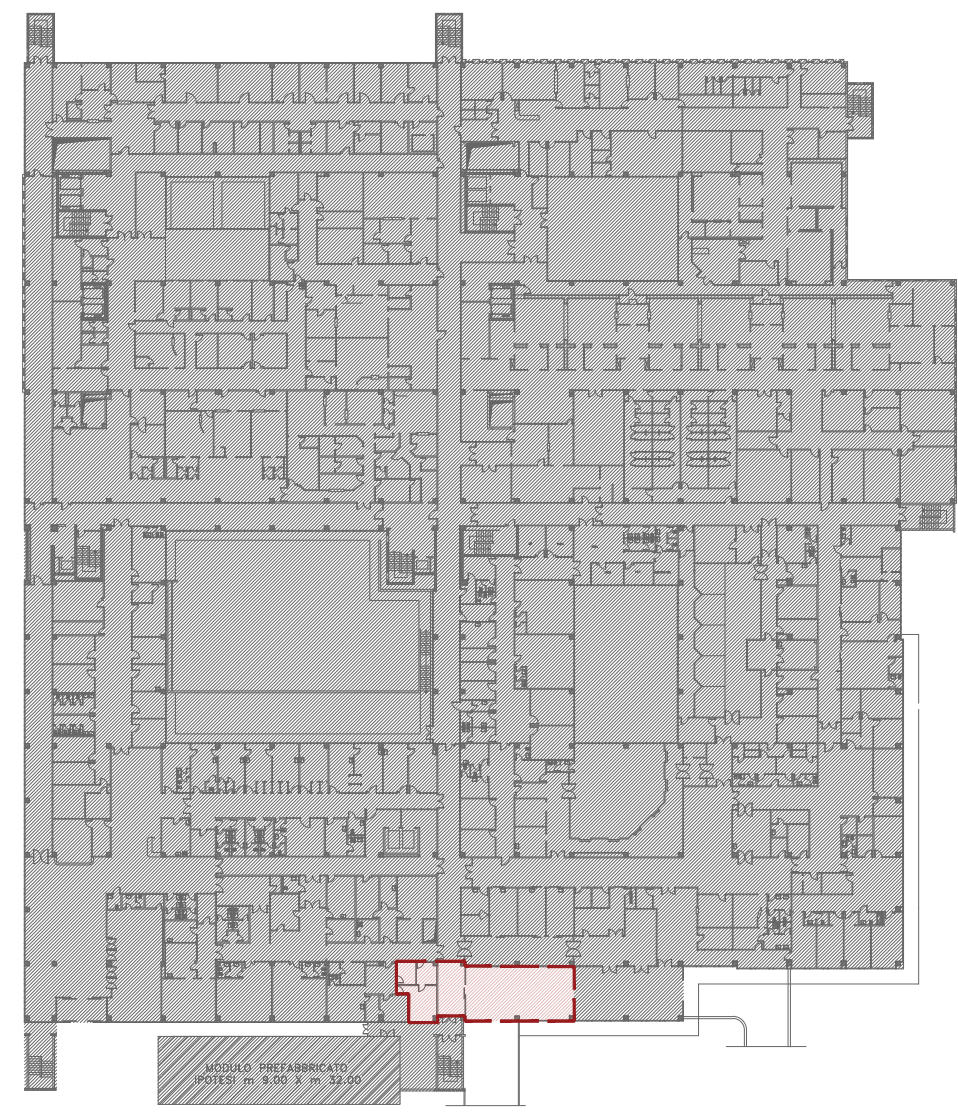

LEGENDA

- ZONA DI INTERVENTO
- PERCORSO AMBULANZA IN CONDIZIONI NORMALI
- PERCORSO AMBULANZA IN CONDIZIONI DI PANDEMIA
- CAMERA CALDA COVID
- VESTIZIONE E SVESTITONE DPI PERSONALE MEDICO
- FILTRO AREA OPERATIVA COVID



Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O SAN TIMOTEO DI TERMOI)

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT - Progettisti Capogruppo: MASTELLONE di CASTELVETERE ENGINEERING S.r.l. Mandanti: ARCHITECTA ENGINEERING S.r.l. Ing. Erica Proietti			Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Volpe
ELABORATO: Proposta layout di progetto			ELABORATO: —
REDAZIONE: Arch. P. Rizzo			VERIFICA: Arch. S. Fulci
APPROVAZIONE: Ing. F. Mastellone			EMESSO PER: REV.: —
SCALA: —			DATA: MARZO 2023



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID -19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O SAN TIMOTEO DI TERMOLI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:

Ing. Francesco Volpe

ELABORATO:

Quadro Economico

ELABORATO:

B

SCALA:

—

DATA:

MARZO 2023

REDAZIONE:

Arch. P. Rizzo

VERIFICA:

Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:

Ing. F. Mastellone

EMESSO PER:

REV.:

01

ASIREMOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 53939/2023 del 24-03-2023
Bdcegrtun6ipa6eassCopia Documento

INTERVENTO n. 3 - ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE "SAN TIMOTEO" DI TERMOLI

A) LAVORI				
	Importo totale dei lavori		€	203 456,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :				
B 1	Imprevisti		€	9 318,31
B 2	Lavori in economia e oneri per il conferimento a discarica		€	9 318,31
B 3	Adeguamento modulo prefabbricato di Terapia Intensiva, comprensivo di IVA		€	70 000,00
B 4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	16 276,48
B 5	Spese per incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/05		€	4 069,12
B 6	Spese tecniche per progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza		€	24 414,72
B 7	IVA ed eventuali altre imposte			
B 7.1	I.V.A. su A	10,00%	€	20 345,60
B 7.2	I.V.A. su B1 e B2	10,00%	€	1 863,66
B 7.3	CNPAIA 4% su B4		€	651,06
B 7.4	CNPAIA 4% su B6		€	976,59
B 7.5	I.V.A. su B3 e su CNPAIA B.7.3	22,00%	€	3 724,06
B 7.6	I.V.A. su B5 e su CNPAIA B.7.4	22,00%	€	5 586,09
	Totale IVA e Imposte		€	33 147,07
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€	166 544,00
	T O T A L E (A+B)		€	370 000,00

RESISTENZA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 33939/2023 del 24-03-2023
 Adeguamento Pronto Soccorso Ospedale San Timoteo di Termoli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID -19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O VENEZIALE DI ISERNIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:

Ing Francesco Volpe

ELABORATO:

**Relazione Descrittiva
e Stima sommaria**

ELABORATO:

A

SCALA:

—

DATA:

MARZO 2023

REDAZIONE:

Arch. P. Rizzo

VERIFICA:

Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:

Ing. F. Mastellone

EMESSO PER:

REV.: 1

AGOSTO 2023

PRESTARE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Amm. N. 8888/2023 del 25-08-2023
Allegato 3 - Copia. Documento

In sintesi, le lavorazioni previste sono le seguenti:

- Demolizione del piccolo disimpegno di accesso al modulo prefabbricato e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Realizzazione di filtro chiuso, antistante la nuova area Covid di Terapia Intensiva mediante montanti e traverse metallici e pannellature cieche costituite da pannelli coibentati costituiti da doppia lamiera in alluminio verniciato e strato isolante in resine espansive rigide, compreso impianto elettrico e termico
- Chiusura verticale con struttura prefabbricata nell'attuale Camera Calda mediante montanti e traverse metallici e pannellature cieche costituite da pannelli coibentati costituiti da doppia lamiera in alluminio verniciato e strato isolante in resine espansive rigide, compreso impianto elettrico ed impianto di estrazione.

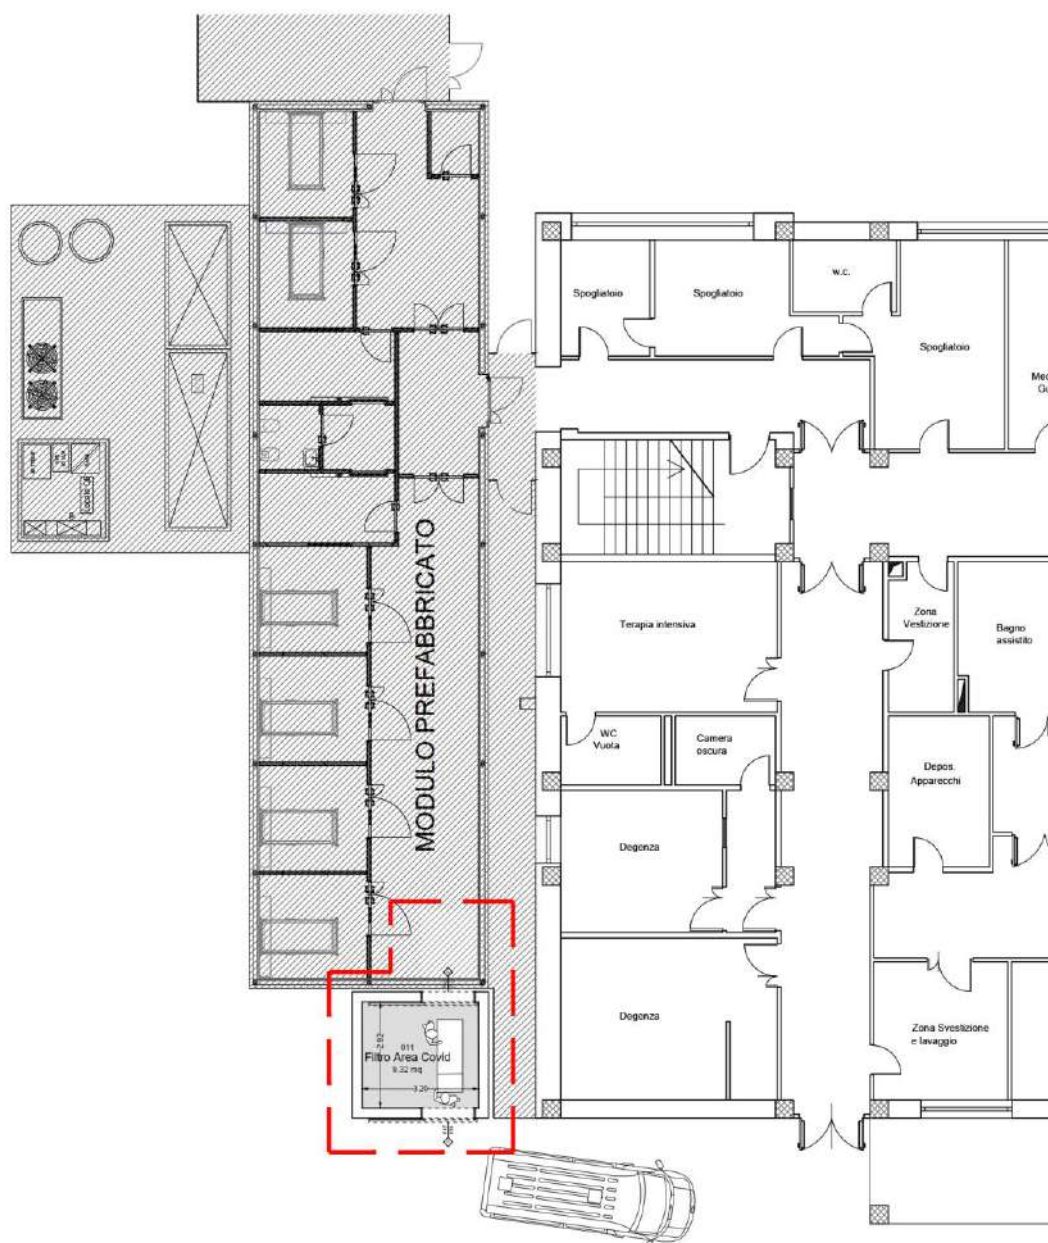


Figura 2 - Realizzazione filtro per modulo prefabbricato accoglienza COVID





Figura 3 - Realizzazione camera calda

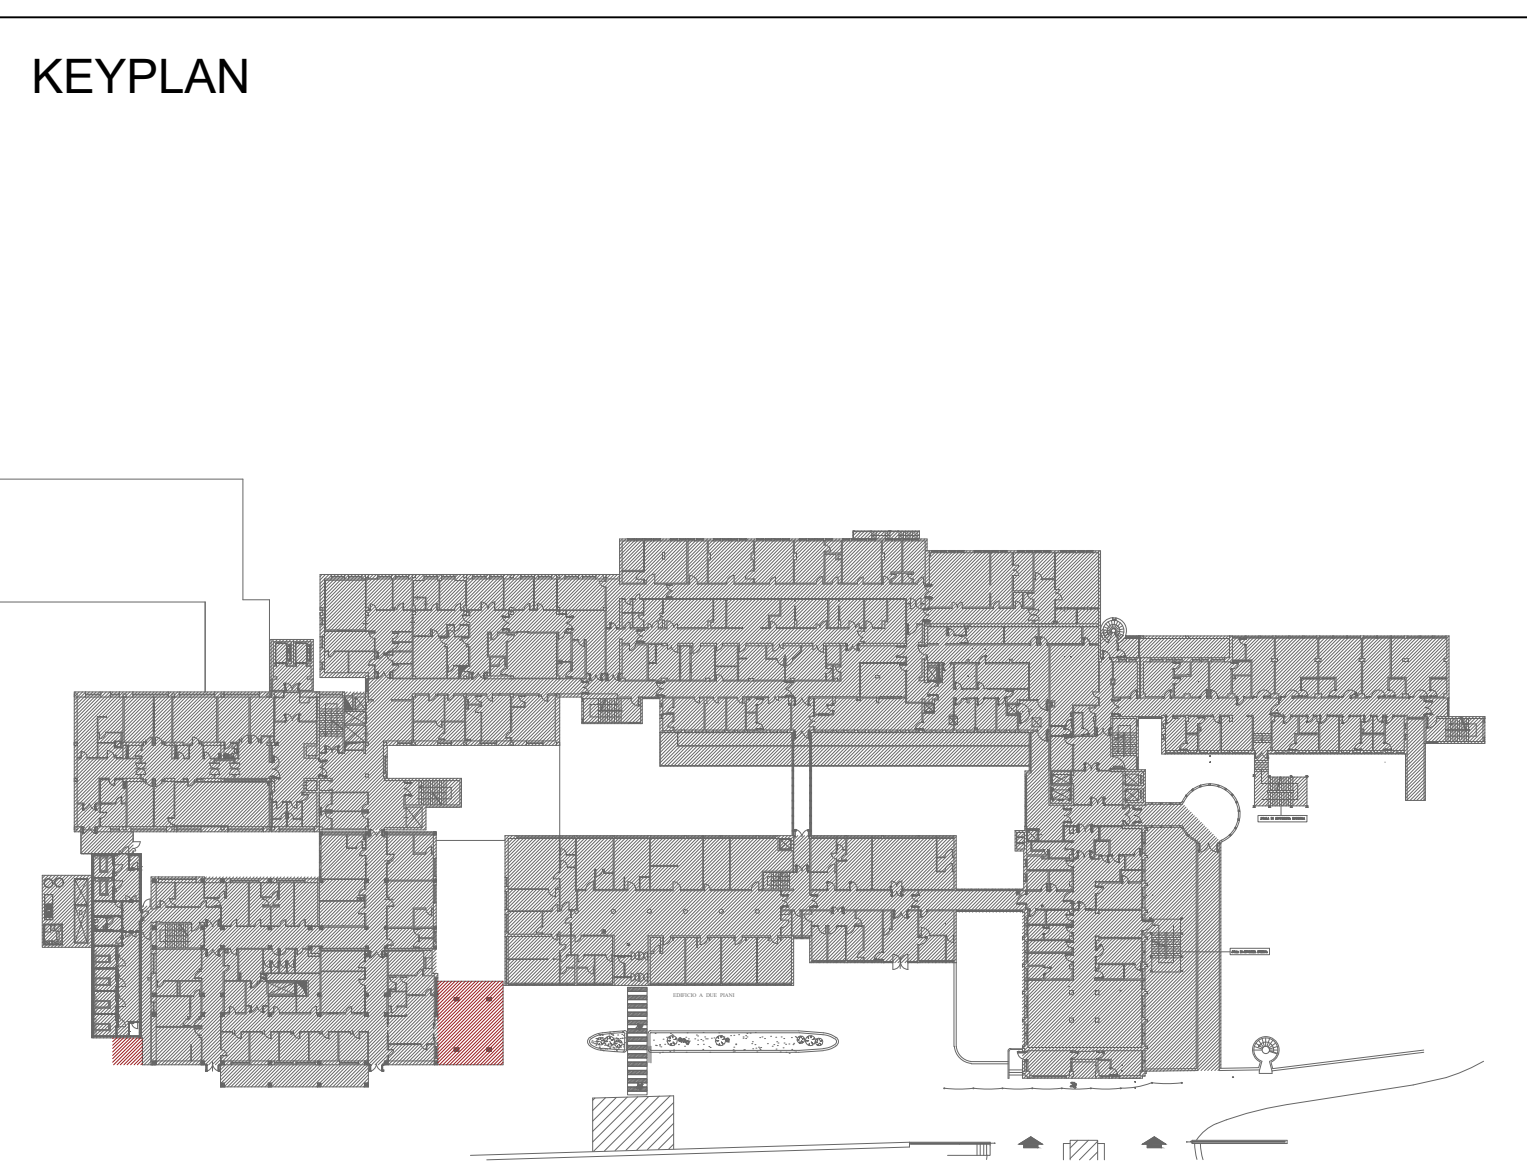

Per la realizzazione di tali interventi l'importo dei lavori stimato previsto ammonta a € 103.000,00 ed è splittato come di seguito elencato.

	Descrizione intervento	Costo	Totale
1	Realizzazione di filtro chiuso, antistante la nuova area Covid di Terapia Intensiva mediante montanti e traverse metallici e pannellature cieche costituite da pannelli coibentati costituiti da doppia lamiera in alluminio verniciato e strato isolante in resine espanse rigide, compreso impianto elettrico e termico	42.0000 €	
2	Chiusura verticale con struttura prefabbricata nell'attuale Camera Calda mediante montanti e traverse metallici e pannellature cieche costituite da pannelli coibentati costituiti da doppia lamiera in alluminio verniciato e strato isolante in resine espanse rigide, compreso impianto elettrico ed impianto di estrazione.	61.000 €	
			103.000,00 €

 ZONA DI INTERVENTO


**PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA
REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A.
N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL
PRONTO SOCCORSO DEL P.O VENEZIALE DI ISERNIA**

RT- Progettisti Capogruppo: MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l. Mandanti: ARCHITECTA ENGINEERING S.r.l. Ing. Erica Proietti	Responsabile del Procedimento: Ing Francesco Volpe
---	---

ELABORATO:			ELABORATO:
Pianta di Stato di Fatto			1
			SCALA:
			DATA:
			MARZO 2023
REDAZIONE: Arch. P. Rizzo	VERIFICA: Arch. S. Fulci	APPROVAZIONE: Ing. F. Mastellone	EMESSO PER: REV:



KEYPLAN

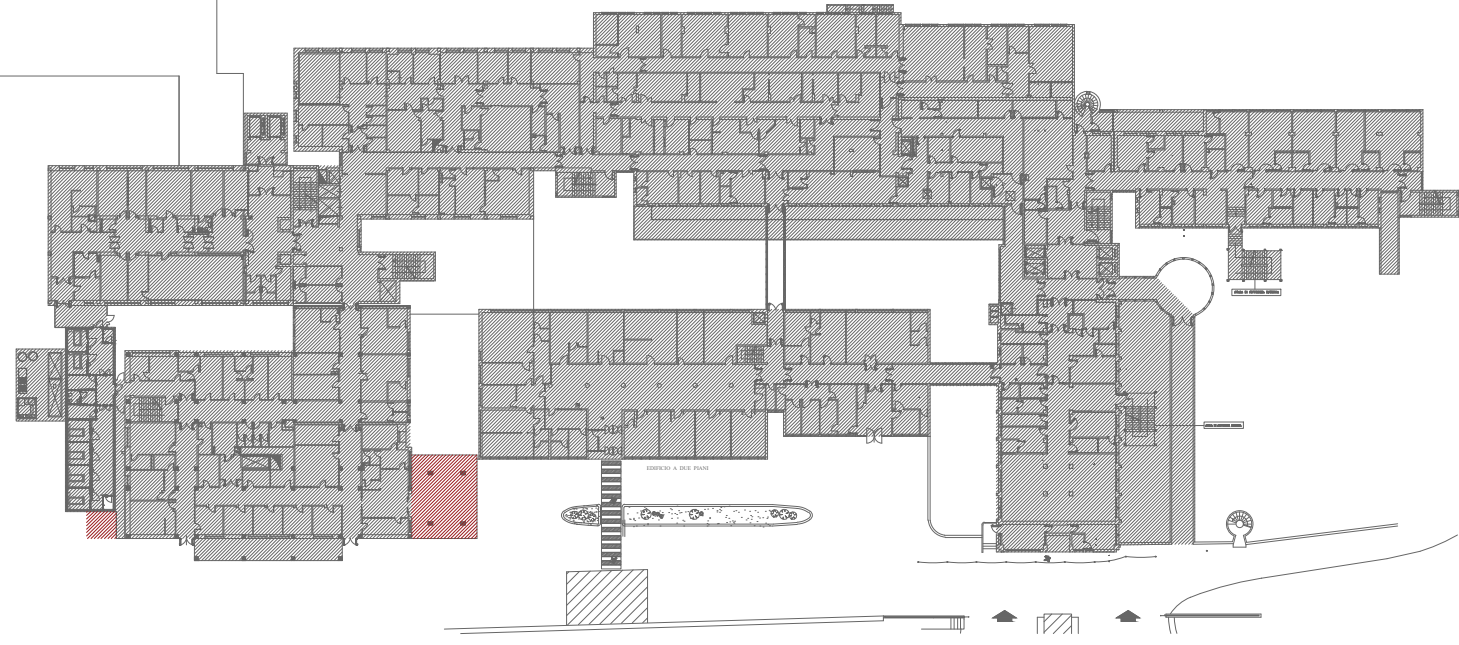


LEGENDA



ZONA DI INTERVENTO



CAMERA CALDA COVID



CONNETTIVO



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O VENEZIALE DI ISERNA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti

Responsabile del Procedimento:
Ing Francesco Volpe

ELABORATO:
Pianta di Progetto architettonico

ELABORATO:
2
SCALA:
—
DATA:
MARZO 2023
EMESSO PER:
REV: 1 AGOSTO 2023

REDAZIONE:
Arch. P. Rizzo

VERIFICA:
Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:
Ing. F. Mastellone



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE SANITARIE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID -19


ACCORDO QUADRO LOTTO GEOGRAFICO 11 MOLISE - AREA CAMPOBASSO



PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE PER EMERGENZA COVID-19 (D.L. N. 34/2020 - D.C.A. N. 48 DEL 14.07.2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL P.O VENEZIALE DI ISERNIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

RT- Progettisti
Capogruppo:
MASTELLONE di CASTELEVETERE ENGINEERING S.r.l.
Mandanti:
ARCHITECNA ENGINEERING S.r.l.
Ing. Erica Proietti



Responsabile del Procedimento:

Ing Francesco Volpe

ELABORATO:

Quadro Economico

ELABORATO:

B

SCALA:

—

DATA:

MARZO 2023

REDAZIONE:

Arch. P. Rizzo

VERIFICA:

Arch. S. Fulci

APPROVAZIONE:

Ing. F. Mastellone

EMESSO PER:

REV.: 1
AGOSTO 2023

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Amm. N. 8888/2023 del 25-08-2023
Allegato 10 - Copia Documento

INTERVENTO n. 2 - ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE "VENEZIALE" DI ISERNIA

A) LAVORI				
	Importo totale dei lavori		€	103 000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE :				
B 1	Imprevisti		€	7 106,77
B 2	Lavori in economia e oneri per il conferimento a discarica		€	10 300,00
B 3	Adeguamento modulo prefabbricato di Terapia Intensiva, comprensivo di IVA		€	70 000,00
B 4	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	6 180,00
B 5	Spese per incentivi ex art. 92 d.lgs. 163/05		€	2 060,00
B 6	Spese tecniche per progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza		€	12 360,00
B 7	IVA ed eventuali altre imposte			
B 7.1	I.V.A. su A	10,00%	€	10 300,00
B 7.2	I.V.A. su B1 e B2	10,00%	€	1 740,68
B 7.3	CNPAIA 4% su B4		€	247,20
B 7.4	CNPAIA 4% su B6		€	494,40
B 7.5	I.V.A. su B4 e su CNPAIA B.7.3	22,00%	€	1 413,98
B 7.6	I.V.A. su B6 e su CNPAIA B.7.4	22,00%	€	2 827,97
	Totale IVA e Imposte		€	17 024,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			€	125 031,00
T O T A L E (A+B)			€	228 031,00

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
 Protocollo Arrivo N. 185588/2023 del 24-08-2023
 Allegato 19 - Copia Documento
